

“ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025” ТАНИЛЦУУЛГА



20
25





Ажлын нэр: ОНӨГ-ын ажлын байрны засвар, тохижилт хийх

Ажлын тоо хэмжээ: ОНӨГ-н байрны зоорь болон 2-р давхарт нийт 524,9м² талбай бүхий барилгын хана тааз, тааз, шалны засвар хийх



Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ


Гүйцэтгэгч: Алист констракшн ХХК



Уртбулаг баг

Төсөвт өртөг: 180,000,000 төгрөг
Гэрээний хугацаа: 2024.04.01 - 2024.05.19

Ажлын явц, тайлбар: Засварын ажил бүрэн дууссан. Ашиглалтанд оруулах комисс ажиллах бэлтгэл ажил ханган ажиллаж байна.
Гүйцэтгэлийн хувь: 95%

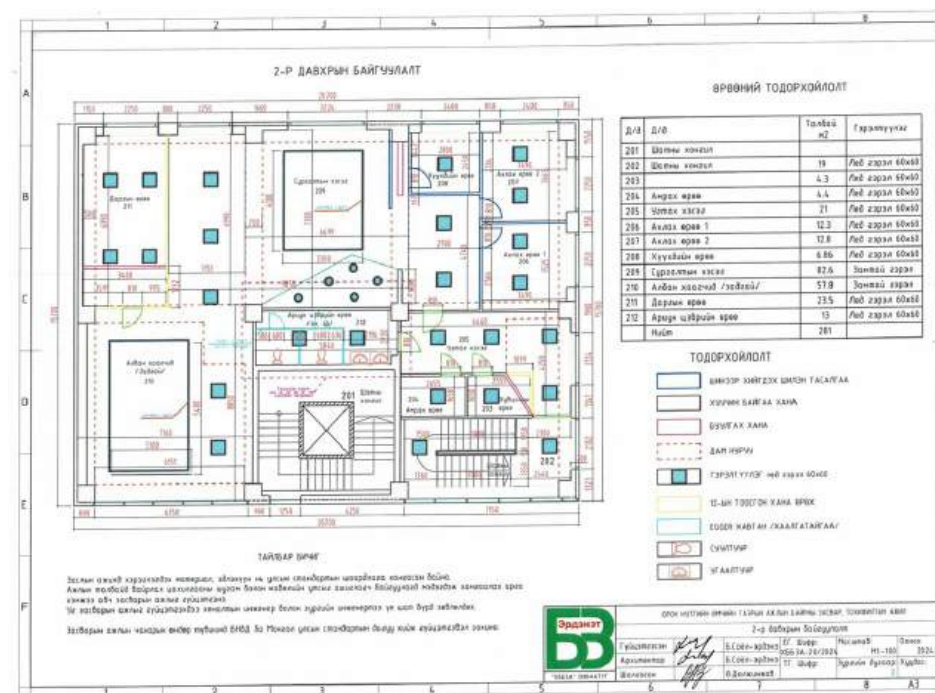

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



2



Ажлын нэр: 24-р цэцэрлэгт хэсэгчилсэн засвар хийх
Ажлын тоо хэмжээ: Нийт 421,83м² талбай бүхий цэцэрлэгийн байрны хана, шал, таазны засвар, халаалтын шугам, цэвэр бохир усны шугам солих ажил, 633,07м² дээврийн засвар, 799м² гадна фасад засварын ажил хийгдэнэ.



Зохиогч: Хотын захирагчийн алба
Гүйцэтгэгч: Эрхэт бүтээл констракшн ХХК

Баянцагаан баг


Төсөвт өртөг: 194,200,000 төгрөг
Гэрээний хугацаа: 2025.06.02-2025.06.30



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ байгуулагдсан.



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

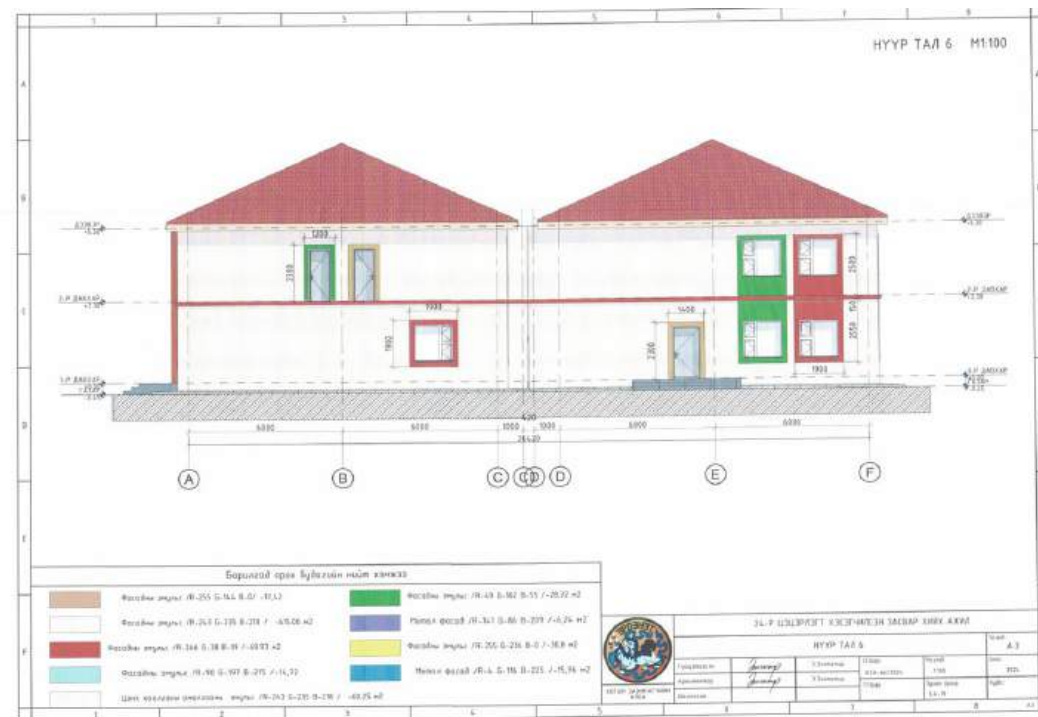

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



Хүснэгт 3

3



Ажлын нэр: 9 дүгээр цэцэрлэгт засвар хийх
Ажлын тоо хэмжээ: Нийт 782м² дээврийн засварын ажил, 1129м² гадна фасад засварын ажил хийгдэнэ.

Зохиогч: Хотын захирагчийн алба




Гүйцэтгэгч: Смайл хаус ХХК



Уурхайчин баг
Төсөвт өртөг: 244,494,000 төгрөг
Гэрээний хугацаа: 2025.06.02-2025.07.01



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ хийгдэж байна.
Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

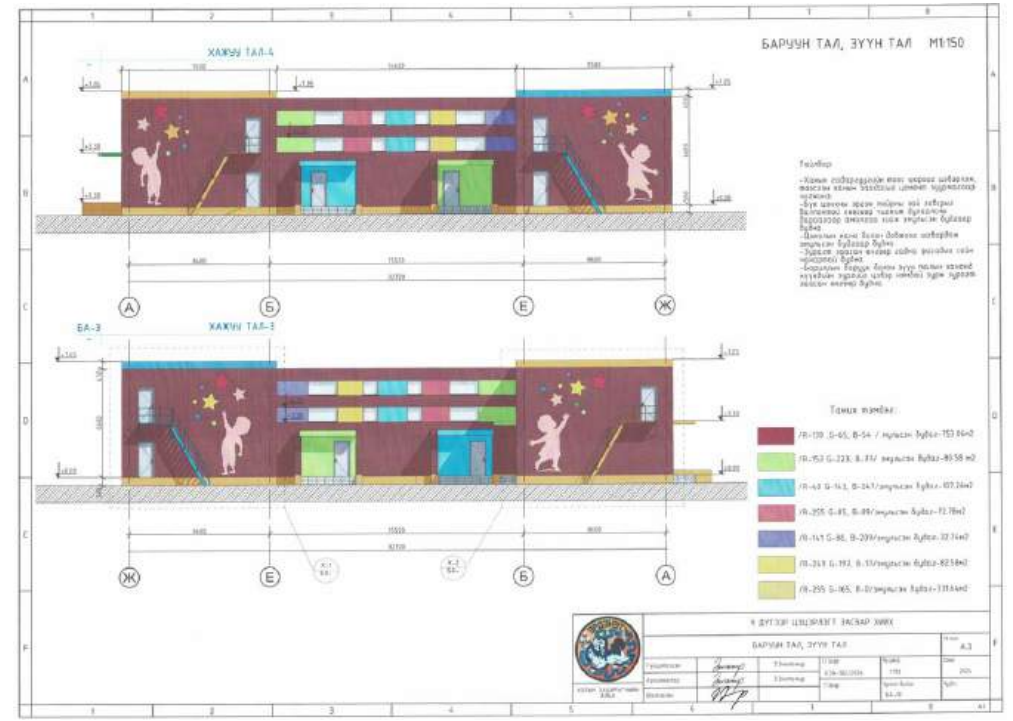

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



4



Ажлын нэр: Баянцагаан баг.18 дугаар сургуулийн дээвэр засварлах
Ажлын тоо хэмжээ: Нийт 800.3м2 техноэласт ЭПП ЭКП хар цаасан дээвэр

Зохиогч: Хотын захирагчийн алба ХХК



Гүйцэтгэгч: Эрхэт бүтээл констракшн ХХК




Баянцагаан баг
Төсөвт өртөг: 130,080,000
Гэрээний хугацаа: 2025.06.01 - 2025.06.30



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ байгуулагдсан.

Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

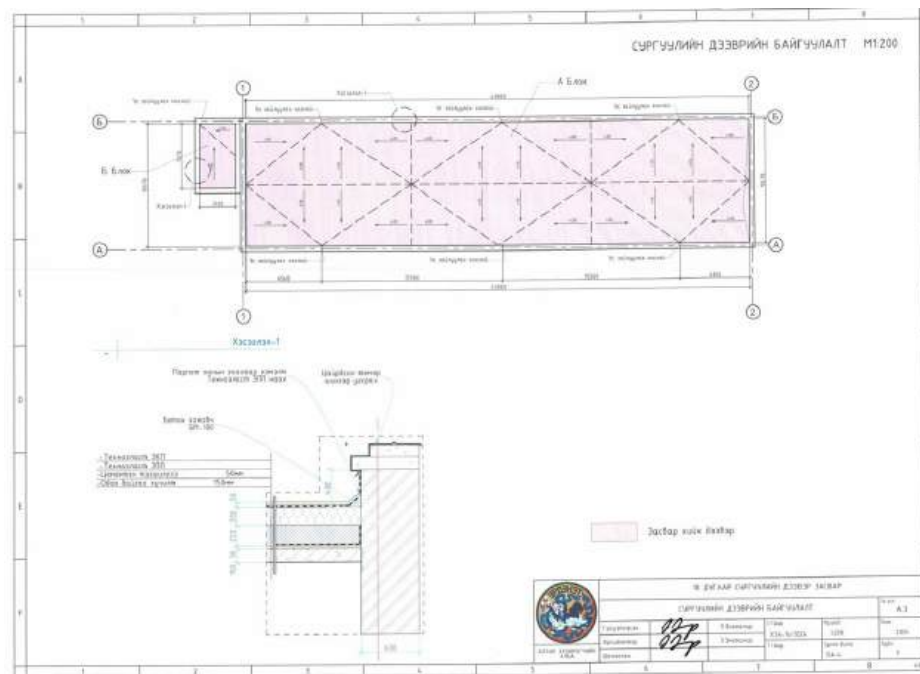

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



6



Ажлын нэр: Жаргалант багийн нийтийн халуун усны байрыг засварлах

Ажлын тоо хэмжээ: Нийт 51,65м² талбай бүхий нийтийн халуун усны байрны хана, тааз шалны засвар, гадна фасад засвар, дээврийн засварын ажлууд хийгдэнэ.

Зохиогч: Орхон прожект ХХК
Гүйцэтгэгч: Соотончоно ХХК



Жаргалант баг


Төсөвт өртөг: 112,400,000

Гэрээний хугацаа: 2025.06.02 - 2025.07.01



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ байгуулагдаж байна.

Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

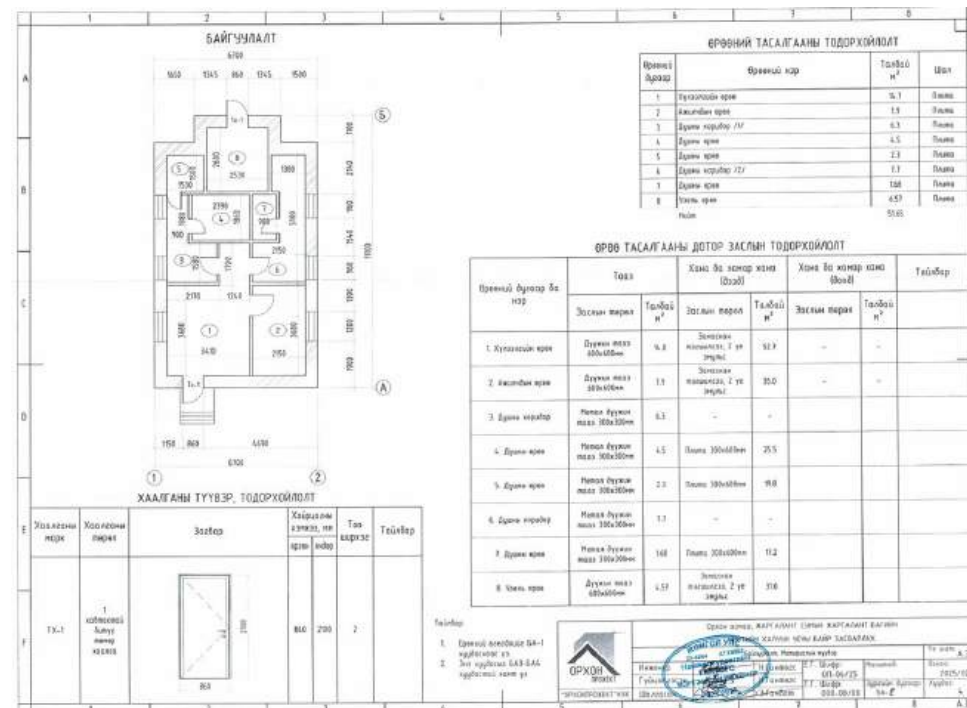

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



7



Ажлын нэр: Улаантолгой багийн нийтийн халуун
усны байрыг засварлах

Ажлын тоо хэмжээ: Нийт 44,5м² талбай бүхий нийтийн халуун усны барилгын хана, таазны засвар, хаяавч, агаар сэлгэлтийн алууд хийгдэнэ.



Зохиогч: Орхон прожект ХХК
Гүйцэтгэгч: Очиртон ХХК

Улаантолгой баг


Төсөвт өртөг: 58,200,000
Гэрээний хугацаа: 202.05.16 - 2025.06.16



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ байгуулагдсан.
Буулгалтын ажил хийгдэж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 5%

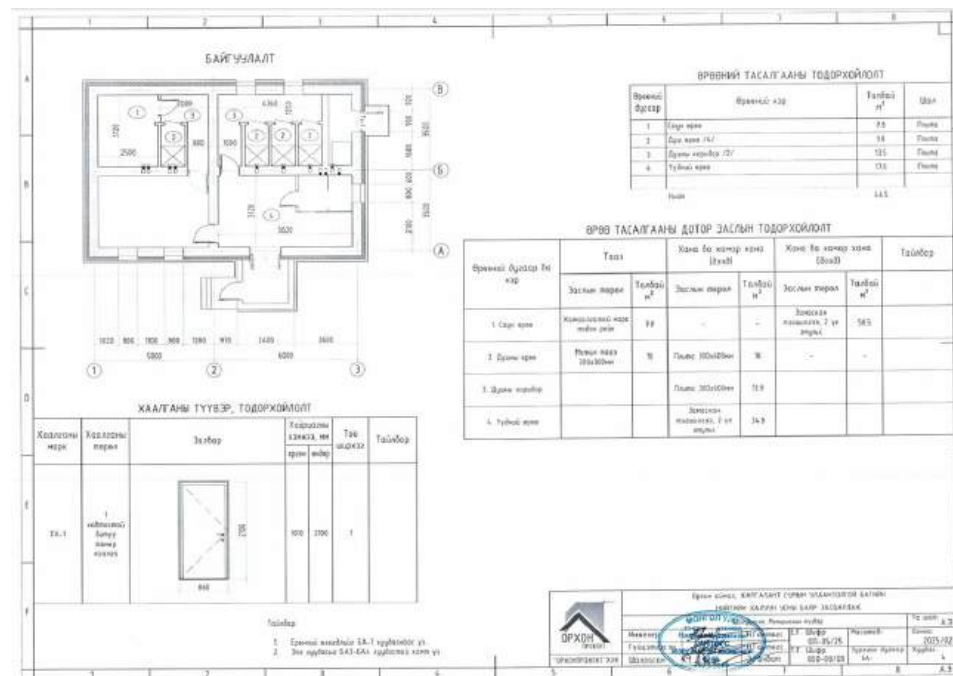

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



Гүйцэтгэгч: Цагаан бүргэд констракшн ХХК



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



1



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Наран баг 960 хүүхдийн 3-р сургуулийн барилга

Ажлын тоо хэмжээ: А-блок 26*25, В-блок 42*16, С-блок 42*16, D-блок 39.340*21.340 харьцаатай зоорьтой Здавхар барилга



Зохиогч: Нутаг консалтинг ХХК

Гүйцэтгэгч: Уран хангай групп ХХК



Наран баг


Төсөвт өртөг: 15,99,339,536тэр.төг

Гэрээний хугацаа: 2022.07.08 - 2025.08.31



Ажлын явц, тайлбар:Дотор заслын ажил хийгдэж байна.

Гүйцэтгэлийн хувь: 65%

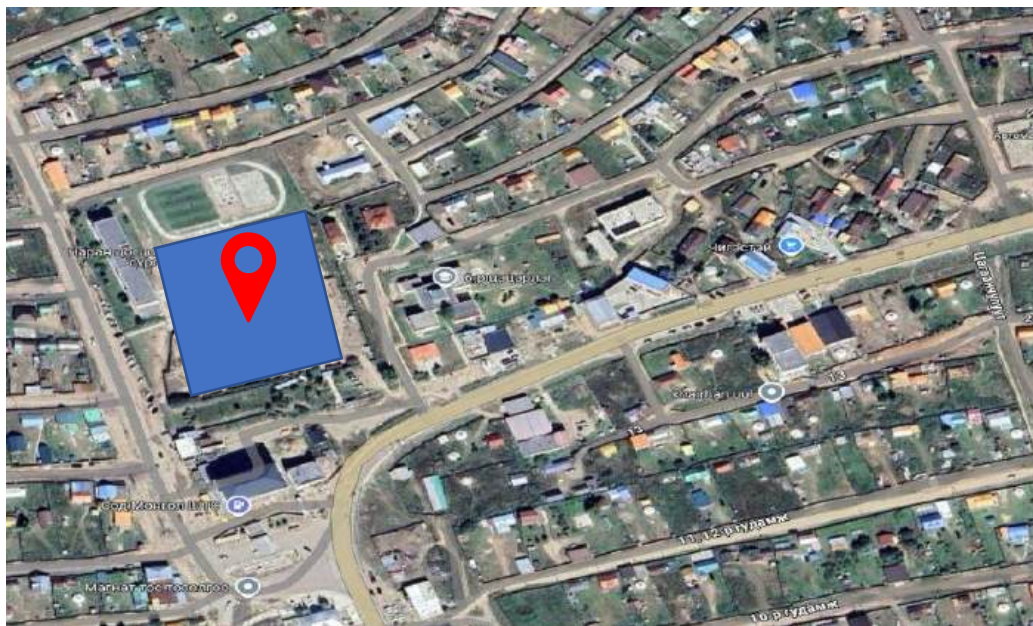



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025" ТАНИЛЦУУЛГА



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Дэнж багийн төрийн үйлчилгээний Нэгдсэн төвийн барилга
Ажлын тоо хэмжээ: 17500*27500 харьцаатай зоорьтой 2 давхар барилга

Зохиогч: Гранд тек ХХК




Гүйцэтгэгч: Мөнх мацу ХХК



Дэнж баг
Төсөвт өртөг: 3,949,172,991тэр.төг
Гэрээний хугацаа: 2024.05.23 - 2025.06.20



Ажлын явц, тайлбар:Хананы дүүргэлтийн өрлөгийн ажил хийгдэж байгаа
Гүйцэтгэлийн хувь: 65%

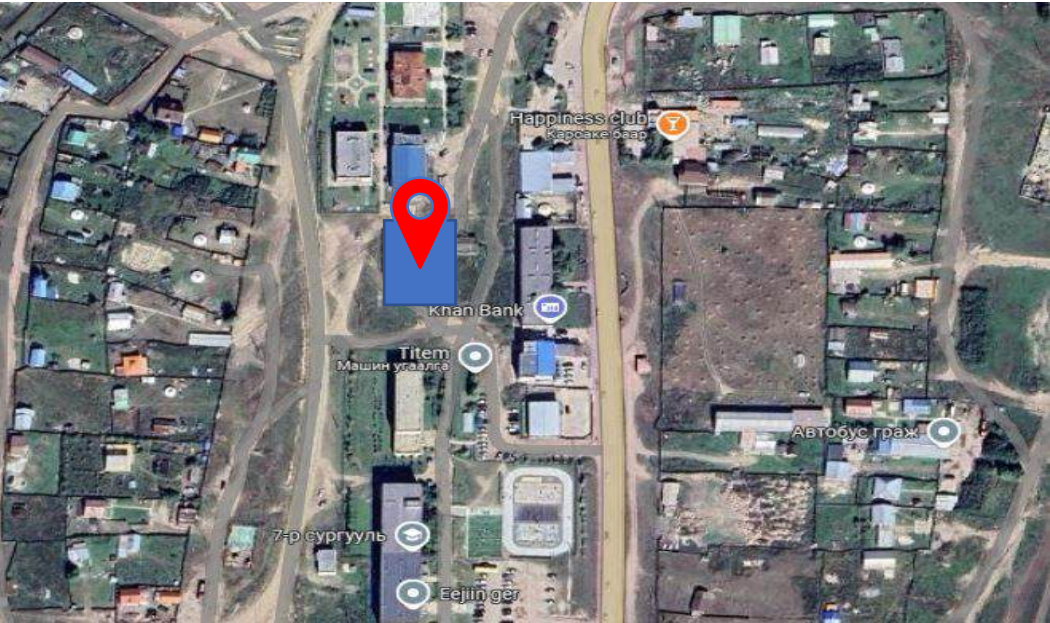

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025" ТАНИЛЦУУЛГА	Нэр	Гэрээний үзэг	Эхлэл
Гранд Тек ХХК-ийн захирагч	Г.Энх-Амгалан	Г.Энх-Амгалан	Г.Энх-Амгалан
Ажилтан	Б.Доржпунсал	Б.Доржпунсал	Б.Доржпунсал
Хотын захирагчийн алба	Б.Одгэрал	Б.Одгэрал	Б.Одгэрал



3



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Уртбулаг, Бүрэнбүст багийн 1-р цэцэрлэгийн цонх шинэчлэх
Ажлын тоо хэмжээ: Хуванцар рамтай вакуум 72мм цонх 110ш, Цонхны пластмасан хуванцар тавцан 78м2



Зохиогч: Захирагчийн алба

Гүйцэтгэгч: Сонгино тамир ХХК




Уртбулаг баг

Төсөвт өртөг: 343,668,865сая.төг
Гэрээний хугацаа: 2025.05.23 - 2025.07.08

Ажлын явц, тайлбар:Бэлтгэл ажил хангаж байна үе шатны хувиарын дагуу ажил эхэлнэ.

Гүйцэтгэлийн хувь: 10%

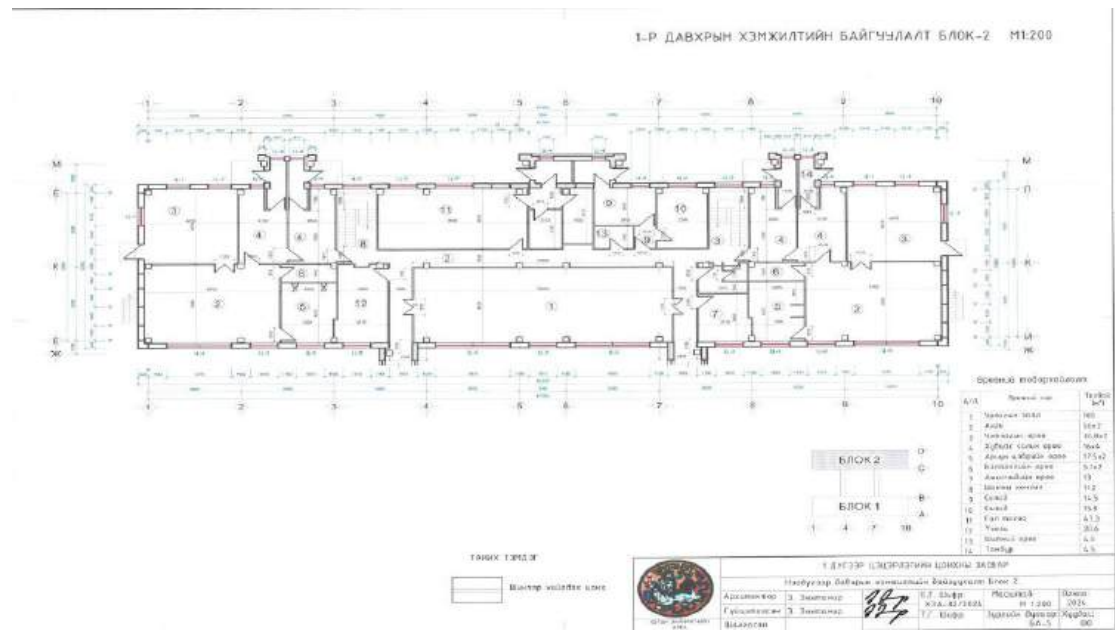

4



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Урт цагаан дахь хүүхдийн номын санд засвар хийх

Ажлын тоо хэмжээ: хана эмульдэх 223.7м2 тааз эмульс 752.92м2 амьсгалдаг обой 178.85м2 гантиг чулуугаар хана хийх 8.18м2 модон рейк 4м2 зураг зурах 78м2

Зохиогч: Түмний хүртээл ХХК



Гүйцэтгэгч: Ланд арч ХХК




Хүрэн булаг баг

Төсөвт өртөг: 491,148,308.сая.төг

Гэрээний хугацаа: 2025.06.03 - 2025.08.06

Ажлын явц, тайлбар: Бэлтгэл ажил хангаж байна үе шатны хувиарын дагуу ажил эхэлнэ.

Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

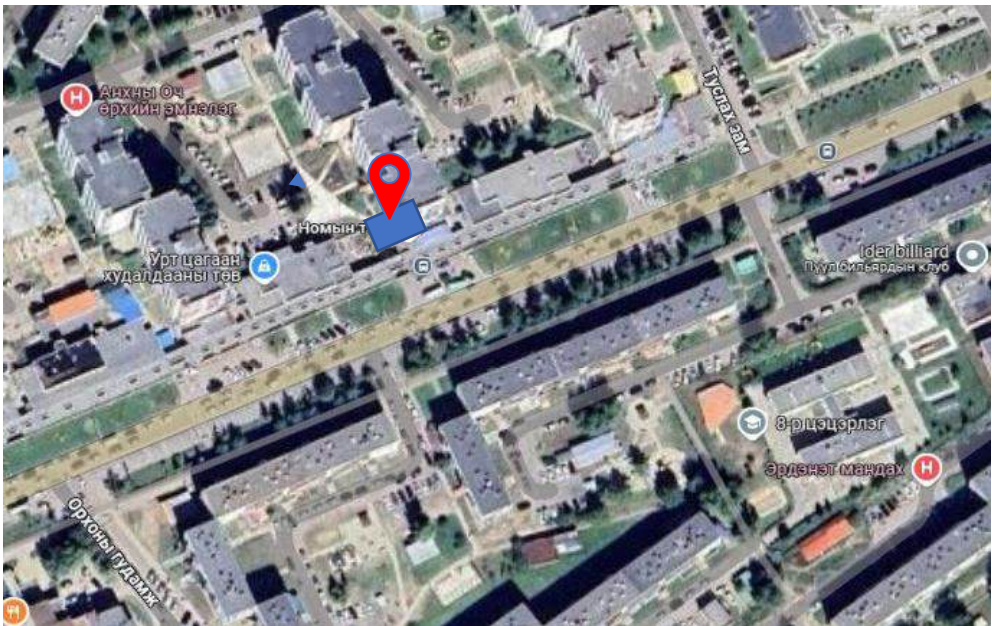

Хүүхдийн номын сан



Гүйцэтгэл	НЭР	ГАРХАН ҮСЭГ	ЗАГВАР ЗУРАГ	Тайлбар
Гүйцэтгэл: "Түмний хүртээл" ХХК	В.Дугаржав	ЭБ		
Засгийн алба: Орхон аймаг баян өндөр сумын засаг дарга				
Номын санд хийгдэх төрийн бус байгууллага	В.Цэцэг		2024.11	



5



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Цагдаагийн газрын нэгдүгээр байрны засвар

Ажлын тоо хэмжээ: Барилгын дотор засвар

Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ



Гүйцэтгэгч: Баялаг тавиун уужим констракшн ХХК

Баян цагаан баг

Төсөвт өртөг: 42,552,925.сая.төг





Гэрээний хугацаа: 2025.06.02 - 2025.07.01



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ хийх үе шатандаа явж байна.

Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

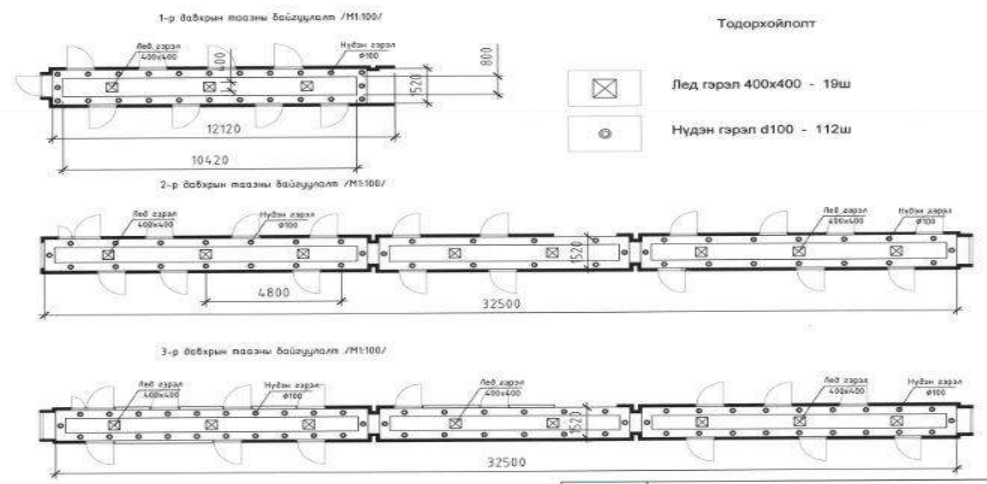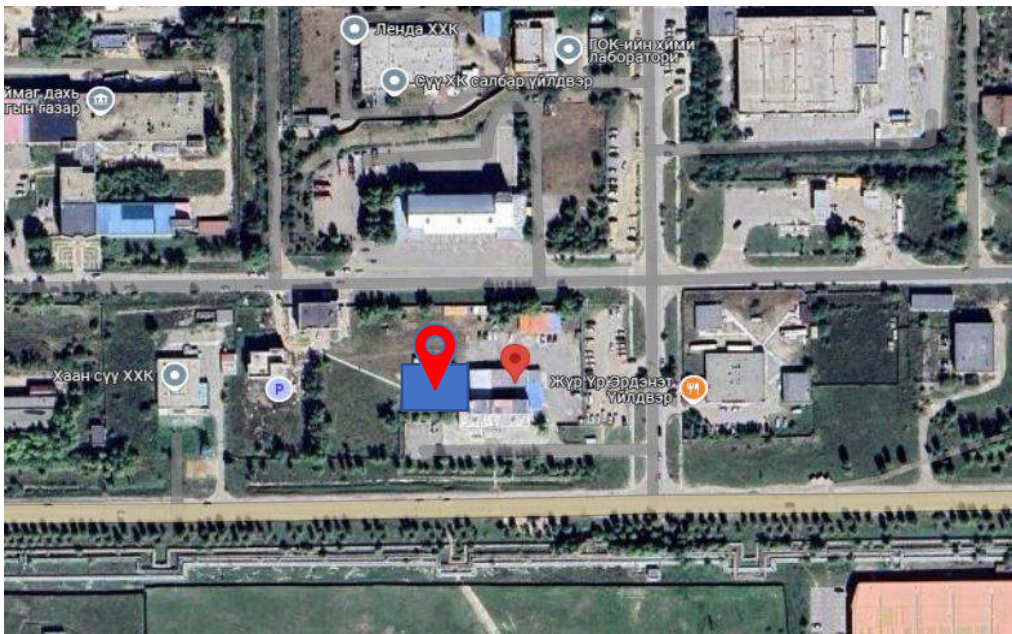

Эрдэнэт		ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН НЭГДҮГЭЭР БАЙРНЫ ЗАСВАР		Тоо мөн.
ХББЗА ОНӨААТҮГ		Төсвийн байгууллага		А.З
Ажиллагаа	И.Саруултүвшин	И.Шагва	Нөхцөл	Огноо
Гүйцэтгэгч	И.Саруултүвшин	И.Шагва	Хугацаа	2025.12
Бэлдсэн	И.Должикова	И.Шагва	Хугацаа	2025.12



ᠬᠥᠷᠦᠨᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠲᠤ-2025" ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠤᠭᠤᠯᠭ᠋᠎ᠠ

6



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Гаалийн газрын байрны гадна фасад засварлах
Ажлын тоо хэмжээ: Гадна фасад сэргээн засах 606.6м2

Зохиогч: НБИК ХХК



Гүйцэтгэгч: Тэнүүн төвөргөөн ХХК

Баянцагаан баг

Төсөвт өртөг: 59,552,120.сая.төг
Гэрээний хугацаа: 2025.05.28 - 2025.06.28



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ хийх үе шатандаа явж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%





ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025" ТАНИЛЦУУЛГА



7



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Прокурорын газрын байрны дотор засвар хийх
Ажлын тоо хэмжээ: Байрны дотор засвар

Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ





Гүйцэтгэгч: ЖЗЦУГ ХХК



Уртбулаг бар
Төсөвт өртөг: 49,283,590.сая.төг
Гэрээний хугацаа: 2025.05-28 2025.06.27



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ хийх үе шатандаа явж байна.
Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

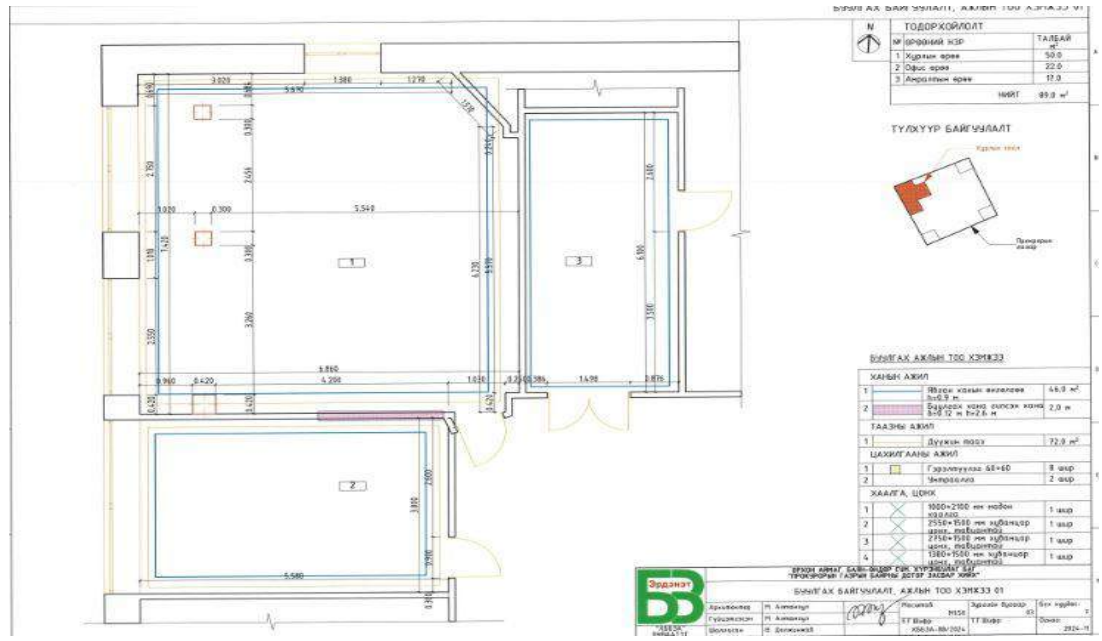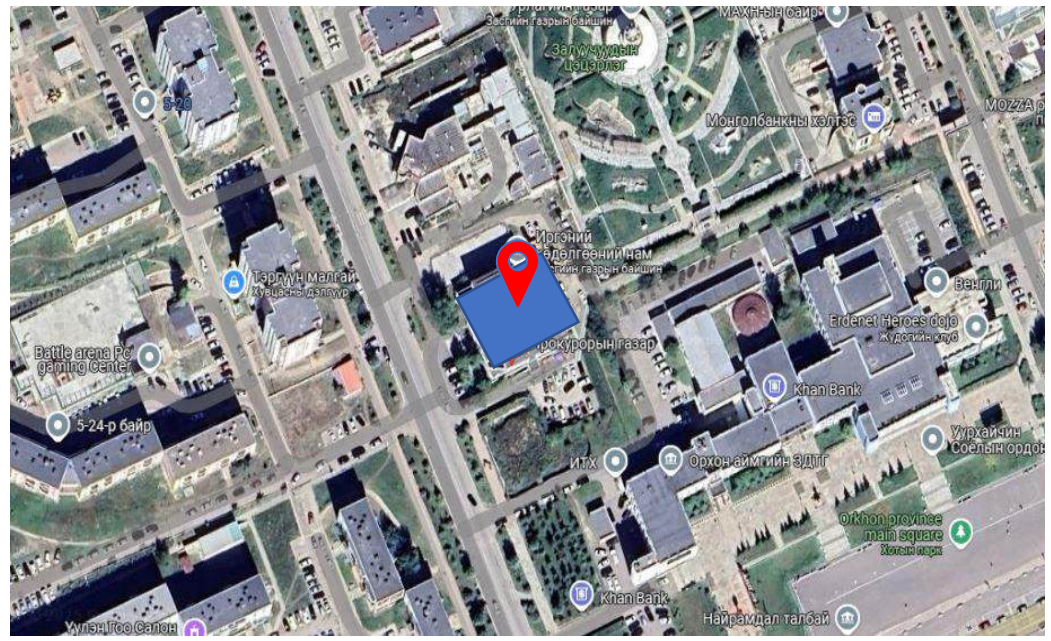



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025" ТАНИЛЦУУЛГА

8



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Хүрэнбулаг баг 4-9-2-р блокын дээвэр засварлах
Ажлын тоо хэмжээ: Дээвэр засвар
Техноэласт ЭПП, ЭКП хар цаасаар дээвэр хийх 435м2

Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ


Гүйцэтгэгч: УУДАМ БУЛАГ ХХК



Хүрэн булаг баг
Төсөвт өртөг: 68,764,946.сая.төг
Гэрээний хугацаа: 2025.05-23 2025.06.23

Ажлын явц, тайлбар: Бэлтгэл ажил хангаж байна
үе шатны хувиарын дагуу ажил эхэлнэ

Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

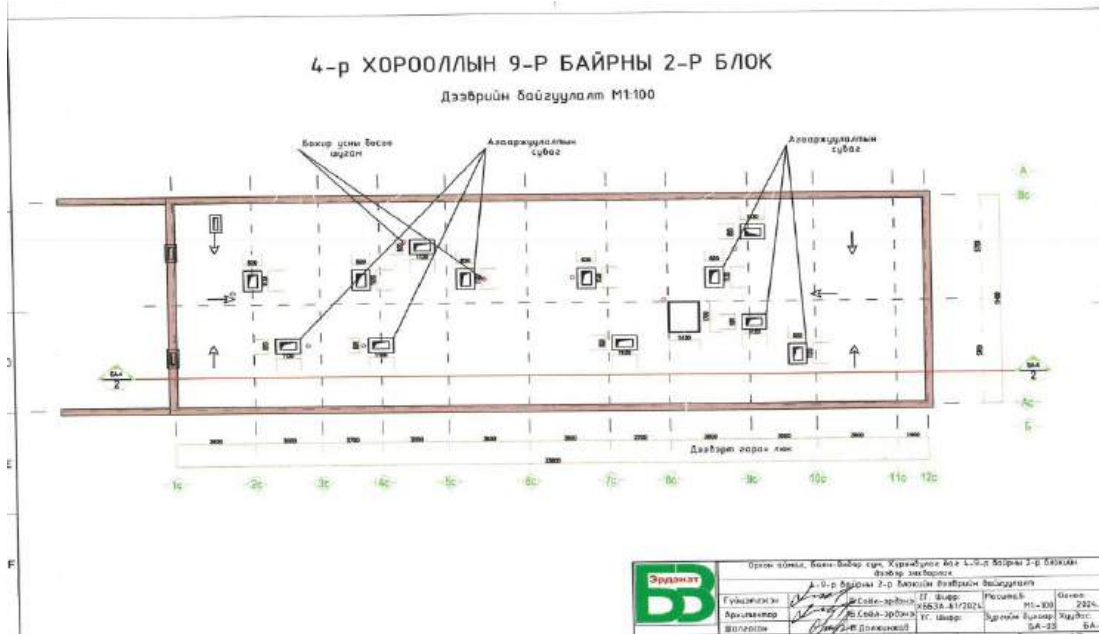



ИРГЭДИЙН ГЭР БҮЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ ЧАДВАРТ НИЙЦСЭН ӨРТӨГ БҮХИЙ
ОРОН СУУЦААР ХАНГАХ 30 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: Жаргалант сумын 2023 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн 5,4 тэрбум.төг

ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА: Ажил эхлэх 2023 оны 05 сарын 31

Ажил дуусах 2024 оны 11 сарын 25

АЖЛЫН ЯВЦ: Барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж 2024 оны 10-р сарын 24-ны өдөр 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй урьдчилсан техникийн комисс ажиллаж инженерийн шугам сүлжээний туршилт тохируулга, өгөгдсөн үүрэг даалгавар биелүүлсэн. Техникийн комиссын шийдвэрээр ашиглалтад оруулах комисс ажиллах боломжтой гэж дүгнэсэн бөгөөд Газрын харилцах барилга, хот байгуулалтын газрын баталсан ашиглалтад оруулах №20/2024 тоот 16 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй комисс 2024 оны 11-р сарын 22-ны өдөр ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан.

ГҮЙЦЭТГЭГЧ: Сигма Эс ХХК

ЗОХИОГЧ: Брэнд архитектур дизайн ХХК



**НИЙТ
ТАЛБАЙ
3819 м.кв**



**ТӨСЛИЙН ХҮЧИН
ЧАДАЛ
30 айл**



**ИЛ ДАЛД АВТО
ЗОГСООЛ**

25 ш



**НОГООН
БАЙГУУЛАМ,ТОГЛООМЫН
ТАЛБАЙ**

3000 м.кв

מחנכים לא יעצמו עיניים ולא יסלקו את המעורבות של ההורים



15 ДУГААР БАЙРНЫ ОРОН СУУЦНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: Жаргалант сумын 2024 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн 990,173,850 төг

ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА: Ажил эхлэх 2024 оны 09 сарын 16

Ажил дуусах 2025 оны 05 сарын 30

АЖЛЫН ЯВЦ: Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ-аас батлан байгуулагдсан ашиглалтад оруулах №25/02/005 тоот 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй комисс 2025 оны 04-р сарын 29-ны өдөр ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан.

ГҮЙЦЭТГЭГЧ: Сэнгүн констракшн ХХК

ЗОХИОГЧ: Орхон прожект ХХК



ТӨСЛИЙН ХҮЧИН
ЧАДАЛ

12 айл



ИЛ АВТО
ЗОГСООЛ

12 ш



ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН УРТЫН ГОЛ БАГТ БАРИГДАХ 260 АЙЛЫН 5 БЛОК ОРОН СУУЦНЫ ЦОГЦОЛБОР



Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын уртын гол багт баригдах 260 айлын 5 блок орон сууцны цогцолбор



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: 27.4 тэрбум төг

ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА: Ажил эхлэх 2022 оны 06 сарын 16

Ажил дуусах 2025 оны 12 сарын 30

АЖЛЫН ЯВЦ: Хотхоны 5 блок (А, В, С, D, E) орон сууцны барилгын 4 блок (А, В, С, D)-д 2021-2025 оны 05 дугаар сарын байдлар 208 айлын орон сууцны барилгад ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж хүлээн авсан.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУВЬ: 80% (E блокын барилга угсралт, гадна тохижилтын ажил үлдсэн)

ГҮЙЦЭТГЭГЧ: Неман констракшн ХХК

ЗОХИОГЧ: Критев монголиа ХХК


**НИЙТ
ТАЛБАЙ**
1,8 га


**ТӨСЛИЙН ХҮЧИН
ЧАДАЛ**
260 айл


**ИЛ АВТО
ЗОГСООЛ**
50 ш


**ДАЛД АВТО
ЗОГСООЛ**
75 ш


**НОГООН
БАЙГУУЛАМ, ТОГЛООМЫН
ТАЛБАЙ**
1.1 га



“ЭРДЭНЭТЭД ҮЙЛДВЭРЛЭВ” ХУДАЛДААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГА



МОНГОЛЫН ХАМГААГАХ, АЖАЙЗЛАХ, ХАМГААГАХ
МОНГОЛЫН ХАМГААГАХ, АЖАЙЗЛАХ, ХАМГААГАХ
МОНГОЛЫН ХАМГААГАХ, АЖАЙЗЛАХ, ХАМГААГАХ



БАЙРШИЛ: Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Цагаанчулуут баг

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: 2024 оны Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
3,5 тэрбум төг

ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА: Цутгамал төмөрбетон араг бүтээцтэй, блок дүүргэгчтэй, цутгамал төмөрбетон хучилттай, тэнхлэгээрээ 30.0х21.0м хэмжээтэй хагас зоорьтой 2 давхар барилга. Агуулах 360м.кв (зоорь нэмсэн 192,7м.кв), худалдаа үйлчилгээний 800м.кв

ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА: Ажил эхлэх 2024 оны 10 сарын 14
Ажил дуусах 2025 оны 07 сарын 18

АЖЛЫН ЯВЦ: Газар шорооны ажил хийгдсэн бөгөөд буурь хөрсний нягт хангагдсан. Хөрс геологийн дүгнэлттэй тохирсон учир барилга угсралтын үе шатны ажил эхлэсэн. Суурийн болон зоорийн давхарын төмөрбетон цутгалтын ажил хийгдсэн. Гүйцэтгэлийн хувь 30%

ГҮЙЦЭТГЭГЧ: Сэнгүн констракшн ХХК

ЗОХИОГЧ: Эрдэнийн хүчит суурь ХХК



НИЙТ
ТАЛБАЙ

1500 м.кв



ТӨСЛИЙН ХҮЧИН
ЧАДАЛ

800 м.кв



ИЛ АВТО
ЗОГСООЛ

30 ш



ЗАДГАЙ
ТАЛБАЙ

645 м.кв



НОГООН
БАЙГУУЛАМ,ТОГЛООМЫН
ТАЛБАЙ

562 м.кв

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ТАЛБАЙ





Зохиогч: Үндсэн төсөл ХХК




Төсөвт өртөг: 345,000,000
Гэрээний хугацаа: 2025.05.21 - 2025.06.30



Ажлын явц, тайлбар: Төмөр хийцийн бэлдцийн ажил хийгдэж байна.

Гүйцэтгэлийн хувь: 60%

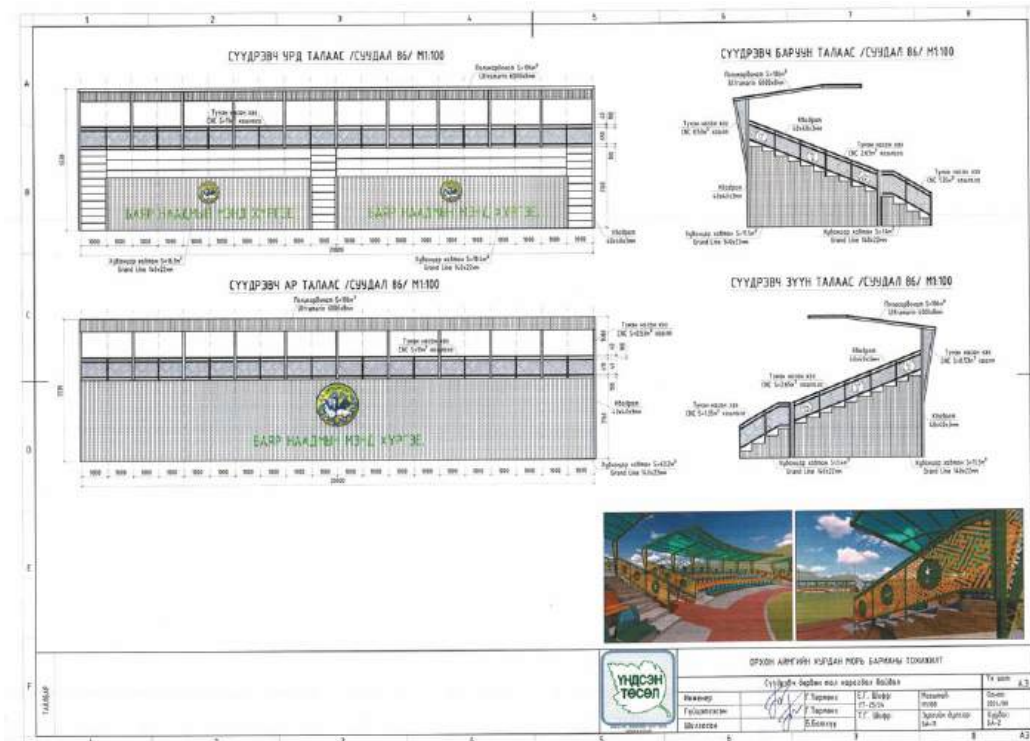

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



Ажлын нэр: Баян-Овоот ууланд шинээр ойн төгөл байгуулах мод тарих нөхцөлийг бүрдүүлж, хамгаалалтын хашаа барих

Ажлын тоо хэмжээ: 1,85м өндөр 669м урт төмөр торон хашаа



Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ

Гүйцэтгэгч: Рино инженеринг ХХК



Баян-Овоот баг
Төсөвт өртөг: 78,040,025
Гэрээний хугацаа: 2025.05.20 - 2025.06.20



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ байгуулсан. Төмөр хийцийн бэлдэц хийгдэж байна.

Гүйцэтгэлийн хувь: 5%



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



11



Ажлын нэр: Вокзалын зүүн талын ногоон зурвасын хамгаалалтын хашааг сэргээн засварлах
Ажлын тоо хэмжээ: 1,55м өндөр 427м урт төмөр торон хашаа



Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ

Гүйцэтгэгч: Рино инженеринг ХХК




Баянцагаан баг




Төсөвт өртөг: 46,135,237
Гэрээний хугацаа: 2025.05.20 - 2025.06.20

Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ байгуулсан. Төмөр хийцийн бэлдэц хийгдэж байна.

Гүйцэтгэлийн хувь: 5%

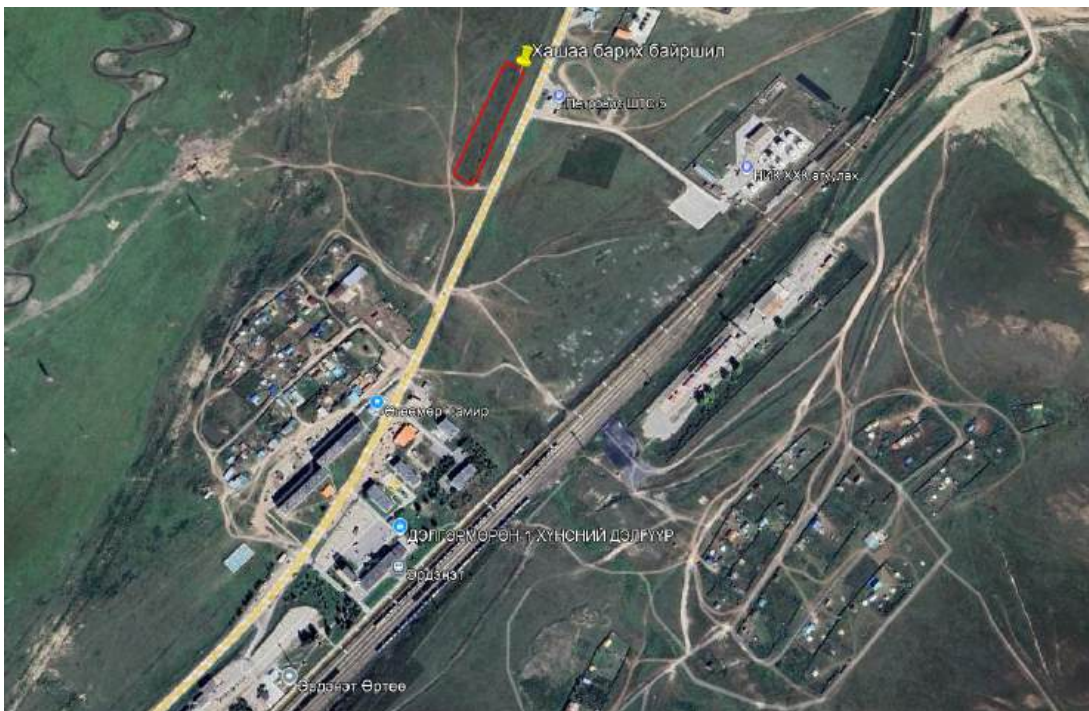

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан

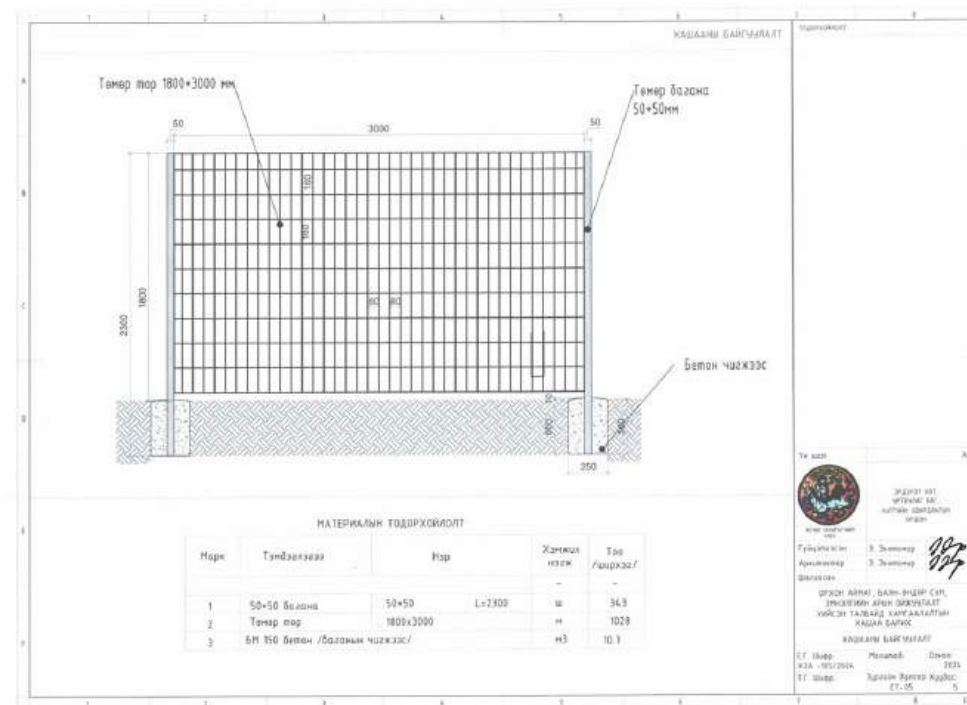

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



13



Ажлын нэр: Чийрэгжүүлэлтийн талбайд саравч барих ажил

Ажлын тоо хэмжээ: 4.4х4.4м хэмжээтэй 8талт бөөрөнхий саравч 1ш саравч

Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ



Гүйцэтгэгч: Шинэ Зууны Эрдэнэт ХХК

Жаргалант баг


Төсөвт өртөг: 25,200,000 төгрөг
Гэрээний хугацаа: 2025.06.02 - 2025.07.01



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ байгуулагдаж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

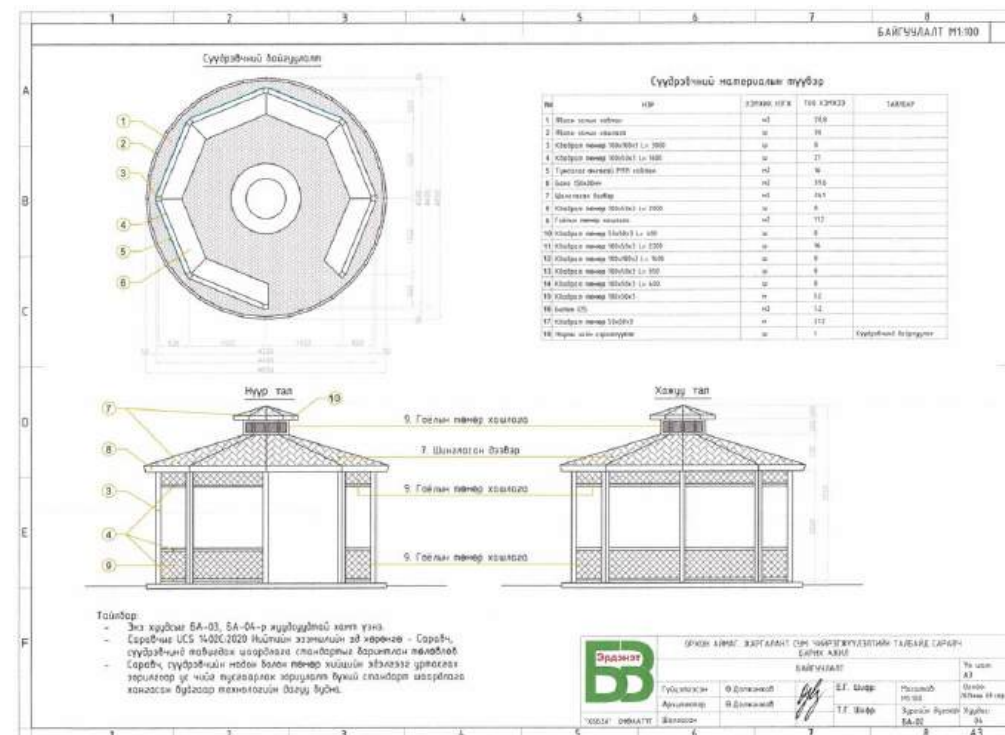

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



14



Ажлын нэр: Жаргалант багийн суврагатай толгой дээр саравч барих ажил
Ажлын тоо хэмжээ: 4.4х4.4м хэмжээтэй 8талт бөөрөнхий саравч 1ш саравч



Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ
Гүйцэтгэгч: Шинэ Зууны Эрдэнэт ХХК

Жаргалант баг


Төсөвт өртөг: 24,100,000
Гэрээний хугацаа: 2025.06.02 - 2025.07.01



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ байгуулагдаж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

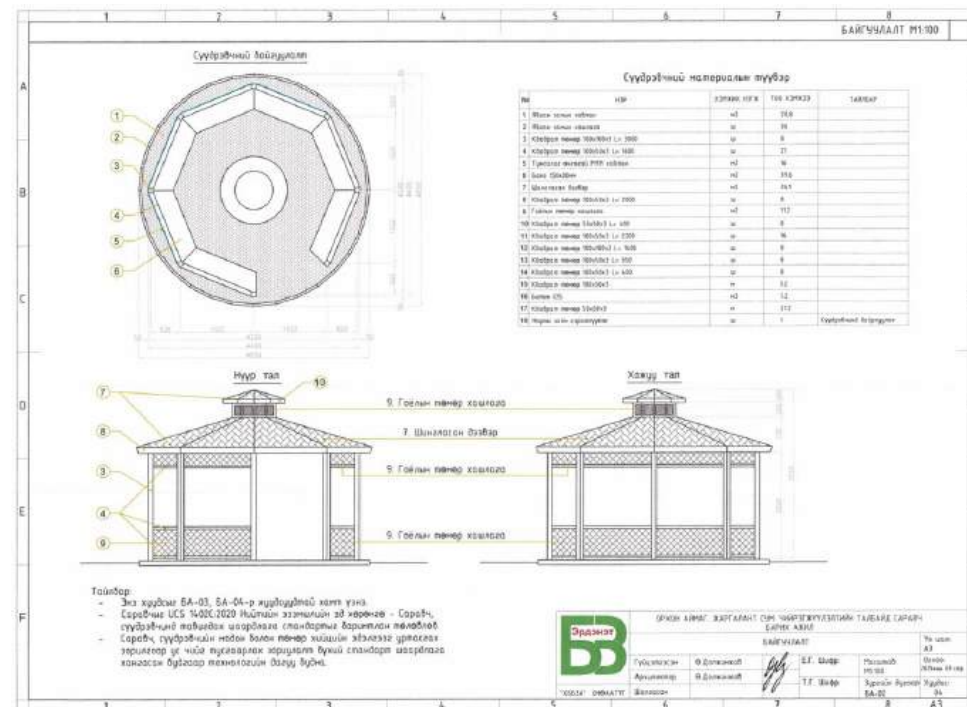

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан

15



Ажлын нэр: Дулаан-Уул багийн нутаг дэвсгэрт айргийн хөндийд саравч барих ажил
Ажлын тоо хэмжээ: 4.4х4.4м хэмжээтэй 8талт бөөрөнхий саравч 1ш саравч

Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ



Гүйцэтгэгч: Мэргэн гүн хийморь ХХК

Дулаан-Уул баг



Төсөвт өртөг: 27,000,000
Гэрээний хугацаа: 2025.05.12 - 2025.06.10



Ажлын явц, тайлбар: Төмөр хийцийн ажил хийгдэж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 50%

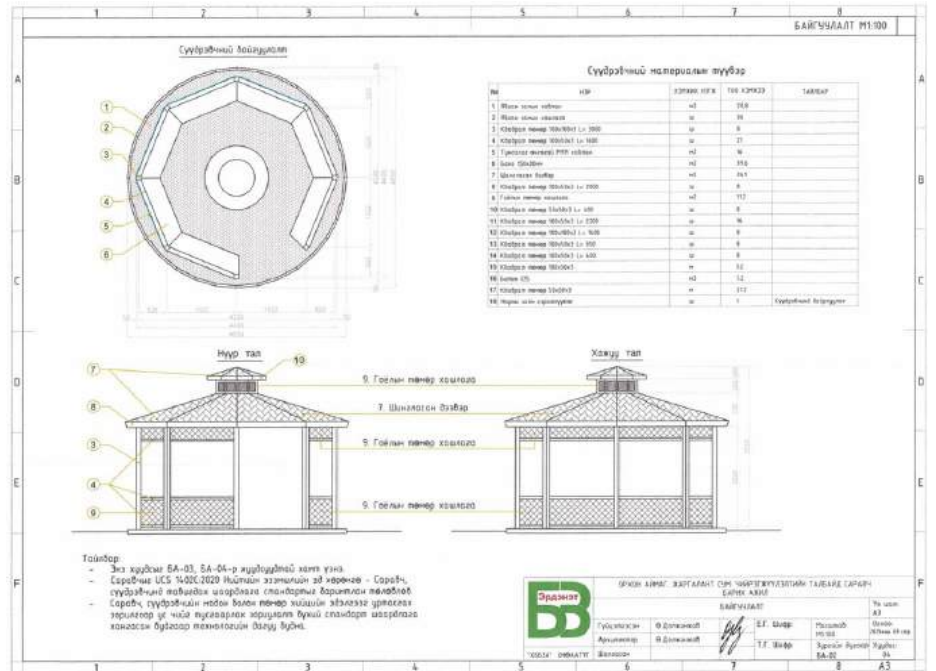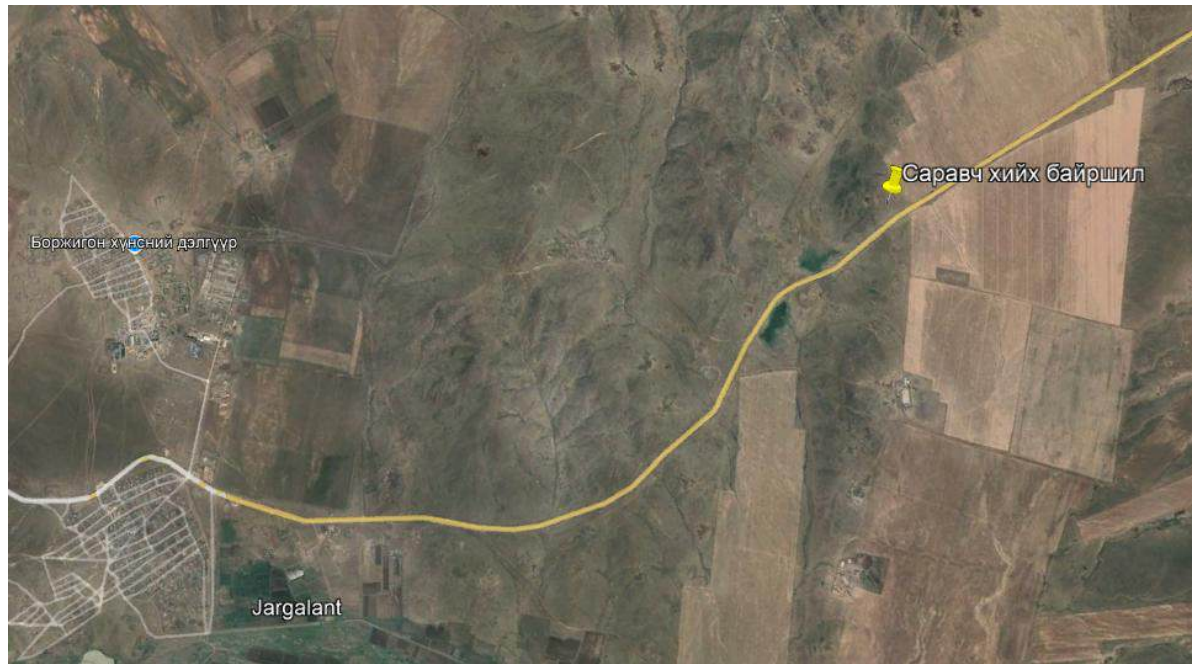



ᠬᠥᠷᠦᠨᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠲᠤ-2025" ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠤᠭᠤᠯᠭ᠋᠎ᠠ

1



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум Рашаант баг 26р гудамжны зүүн тал, 13 болон 29р гудамжны дунд автомашины гүүрэн гарц хийх ажил
Ажлын тоо хэмжээ: 1000мм голчтой ган хоолойтой түшиц хана толгой ханатай автомашины гүүрэн гарц-2ш
Зохиогч: Орхон прожект ХХК
Гүйцэтгэгч: Алист констракшн ХХК



Рашаант баг
Төсөвт өртөг: 47,000,000 төгрөг
Гэрээний хугацаа: 2025.05.15 - 2025.06.14
Ажлын явц, тайлбар: Ажлын гүйцэтгэл 98%
Гүйцэтгэлийн хувь: 98%

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг, 26-р гудамжны зүүн тал 13 болон 29-р гудамжны дунд авто машины гүүрэн гарц хийх ажлын зураг

Зургийн шифр: ОП - 27/2024

Ангийн нэр	Тайлбар	Харгал
Ажлын үнэмлэх	Ажлын үнэмлэх	Ажлын үнэмлэх
Ажлын үнэмлэх	Ажлын үнэмлэх	Ажлын үнэмлэх

Орхон аймаг 2024 он

БАЙРШЛЫН СХЕМ

ТАНИЛЦУУЛГА

Тайлбар	Тайлбар
Хайрлан сууригч	Хайрлан сууригч
Хайрлан сууригч	Хайрлан сууригч

Байгуулалт М1:50

Огтлол 2-2

Огтлол 1-1

Ажлын тоо хэмжээ

Д/д	Нэр төрөл	Хэмжээ нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрс ухах	м³	82
2	Хайрган дэвсгэр b=100мм	м³	3.52
3	Ган хоолой угсрах L=6000мм	ш	1
4	ЦТБ тулгуур цутгах	Бетон м³ Арматур тн	0.6 0.063
5	ЦТБ гүүрэн гарц цутгах	Бетон м³ Арматур тн	1.2 0.180
6	Хар тосон түрхлэг 2 үе	м²	0.5
7	Хайрган хучилт хийх /замд тохиромжтой/	м³	115
8			

Тайлбар бичиг
Энэхүү тоо хэмжээгээр 2ш авто машины гүүрэн гарц барина.

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг, 26-р гудамжны зүүн тал 13 болон 29-р гудамжны дунд авто машины гүүрэн гарц хийх ажлын зураг

БАЙГУУЛАЛТ, ОГТЛОЛ

Архитектор: Л.Отгонтуул
Гүйцэтгэсэн: Л.Отгонтуул
Шалтгаан: Э.Ганбат

Э.Г. Шифр: ОП - 27/24
Масштаб: М1:1000
Зургийн дугаар: 000-00/00

Огноо: 2024
Хуудай: 4





ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025” ТАНИЛЦУУЛГА



1



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум Рашаант багт үерийн сувагжилт хийх ажил

Ажлын тоо хэмжээ: 89м урттай 1метрийн өргөнтэй ус зайлуулах суваг хийх, мөн Ф1000мм ган хоолой түшиц хана, толгой хана цутгах



Зохиогч: Орхон прожект ХХК
Гүйцэтгэгч: Алист констракшн ХХК



Рашаант баг


Төсөвт өртөг: 96,000,000 төгрөг

Гэрээний хугацаа: 2025.05.15-2025.06.14



Ажлын явц, тайлбар: Ажлын гүйцэтгэл 50%

Гүйцэтгэлийн хувь: 50%

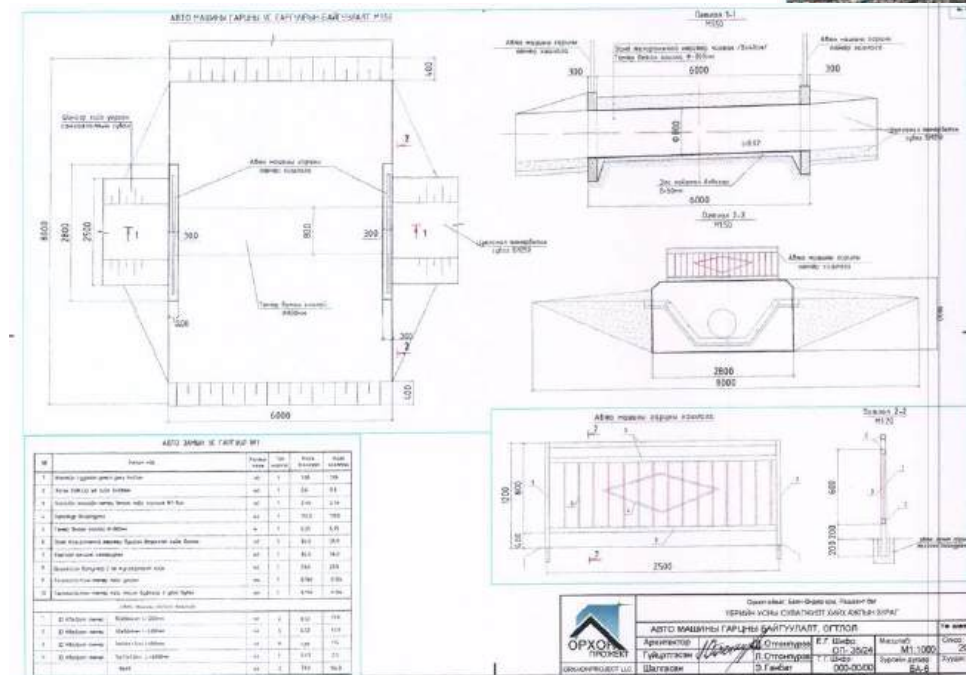



1



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум Рашаант багийн нутаг дэвсгэрт модот гудамж байгуулах

Ажлын тоо хэмжээ: 349м² явган зам, 2116м² ногоон байгууламж байгуулах ажил

Зохиогч: Орхон прожект ХХК

Гүйцэтгэгч: Алист констракшн ХХК



Рашаант баг

Төсөвт өртөг: 98,000,000 төгрөг

Гэрээний хугацаа: 2025.05.26-2025.07.05



Ажлын явц, тайлбар: Ажил эхлэх хугцаа болоогүй байгаа.




Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

Зургийн шифр: ОП - 43/2024

ОРХОН АЙМАГ, БАЯН-ӨНДӨР СУМ, РАШААНТ БАГ.
МОДОТ ГУДАМЖ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ЗУРАГ

ЖӨБӨЛӨРӨСӨН		ДОЛООРМУСЛАК			
Айбан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	Түгээлгэн		
				Айбан тушаал "Эрхэн хуульчил" ХХК-ийн захирал	Нэр Б.Ганбал
			Замнагч 	Айбан тушаал / иргэн Орхон-аймгийн Боловсролын Улсын Засаг Засаг	Нэр Ы.Бадархуяг

ОРХОН АЙМАГ 2024 ОН

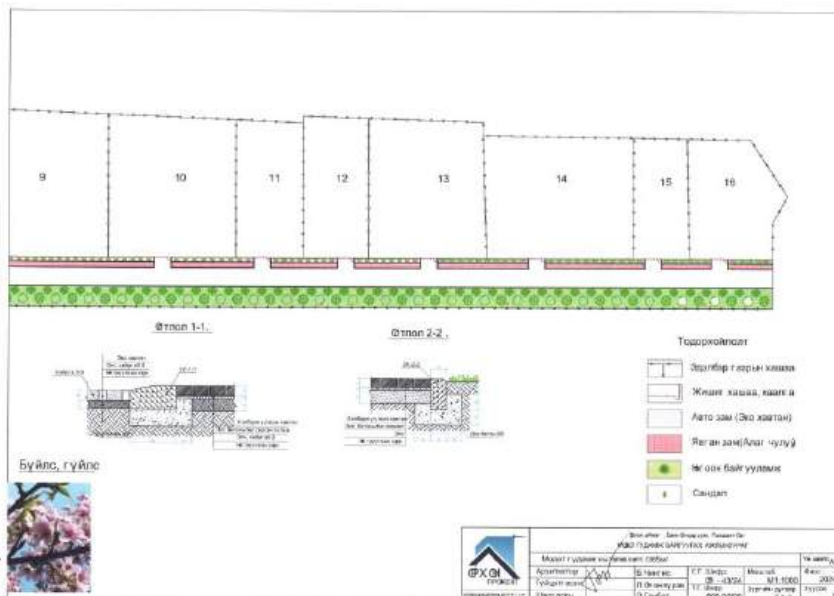

Бүйлс, гүйлс



Ажлын нэр: Ногооны талбайн хашаажуулах ажлыг үргэлжүүлэн хийх (Хар будааны хөндий)

Ажлын тоо хэмжээ: 1,5м өндөртөй төмөр торон хашаа 6100м урт

Зохиогч: Орхон прожект ХХК



Гүйцэтгэгч: Шинэ Зууны Эрдэнэт ХХК

Улаантолгой баг

Төсөвт өртөг: 189,188,753 төгрөг


Гэрээний хугацаа: 2025.06.02 - 2025.07.01



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ байгуулагдаж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

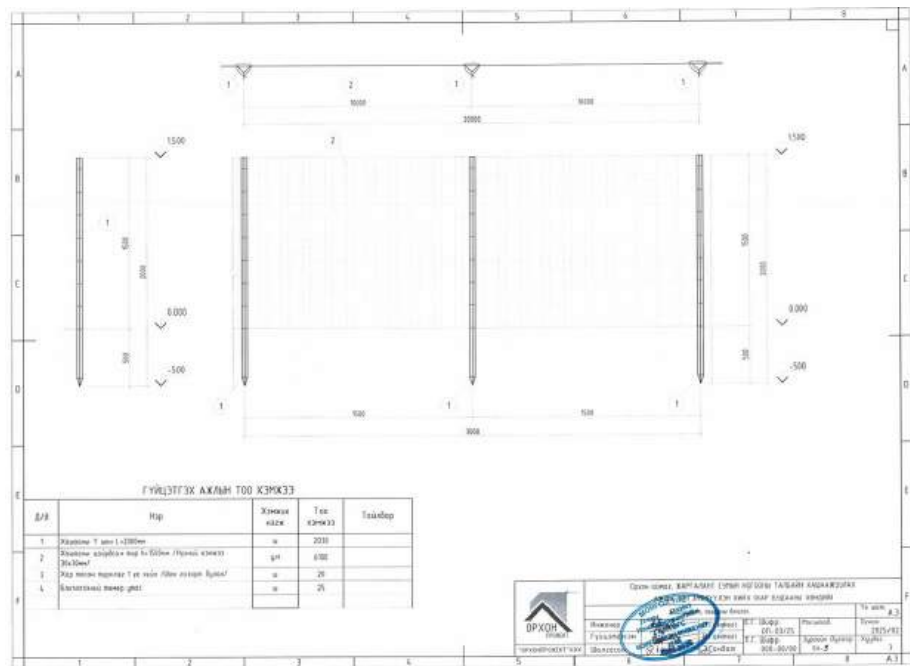

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025" ТАНИЛЦУУЛГА

17



Ажлын нэр: Боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд:
Дотуур байрнаас ЕБС-ийн үүд хүртэл явган зам
хийх /хөтөлбөрийн хүрээнд/

Ажлын тоо хэмжээ: Явган хүний замын хашлага
163м явган хүний замын хавтан 122м² шонтой лед
гэрэл 6ш сандал 2ш бетон цутгах 32.6м³

Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ
Гүйцэтгэгч: Эрхэт бүтээл констракшн ХХК



Жаргалант баг


Төсөвт өртөг:
Гэрээний хугацаа: 2025.06.10 - 2025.07.09



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ байгуулагдсан.
Бэлтгэл ажил хангаж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

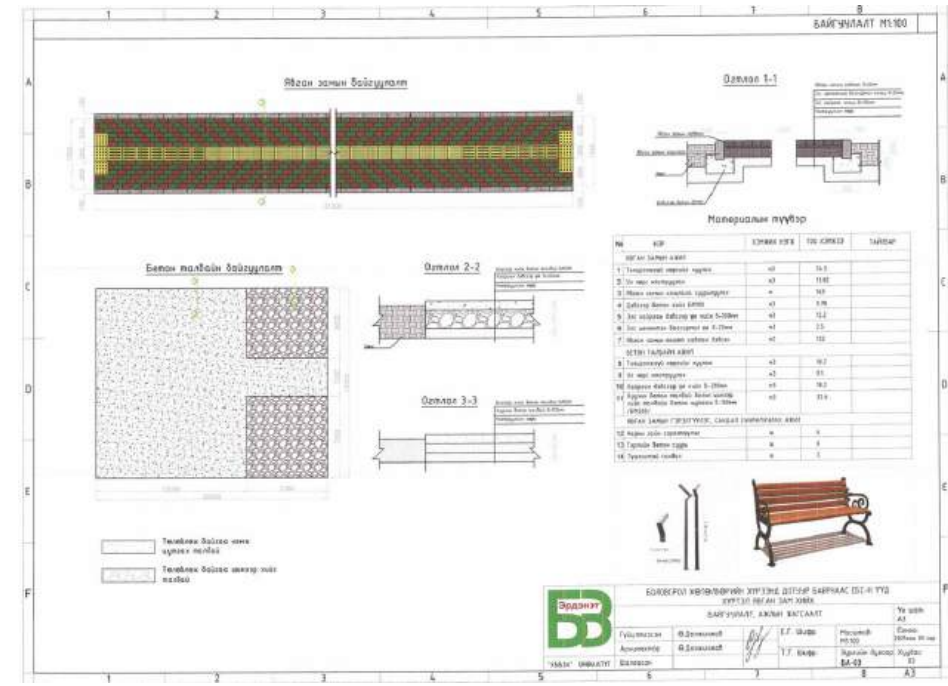

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠢᠯᠠᠭᠣᠣᠯᠤᠰᠤ ᠤᠨ ᠤᠨᠢᠯᠠᠭᠣᠣᠯᠤᠰᠤ ᠤᠨ ᠤᠨᠢᠯᠠᠭᠣᠣᠯᠤᠰᠤ

18



Ажлын нэр: Ахмадын хөгжил хөтөлбөрийн хүрээнд:
Ахмад, залуучуудын ордны гаднах цэцэрлэгт
хүрээлэнг тохижуулах
Ажлын тоо хэмжээ: Саравч-2ш засварлах,
гэрэлтүүлэг-4ш, сандал-2ш, 57м² явган зам хийх



Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ
Гүйцэтгэгч: ТИ БИ СИ КАПИТАЛ ХХК

Жаргалант баг



Төсөвт өртөг: 19,700,000 төгрөг
Гэрээний хугацаа: 2025.06.02-2025.07.01



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ байгуулагдаж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

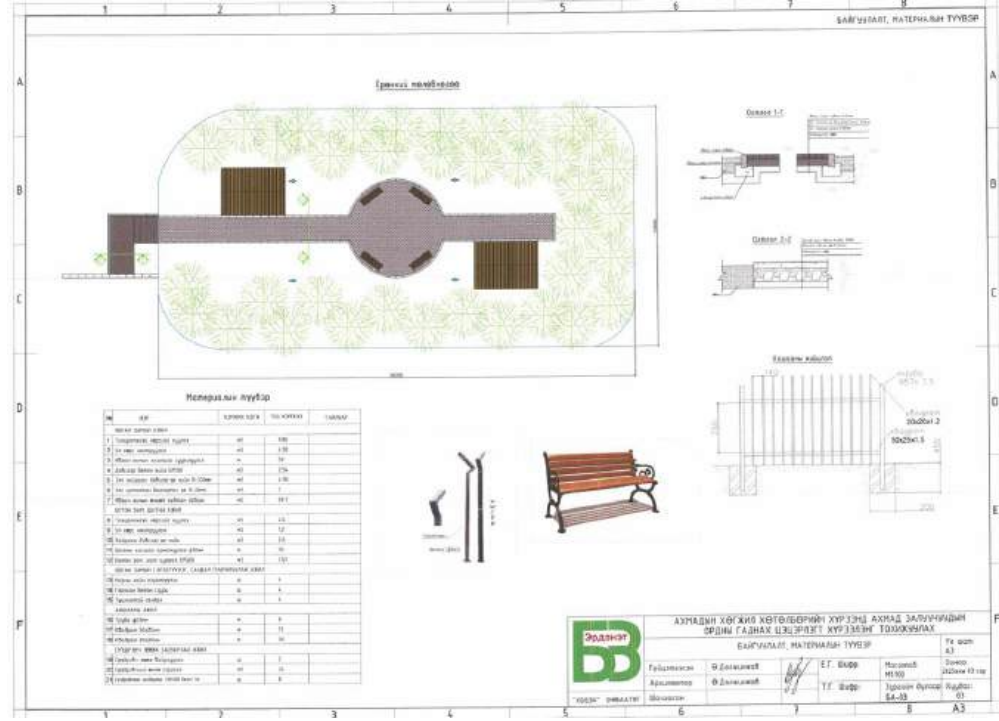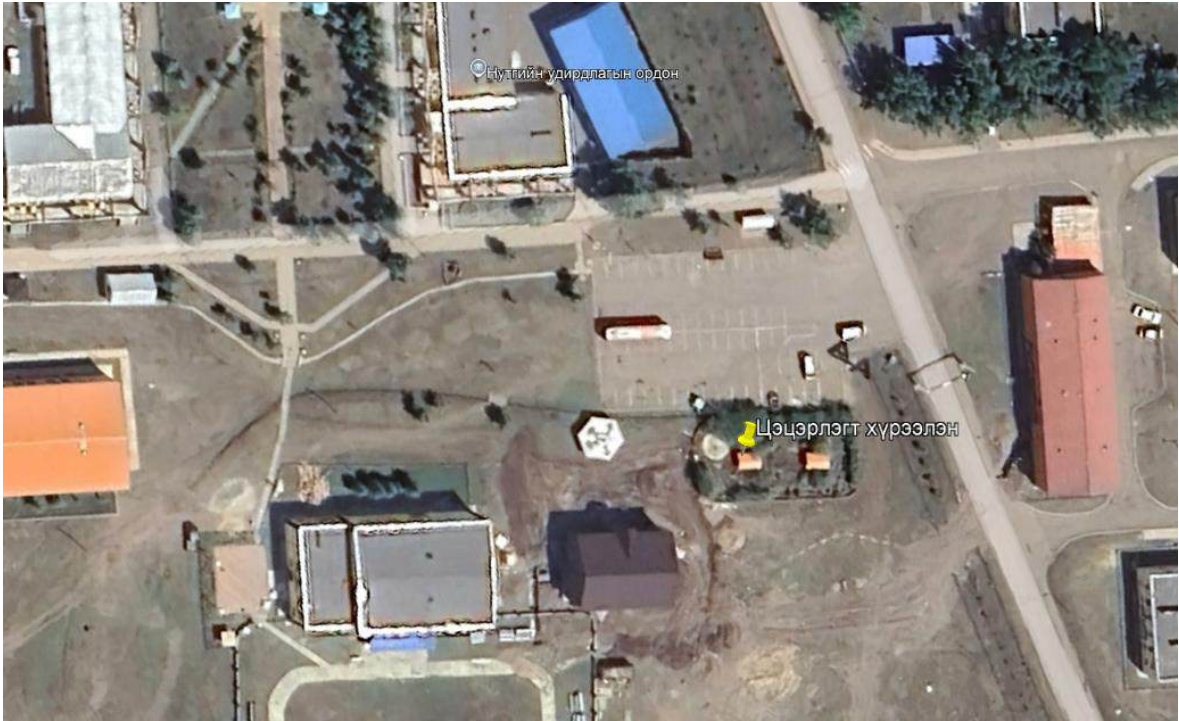

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжхээр батлагдсан



1



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Зэст баг Оюу цэцэрлэгийн гадна тохижилт

Ажлын тоо хэмжээ: Гадна тохижилт

Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ



Гүйцэтгэгч: Уудам булаг ХХК

Зэст баг

Төсөвт өртөг: 111,000,000сая.төг



Гэрээний хугацаа: 2025.06.02 - 2025.08.07



Ажлын явц, тайлбар:Бэлтгэл ажил хангаж байна
үе шатны хувиарын дагуу ажил эхэлнэ.



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

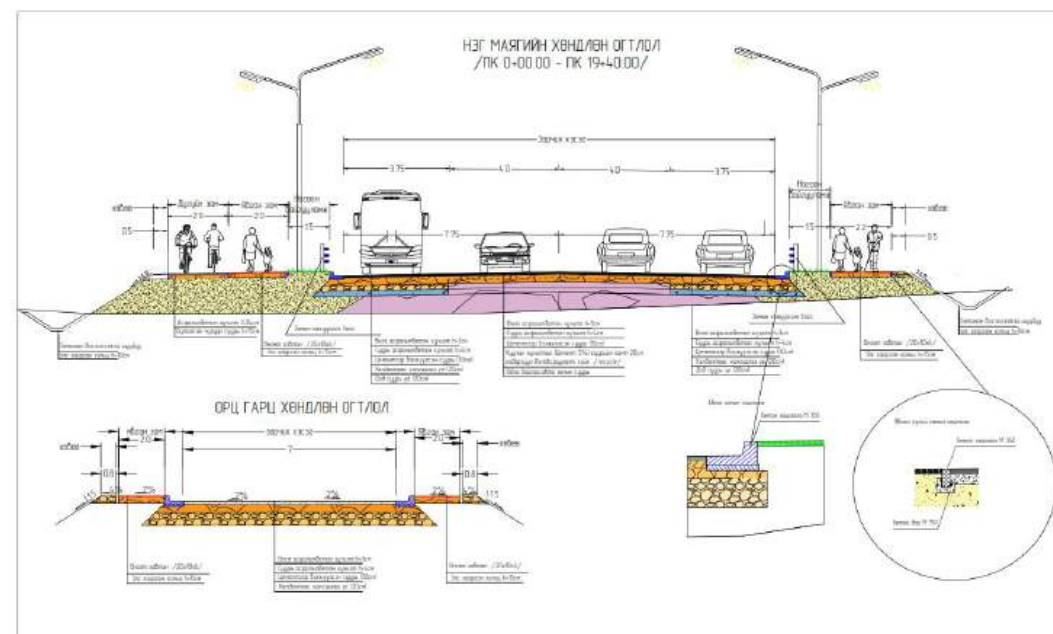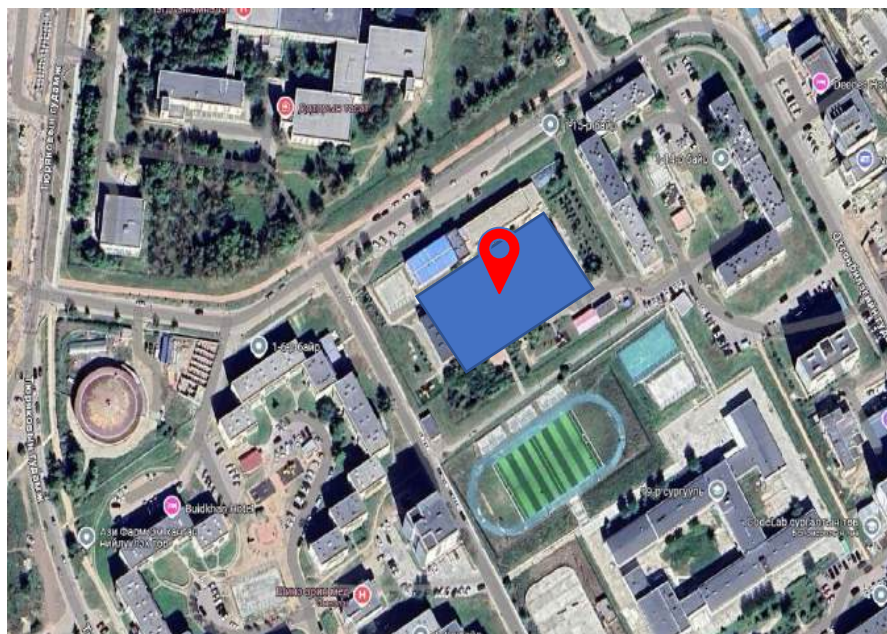



2



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Рашаант баг 31-р гудамж орчим хөлбөмбөгийн талбай байгуулах

Ажлын тоо хэмжээ: Хөлбөмбөгийн талбай байгуулах

Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ



Гүйцэтгэгч: ЖЗЦУГ ХХК

Рашаант баг

Төсөвт өртөг: 79,548,912 сая.төг

Гэрээний хугацаа : 2025.05-28 2025.06.27



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ хийх үе шатандаа явж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%





ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025” ТАНИЛЦУУЛГА



3



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Зэст баг Оюу цэцэрлэгийн гадна тохижилт

Ажлын тоо хэмжээ: Гадна тохижилт

Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ



Гүйцэтгэгч: Уудам булаг ХХК

Зэст баг

Төсөвт өртөг: 111,000,000сая.төг


Гэрээний хугацаа: 2025.06.02 - 2025.08.07



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ хийх үе шатандаа явж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

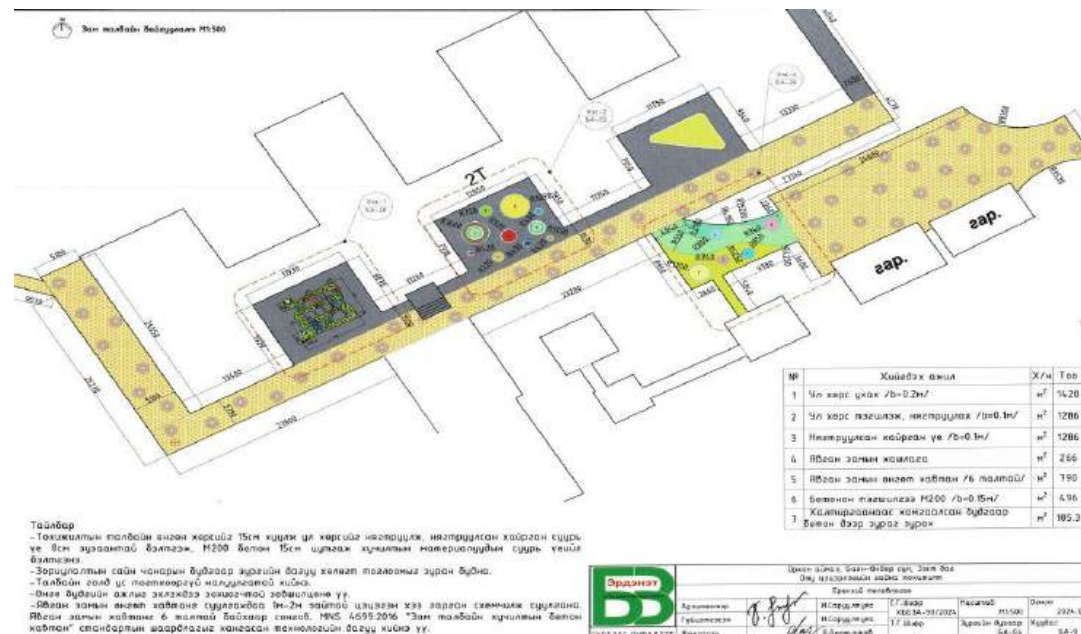

4



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Зэст 1-19 дүгээр байрны өмнө талд 3*3 сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах

Ажлын тоо хэмжээ: АЧЦБ
Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ



Гүйцэтгэгч: Уудам булаг ХХК



Зэст баг
Төсөвт өртөг: 120,006,703сая.төг
Гэрээний хугацаа: 2025.06.02 - 2025.08.07



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ хийх үе шатандаа явж байна.
Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

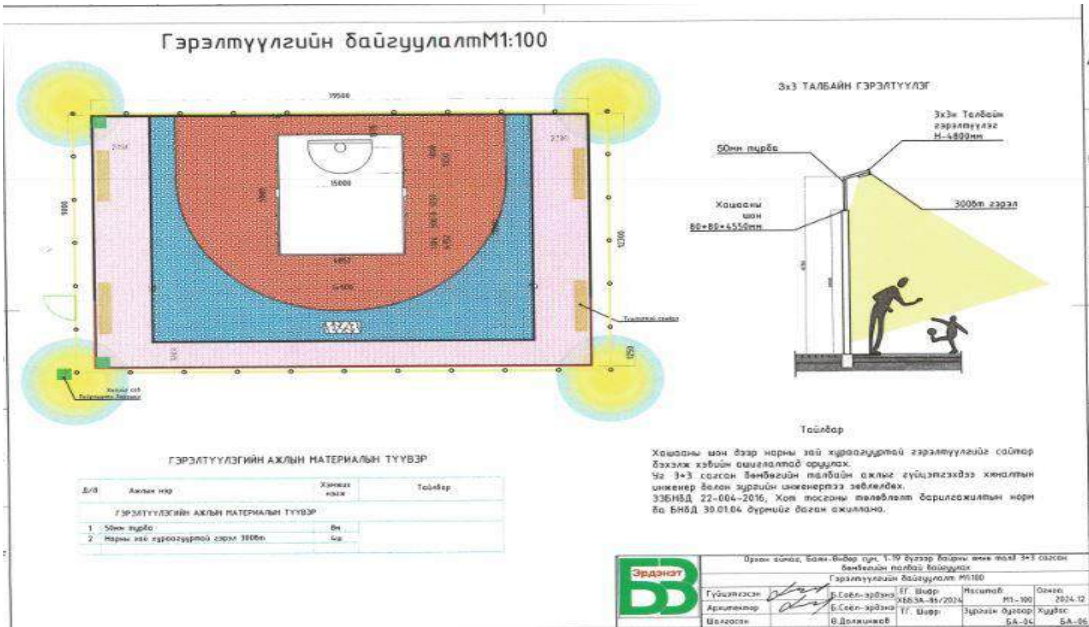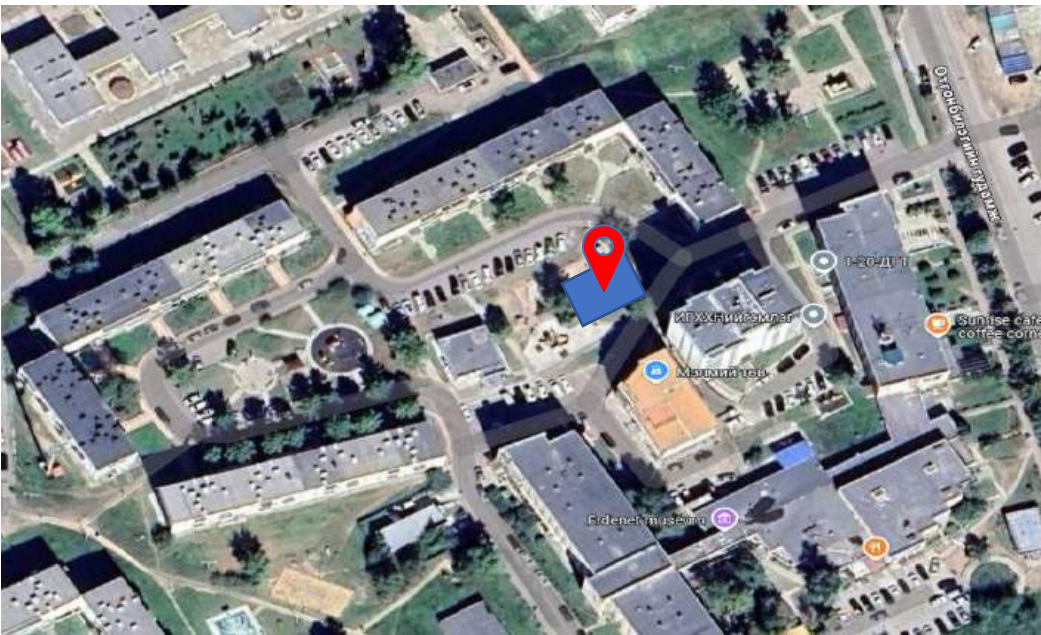



5



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Их залуу баг
Оюу цэцэрлэгийн гадна тохижилт
Ажлын тоо хэмжээ: Гадна тохижилт





Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ
Гүйцэтгэгч: Шанхат хүрэн ХХК



Их залуу баг
Төсөвт өртөг: 114,500,000сая.төг
Гэрээний хугацаа: 2025.06.02 - 2025.07.02

Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ хийх үе шатандаа
явж байна.
Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

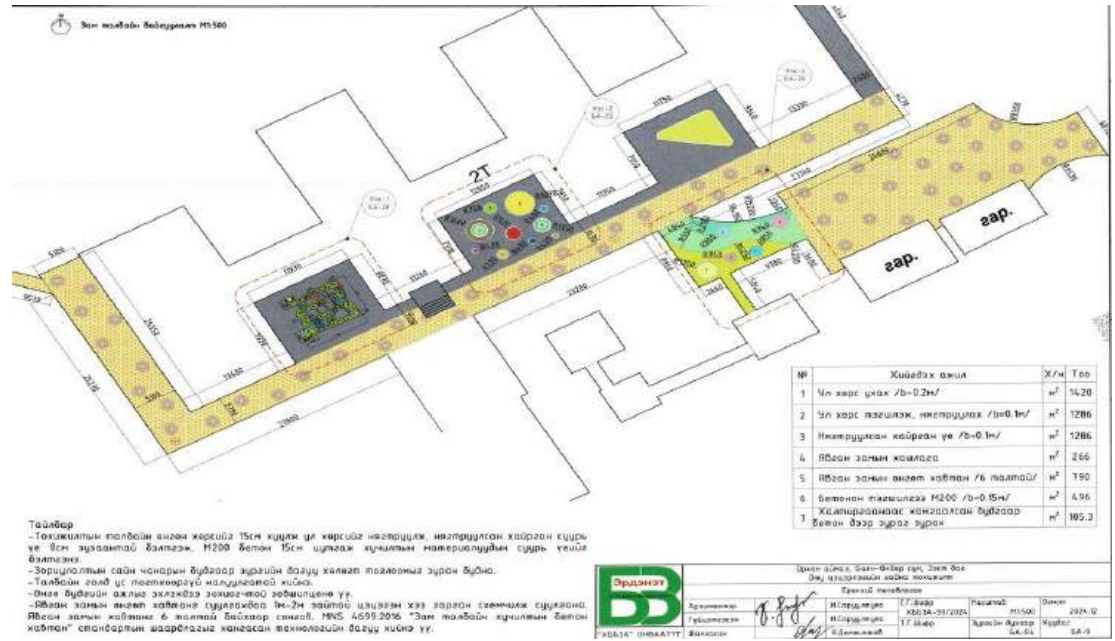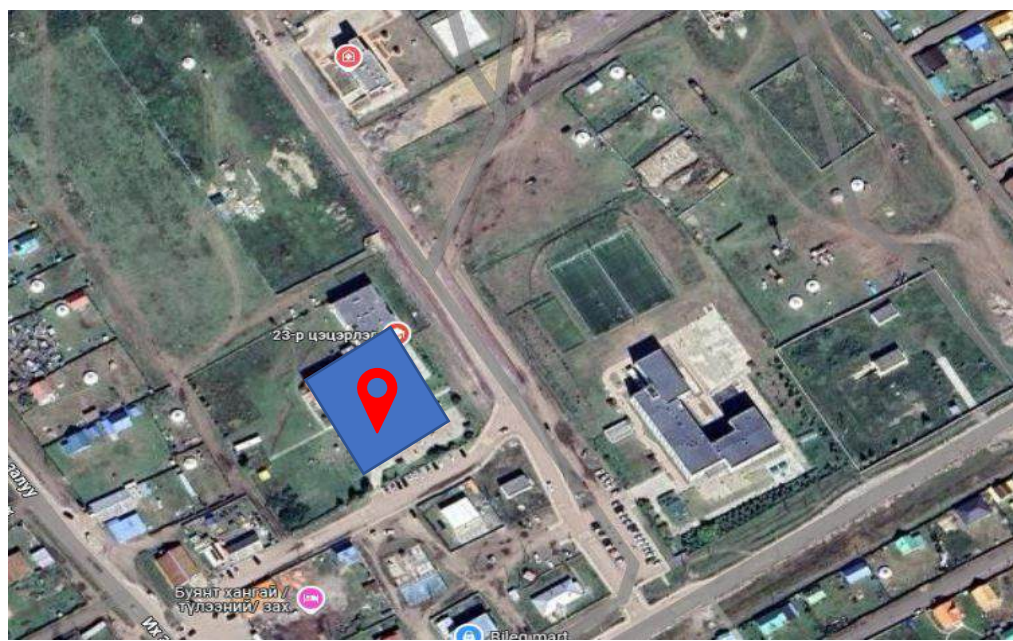



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025” ТАНИЛЦУУЛГА



6




Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Зэвсэгт хүчний 186-р ангид буудлагын талбай байгуулах

Ажлын тоо хэмжээ: Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах



Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ

Гүйцэтгэгч: Орчлон тулга ХХК

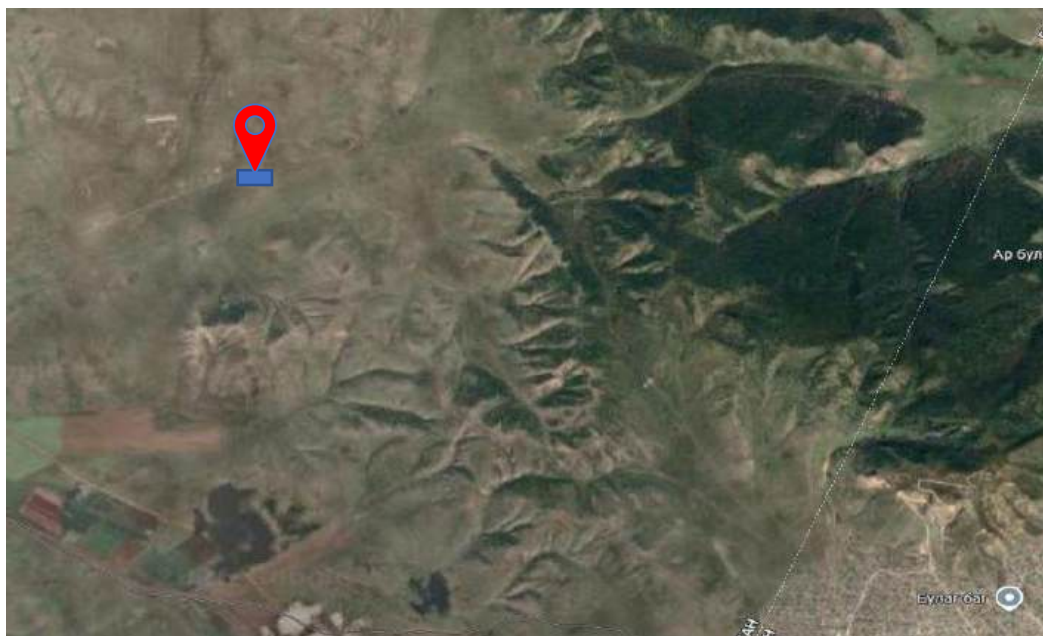


баг

Төсөвт өртөг: 56,286,365сая.төг

Гэрээний хугацаа: 2025.06.02 - 2025.07.02

Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ хийх үе шатандаа явж байна.

Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

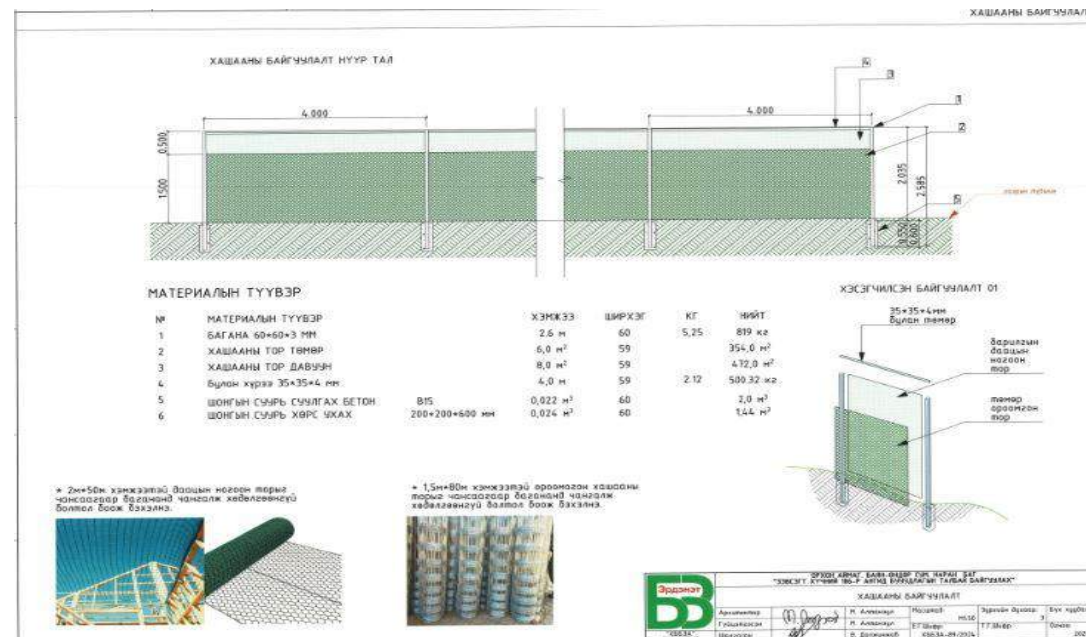



7



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Чингэл багийн 48-р гудамж орчимд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах

Ажлын тоо хэмжээ: Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах

Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ



Гүйцэтгэгч: Эрхэт бүтээл констракшн ХХК

Чингэл баг


Төсөвт өртөг: 134,506,120сая.төг
Гэрээний хугацаа: 2025.05.23 - 2025.06.23



Ажлын явц, тайлбар:Бэлтгэл ажил хангаж байна үе шатны хувиарын дагуу ажил эхэлнэ.



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

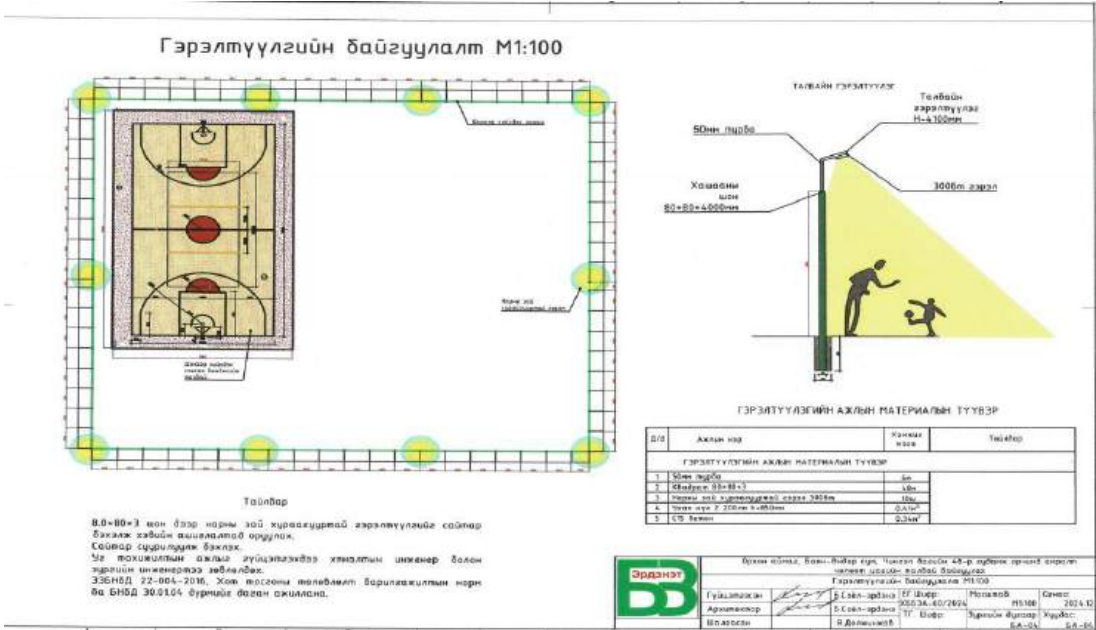



8




Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Найрамдал багт амралт чөлөөт цагийн талбай засварлах, тохижуулах

Ажлын тоо хэмжээ: Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах

Зохиогч: ХББЗА ОНӨААТҮГ

Гүйцэтгэгч: Сонгино тамир ХХК

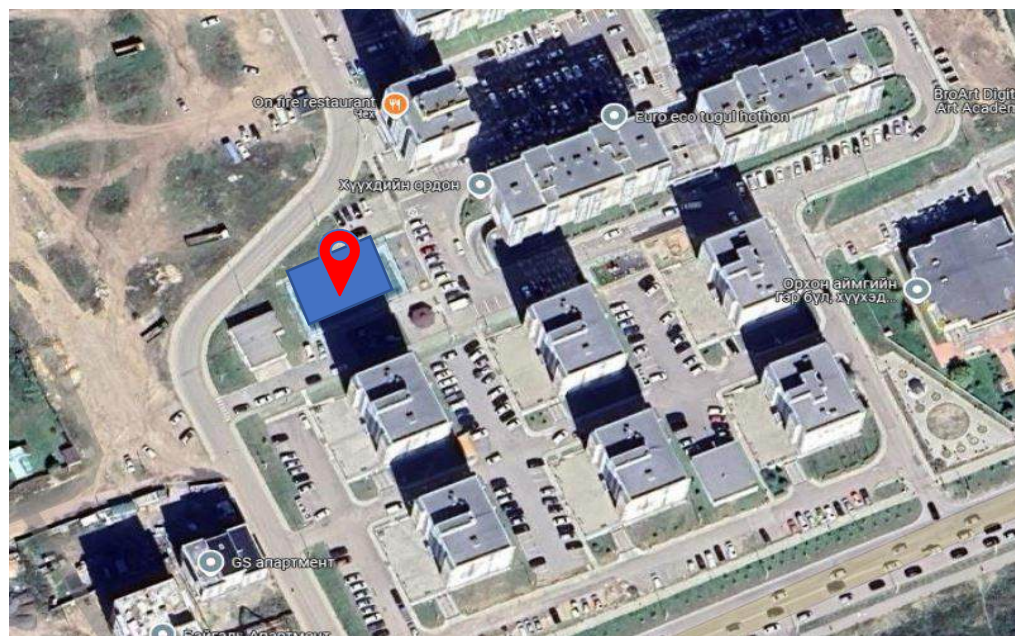

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025” ТАНИЛЦУУЛГА



Найрамдал баг

Төсөвт өртөг: 70,479,989сая.төг


Гэрээний хугацаа: 2025.05.23 - 2025.06.23



Ажлын явц, тайлбар:Бэлтгэл ажил хангаж байна
үе шатны хувиарын дагуу ажил эхэлнэ.



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

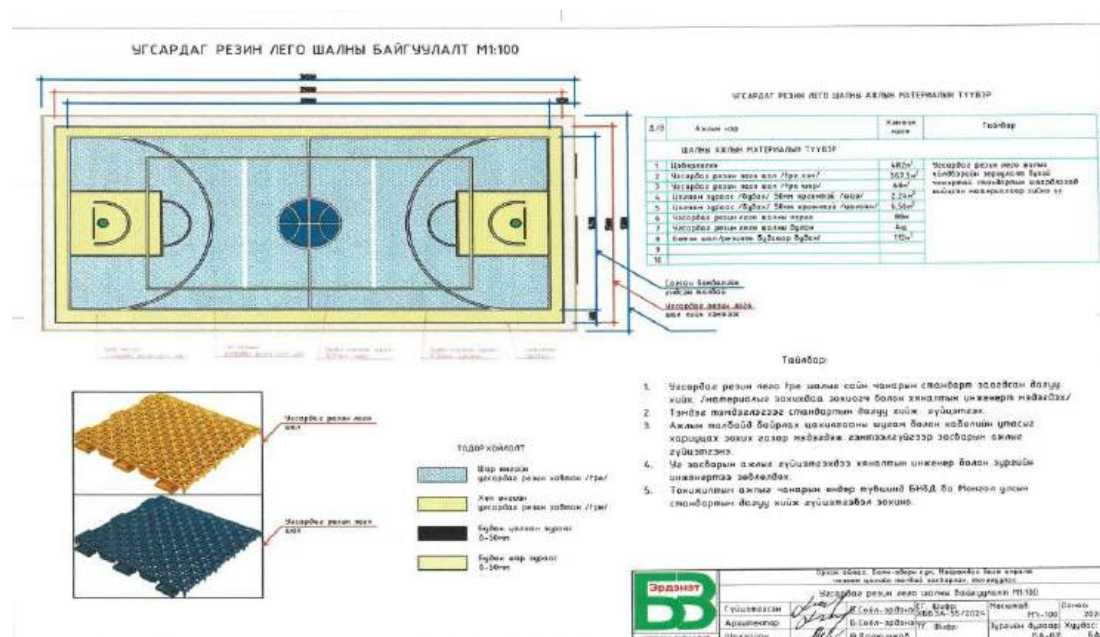



1



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум.
Хүүхдийн хөгжил хамгааллын төвийн барилга,
/Баянцагаан баг/

Ажлын тоо хэмжээ: Шинэ барилга байгууламж
18мх 15м зоорьтой 3 давхар

Зохиогч: “Очиртааб” ХХК

Гүйцэтгэгч: “Ээл Өлгий” ХХК



Баянцагаан баг

Төсөвт өртөг: 1 261 592 003 тэрбум.төг


Гэрээний хугацаа: 2020.05.28 - 2021.11.23

2024.08.26-2025.09.01

Ажлын явц, тайлбар: Өнөөдрийн байдлаар ажлын явц 85%-ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 85%

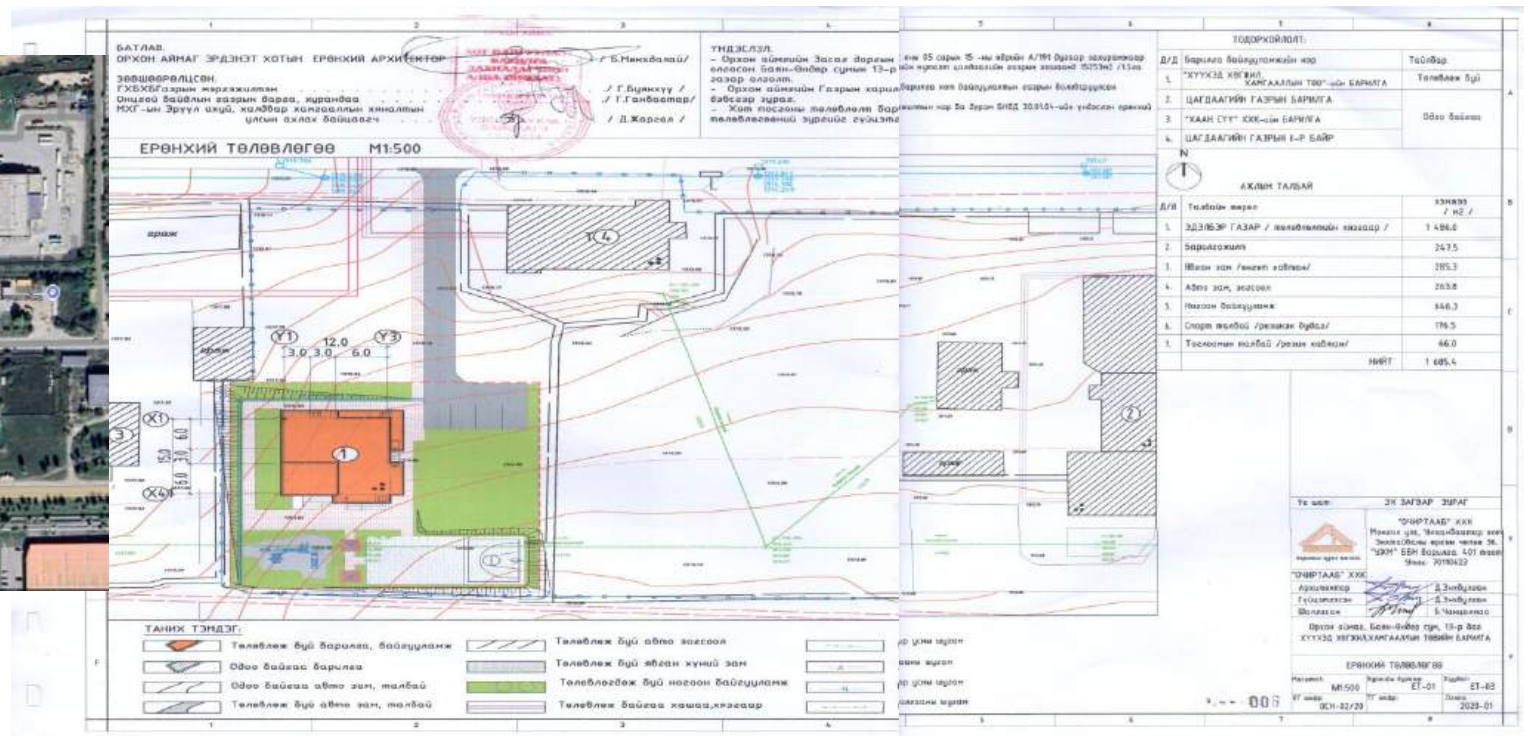

○ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥



ХҮҮНДЭЙН СҮҮРИЙН АЖИЛ ДУУССАН

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025" ТАНИЛЦУУЛГА



Ажлын нэр: Сургуулийн барилга, 960 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, 7 дугаар хороолол/
Ажлын тоо хэмжээ: 3 давхар 960 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга

Зохиогч: “Зэд Прожект” ХХК

Гүйцэтгэгч: “Орчлон тулга” ХХК





Чандмань баг
Төсөвт өртөг: 14.920 тэрбум.төг
Гэрээний хугацаа: 2024.10.08 - 2025.08.24

Ажлын явц, тайлбар: А,В,С,Д блокын Суурийн ажил дууссан. Гадна ИШС Хийгдэж дууссан



Гүйцэтгэлийн хувь: 19%

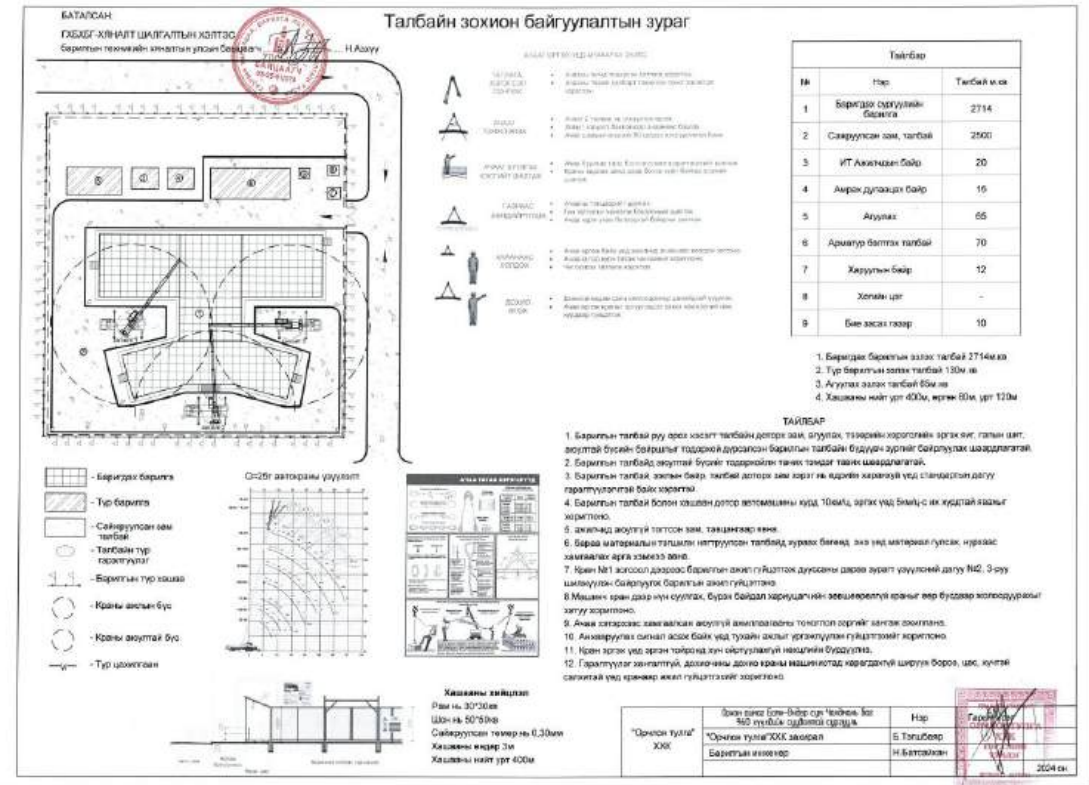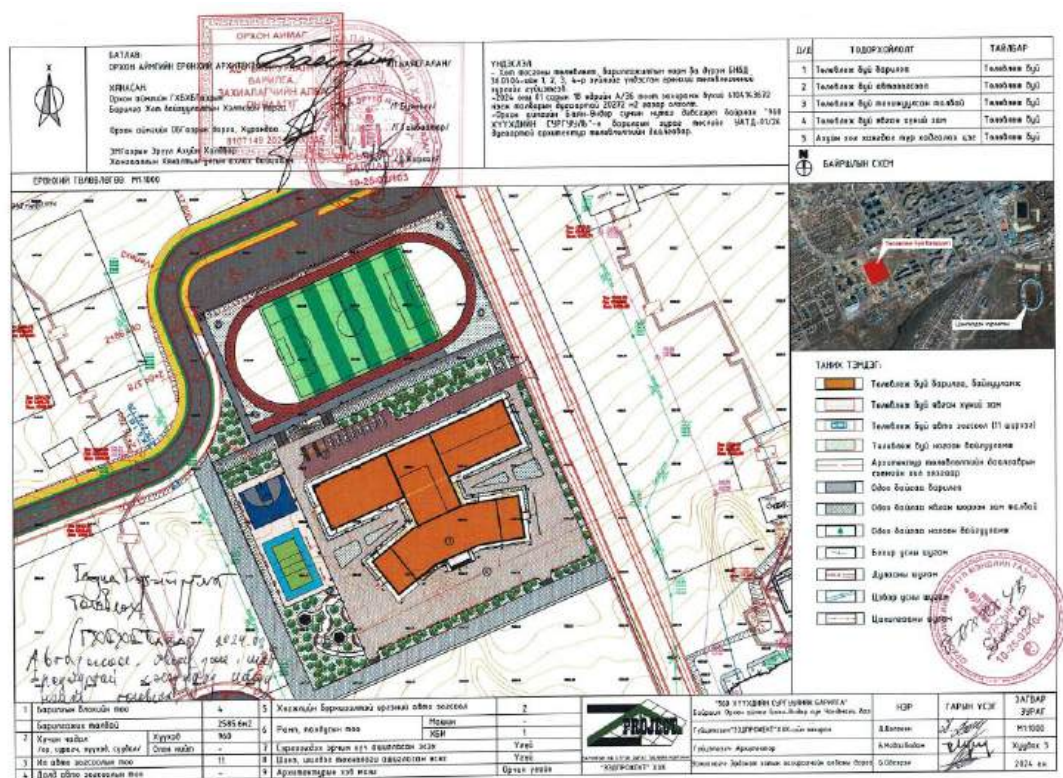



1



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум Их залуу баг 23
Цэцэрлэгийн гадна хашаа засварлах ажил

Ажлын тоо хэмжээ: 40см өндөртэй бетон суурь бүхий өндөр 1.20м өндөр 315м урт нийт 504м² төмөр хашаа

Зохиогч: Билиг Хайрхан ХХК

Гүйцэтгэгч: Азийн Баялаг ХХК



Их залуу баг


Төсөвт өртөг: 59,781,171 төгрөг

Гэрээний хугацаа: 2025.05.01 - 2025.06.01



Ажлын явц, тайлбар: Ажлын гүйцэтгэл 60%

Гүйцэтгэлийн хувь: 60%

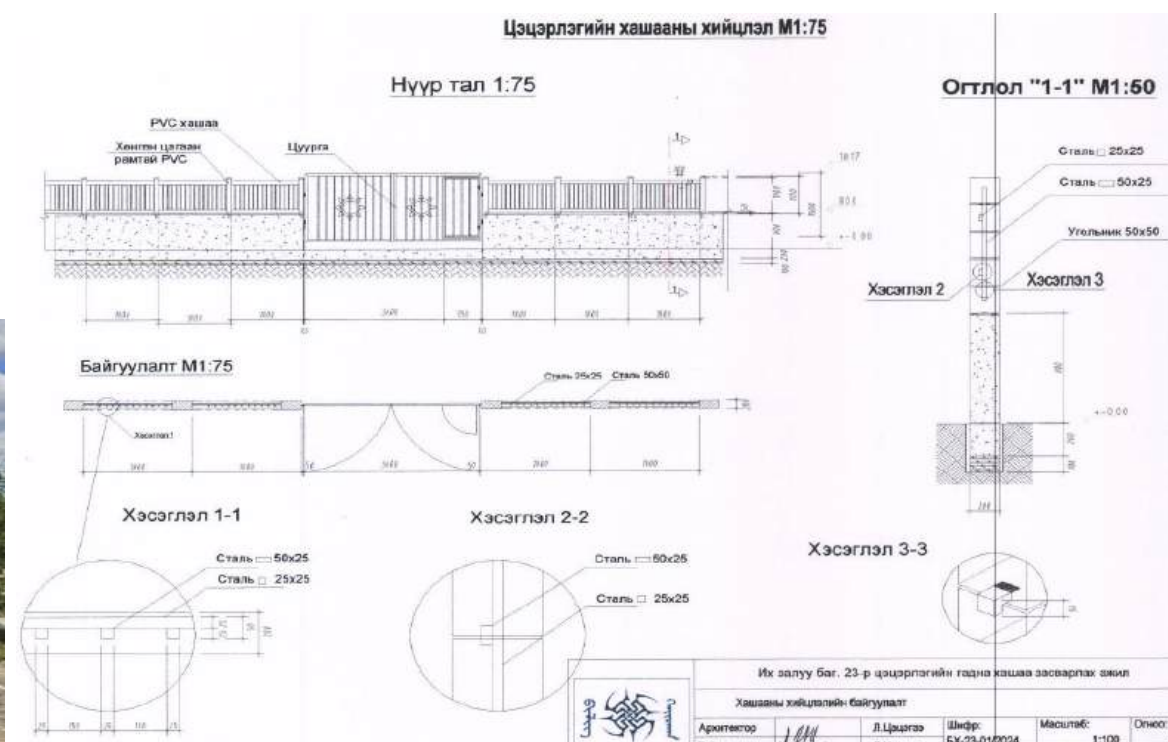



1



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын Оюут багийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв барих ажил

Ажлын тоо хэмжээ: Уг барилга нь 13,60х30,00м-ын хэмжээтэй, хагас цоколийн 1 давхар, дээшээ 2 давхар барилга болно. Үндсэн 1 орц, туслах 4 орц гарцтай төмөр бетон арагт бүтээцтэй, хөнгөн блок дүүргэгчтэй, чулуун хөвөн дулаалгатай металл фасадтай, салхижуулалтгүй хавтгай дээвэртэй барилга

Зохиогч: "Гранд Тек" ХХК

Гүйцэтгэгч: "Баганадант" ХХК



Оюут баг

Төсөвт өртөг: 2.9 тэрбум.төг

Гэрээний хугацаа: 2024.10.22 - 2024.11.15
2025.05.15-2025.08.18



Ажлын явц, тайлбар: Карказ угсралт дууссан.
Өрлөгийн ажил хийгдэж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 69%





1



Ажлын нэр: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум Ирээдүй Одод сургуулийн 100 хүүхдийн дотуур байр/Цагаанчулуут баг/

Ажлын тоо хэмжээ: Шинэ барилга байгууламж 42*15м хэмжээтэй зооргүй 2 давхар

Зохиогч: “Зэдпоржект” ХХК

Гүйцэтгэгч: “Олзмандал” ХХК



Цагаанчулуут баг


Төсөвт өртөг: 2 872 553 780 төгрөг

Гэрээний хугацаа: 2025.04.10

2025.09.13

Ажлын явц, тайлбар: Аяган суурын ажил дуусаж угсралтын ажил үргэжлэж байна.

Гүйцэтгэлийн хувь: 30%

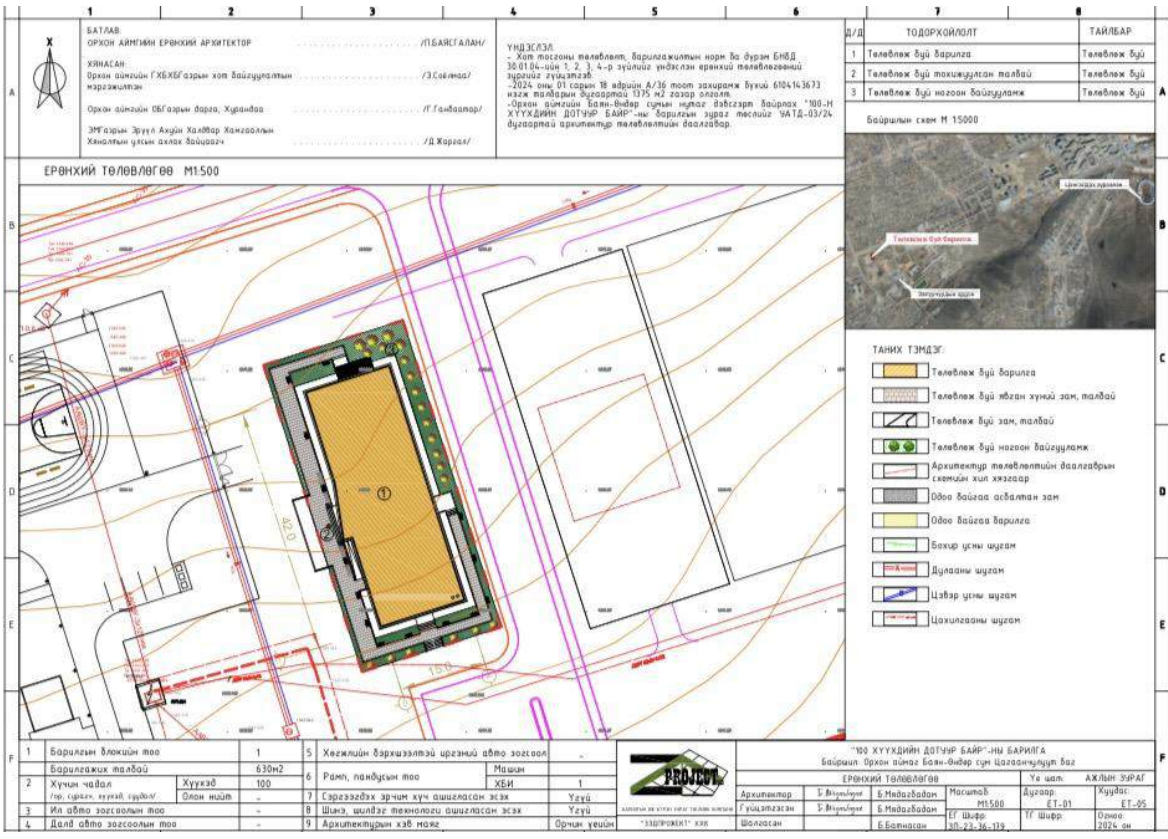



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Хүүхдийн янзага зусланд их засвар хийх


Ажлын тоо хэмжээ: Хүүхдийн янзага зусланд 8 болон 20 хүүхдийн байр, гал тогоо, амралтын байр, урлаг заал, гүний худаг, гадна тохижилт, усны нөөцийн савны байр зэрэг ажилууд хийгднэ.

Зохиогч: Очиртон ХХК


Гүйцэтгэгч: Мээжийн Хишиг ХХК



НҮҮРЭН ТАЛЫН БАЙГУУЛАЛТ / 1-6 ТЭНХЛЭГ / М1:100

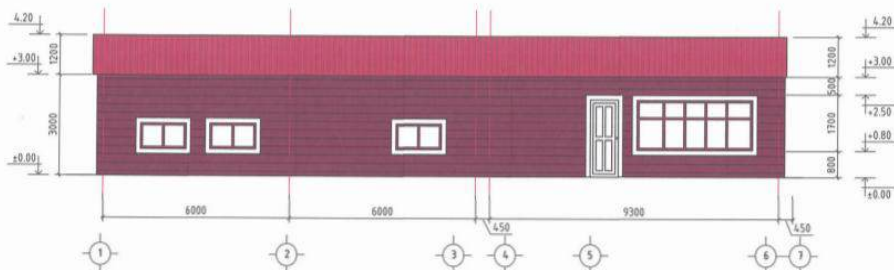

НҮҮРЭН ТАЛЫН БАЙГУУЛАЛТ / 6-11 ТЭНХЛЭГ / М1:100

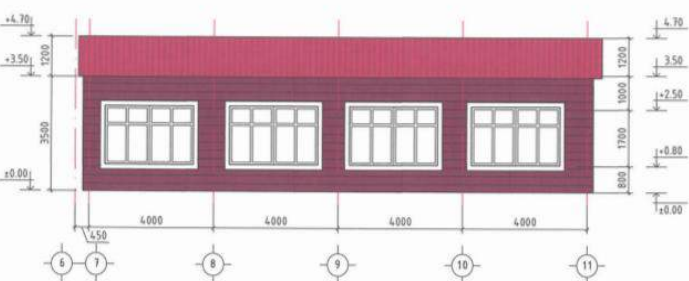

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖЛЫН ТОО ХЭНХЭЭ

Д/Д	Нэр	Хэнхжих нэгж	Тоо хэнхжээ
1	Банзан карниз тосон дугаар будах	м2	54.0
2	Хана өвчлөөр даавхарлаж будах	м2	385.4
3	Хаалганы аналгаа будах	м2	3.0

Хялгант сум

Төсөвт өртөг: 901.4 сая.төг

Гэрээний хугацаа: 2024.09.20 - 2024.12.19
2025. 05-15 – 2025.07.20

Ажлын явц, тайлбар: Гал тогоо, 20 хүүхдийн байр, урлаг заалны ажил дууссан. Зөөвийн орон сууц 4 ширхэг хийгдэж байна.

Гүйцэтгэлийн хувь: 80%



НҮҮРЭН ТАЛЫН БАЙГУУЛАЛТ / Е-А ТЭНХЛЭГ / М1:100



НҮҮРЭН ТАЛЫН БАЙГУУЛАЛТ / А-Е ТЭНХЛЭГ / М1:100





Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын 6 дугаар бичил хорооллын уулзвараас Их залуу багийн уулзвар хүртэлх А1002 дугаартай улсын чанартай авто замыг 4 эгнээ болгож өргөтгөн шинэчлэх ажил

Ажлын тоо хэмжээ: Зорчих хэсгийн өргөн 15.5м, явган хүний зам 2-2.2м, 2 байршилд нүхэн гарцтай, 11 байршилд Ф1000-Ф1500хоолой

Зохиогч: Ихэр Мөнх ХХК

Гүйцэтгэгч: Шилдэг зам ХХК



Цагаанчулуут баг


Төсөвт өртөг: 14.489 тэрбум.төг

Гэрээний хугацаа: 2024.05.10 - 2024.10.06

2024.10.06-2025.07.01

Ажлын явц, тайлбар: 2024онд авто замын далан, 11 байршилд ус зайлуулах хоолой, 2 байршилд нүхэн гарцны суурь, их биений бетон цутгалт, ЦДАШ, ЦДКШ цахилгаан дамжуулах шугам зөөж шилжүүлэх ажлууд тус тус хийгдсэн. Одоогийн байдлаар нүхэн гарцын буцаан дүүргэлтийн ажил хийгдэж байна.

Гүйцэтгэлийн хувь: 38%

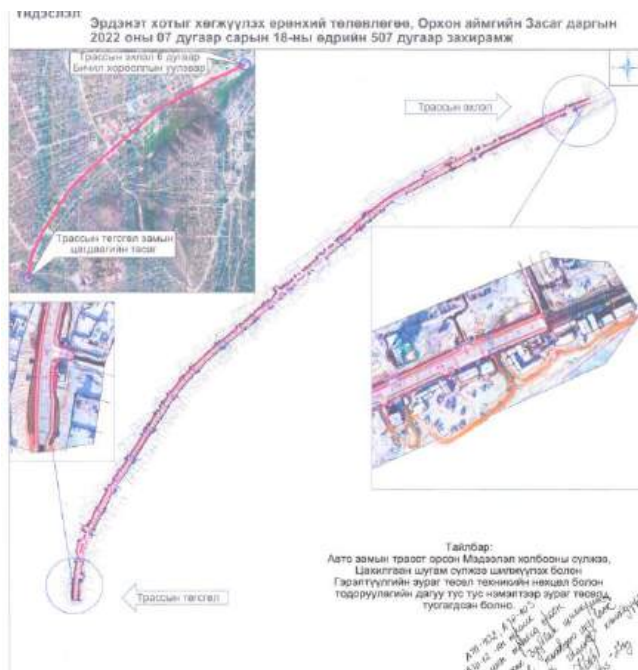

БАТЛАВ:

ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР  Ц.БАЯРЖАРГАЛ

ЗӨВШӨЛЦӨН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВӨЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ХЭТГЭЙН ДАРГА  С.ДАВААДОРЖ

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВӨЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ХЭТГЭЭН ДАМ ТЭЗЭЭСЭР ХАРИУДАА ХӨЛӨӨД ЗЭРЧИН ХҮЧНИЙ
АСУУДАЛ ХАРИУЦААН НОСЧ ДЭМЖЛЭГЭН

 Т.АРИУНБОЛД

ОРХОН АИМГИЙН ГХБХББ-ийн Ерөнхий
ДАРГА  Г.БУЯНХҮҮ

ОРХОН АИМГИЙН "ОРХОН БАНДИЙН ГАЗАР" -ын ДАРГА
ХУРАНДАА  Г.ГАНБААТАР

ОРХОН АИМГИЙН "ОРХОН АЗАР" ТӨХХ-ийн
ЗАХИРАЛ  Ш.БАТЗОРИГ

ОРХОН АИМГИЙН "ЭРЭМЖТҮС ДТС" ОНХХ-ийн
ЕРӨНХИЙ ИЛКНӨР  Д.ОДНОНЖАМЦ


"МЭДЭЭЛЭЛТ ХӨЛӨӨНИЙ СУЛД" ТӨХХ-ийн
ОРХОН АИМГИЙН ГАЗРЫН ОРХОН ДТС-ийн ИЛКНӨР

 Ц.ЗОРИГ

ОРХОН АИМГИЙН "ТАСТО ТЭЗЭЭРИЙН ТӨВ" -ийн ДАРГА
 С.ГАРЫЛДҮРЭВ

"ТӨХЗР МӨНХ" ХХК-ийн ЗАХИРАЛ  Н.МҮНХБАТ

"ТӨХЗР МӨНХ" ХХК-ийн ИЛКНӨР  Т.БАТСТҮР

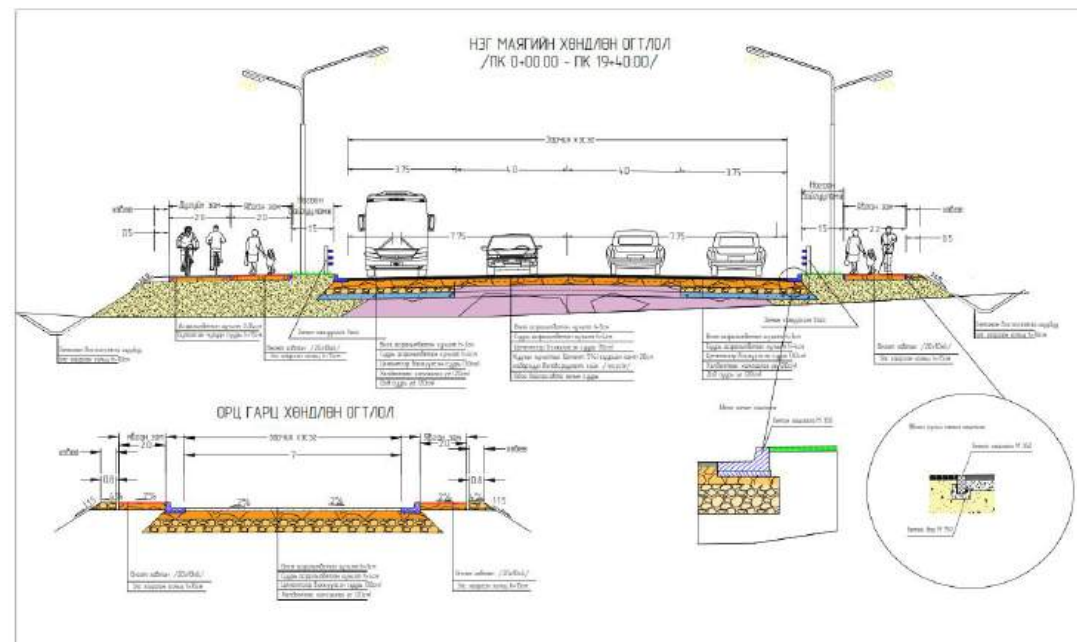

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



33



Рашаант баг



Нийт урт: Явган хүний зам 551м, дугуйн зам 714м



2025 онд төлөвлөсөн төсөв: 507 сая.төг

Зураг төсвөөр: 1,296.2 сая.төг

Гэрээний хугацаа:



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Рашаант баг. 26-р цэцэрлэгийн баруун талын уулзвараас Халуун усны уулзвар хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх



Байгуулалт: Явган хүний зам 716.68м², хуучин хавтан дахин ашиглах 390м², хурд сааруулагч 1 байршилд, дугуйн зам 714м




Зохиогч: Кеаро ХХК

Гүйцэтгэгч:

Гэрээний дүн:

Зөвлөх үйлчилгээ:

Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ

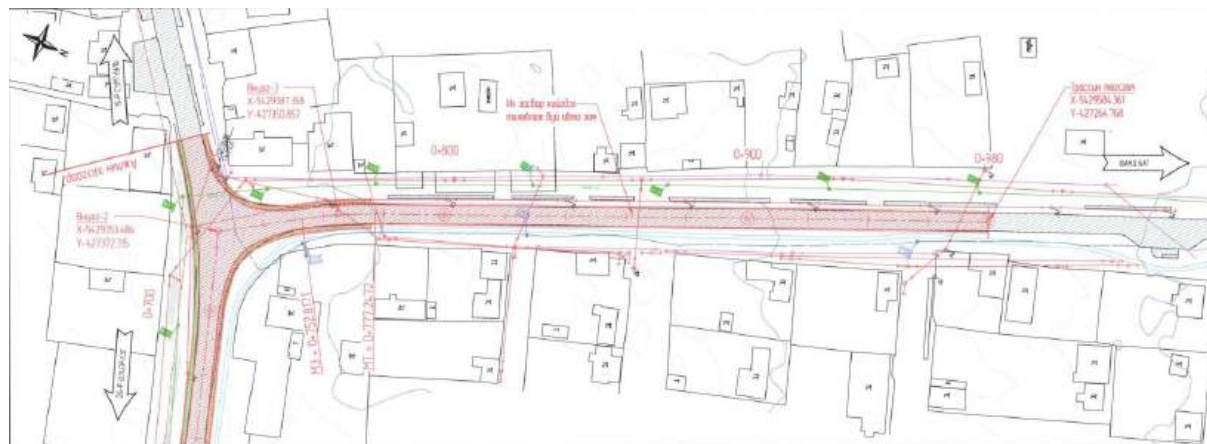



Орхон аймагт 2025 онд хийгдэх авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

34



Их залуу баг



Нийт урт: Явган хүний зам 587м, дугуй зам 665м



2025 онд төлөвлөсөн төсөв: 357 сая.төг

Зураг төсвөөр: 1,178.6 сая.төг

Гэрээний хугацаа:



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Их залуу баг. 15-р сургуулийн баруун талын уулзвараас халуун усны уулзварын авто замд их засварын ажил хийх



Байгуулалт: Явган хүний зам 287.55м², хуучин хавтан дахин ашиглах 590м², хурд сааруулагч 1 байршилд, дугуйн зам 665м



Зохиогч: Кеаро ХХК

Гүйцэтгэгч:

Гэрээний дүн:

Зөвлөх үйлчилгээ:

Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



35



Яргуйт баг



Нийт урт: Явган хүний зам шинээр 135м, 287.55м2, хуучин хавтан дахин ашиглах 1300м2



2024 онд төлөвлөсөн төсөв: 546.5 сая.төг
Зураг төсвөөр: 1,421.2 сая.төг
Гэрээний хугацаа:



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Яргуйт баг. А1002 замын уулзвараас 15-р сургуулийн баруун талын уулзвар хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх



Байгуулалт: Явган хүний зам шинээр 135м, 287.55м2, хуучин хавтан дахин ашиглах 1300м2, хурд сааруулагч 1 байршилд, дугуйн зам 990м



Зохиогч: Кеаро ХХК
Гүйцэтгэгч: Тодроогүй
Гэрээний дүн:
Зөвлөх үйлчилгээ:
Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.




Орхон аймагт 2025 онд хийгдэх авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

36



Баянбулаг баг
Нийт урт: Автозам 0.271км
2024 онд төлөвлөсөн төсөв: 397.4 сая.төг
Зураг төсвөөр: 398.49 сая.төг
Гэрээний хугацаа: 2024.10.18-2025.08.05

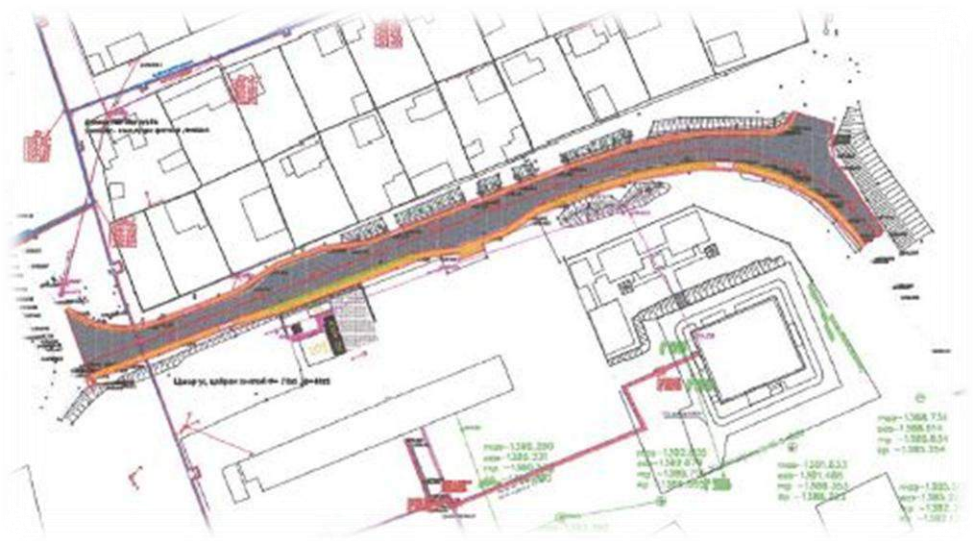

Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Баянбулаг баг. 27-р цэцэрлэгийн тойргоос 16-р сургуулийн уулзвар хүртэлх авто замын их засварын ажил

Байгуулалт: Автозам-0.271 км (L болон чулуун хашлага, тэгшилгээний үе 3-5см, өнгө хучилт 5см)
Зохиогч: Гео урбан консалтинг ХХК
Гүйцэтгэгч: Энх-Алтаргана ХХК
Гэрээний дүн: 398.49 сая.төг
Зөвлөх үйлчилгээ:
Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ

Төлөвлөж буй авто замын байршил



Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг багийн нутаг дэвсгэрт байна

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.




Орхон аймагт 2025 онд хийгдэх авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

36



Баянбулаг баг
Нийт урт: Автозам 0.271км
2024 онд төлөвлөсөн төсөв: 397.4 сая.төг
Зураг төсвөөр: 398.49 сая.төг
Гэрээний хугацаа: 2024.10.18-2025.08.05

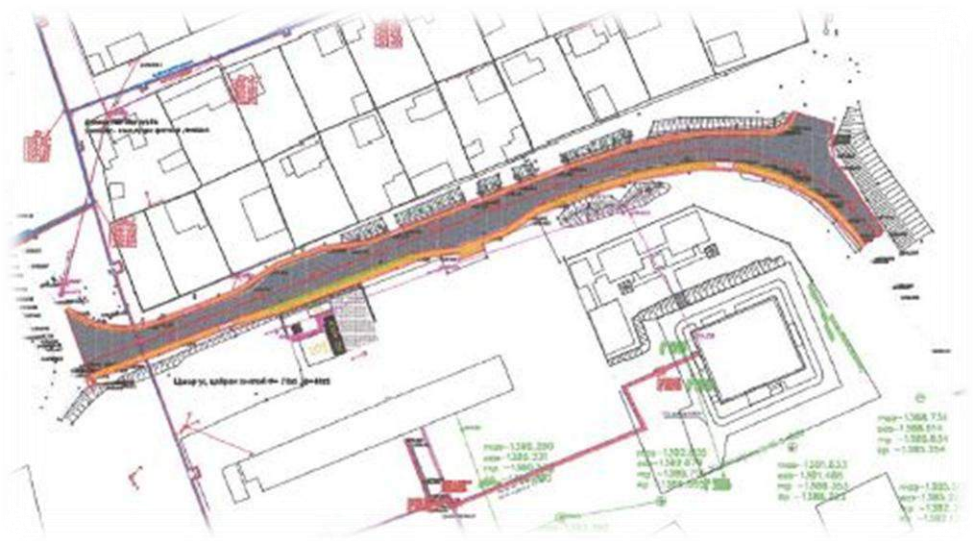

Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Баянбулаг баг. 27-р цэцэрлэгийн тойргоос 16-р сургуулийн уулзвар хүртэлх авто замын их засварын ажил

Байгуулалт: Автозам-0.271 км (L болон чулуун хашлага, тэгшилгээний үе 3-5см, өнгө хучилт 5см)
Зохиогч: Гео урбан консалтинг ХХК
Гүйцэтгэгч: Энх-Алтаргана ХХК
Гэрээний дүн: 398.49 сая.төг
Зөвлөх үйлчилгээ:
Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ

Төлөвлөж буй авто замын байршил



Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг багийн нутаг дэвсгэрт байна

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Орхон аймагт 2025 онд хийгдэх авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

37



Согоот баг
Нийт урт: Автозам 0.133км
2024 онд төлөвлөсөн төсөв: 216.1сая.төг
Зураг төсвөөр: 216.22 сая.төг
Гэрээний хугацаа: 2025.06.02-2025.09.05



Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Согоот баг. 5.25-р байрны авто зам, зогсоолын их засварын ажил
Байгуулалт: Автозам-0.133 км (Чулуун хашлага, тэгшилгээний үе 3-5см, өнгө хучилт 5см)
Зохиогч: Гео урбан консалтинг ХХК
Гүйцэтгэгч: Хүчит зам ХХК
Гэрээний дүн: 216.1сая.төг
Зөвлөх үйлчилгээ:
Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ

Төлөвлөж буй авто замын байршил



Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Согоот багийн нутаг дэвсгэрт байна

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



38

Орхон аймагт 2025 онд хийгдэх авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга



Согоот баг
Нийт урт: Автозам 0.16км
2025 онд тусгагдсан төсөв: 433 сая.төг
Зураг төсвөөр: 1.249,18 сая.төг
Гэрээний хугацаа:



Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Согоот баг. 9,10-р байрны авто зам, зогсоолын их засварын ажил
Байгуулалт: Автозам-0.45 км (Чулуун болон L хашлага, тэгшилгээний үе 3-5см, өнгө хучилт 5см, Байгалийн чулуун хучилт 10x10x10)
Зохиогч: Гео урбан консалтинг ХХК
Гүйцэтгэгч: Тодроогүй
Гэрээний дүн:
Зөвлөх үйлчилгээ:
Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ

Төлөвлөж буй авто замын байршил



Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Согоот багийн нутаг дэвсгэрт байна



39



Наран баг



Нийт урт: Автозам 1км

2024 онд төлөвлөсөн төсөв: 2.3 тэрбум.төг

Зураг төсвөөр: 1.5 тэрбум.төг

Гэрээний хугацаа: 2024.09.09-2025.01.09

2025.01.10-2025.08.12



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Наран баг. 74-р гудамжны уулзвараас хорооллын эцэс хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх.



Байгуулалт: Автозам-1 км (L маягийн бордюр 2130м, 7см асфальтбетон хучилт), явган хүний зам 4см асфальтбетон хучилт, орц гарц дээр нийт 74м лотки




Зохиогч: Кад сүрвэй ХХК

Гүйцэтгэгч: Ингүүмэл зам ХХК

Гэрээний дүн: 1,525,169,720 төг

Зөвлөх үйлчилгээ: Тодроогүй

Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ

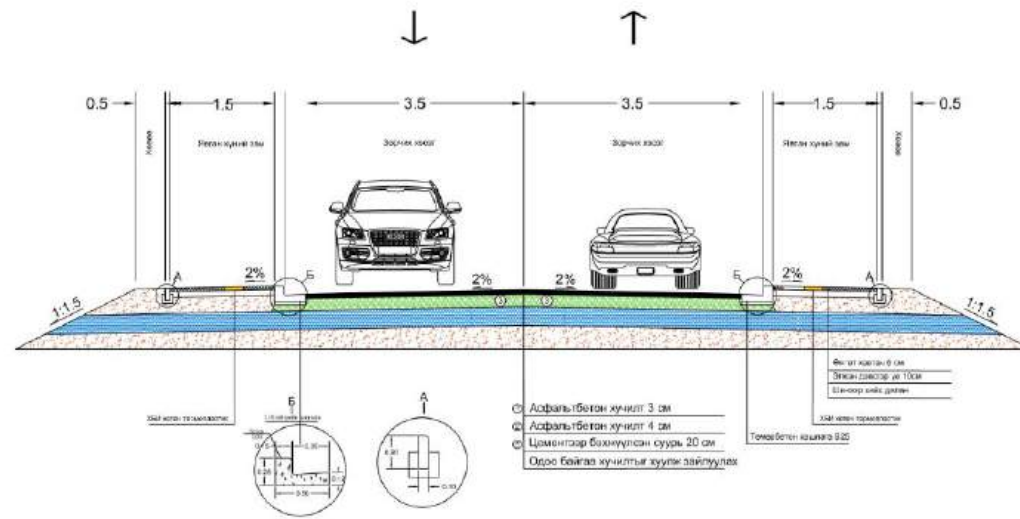

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Гэрээний хугацаа:2025.05.15-2025.08.17



Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ

[illegible]

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Нийт урт: Явган хүний зам 0.89км
2025 онд төлөвлөсөн төсөв:
Зураг төсвөөр:
Гэрээний хугацаа: 2025.06.02-2025.07.29



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Даваат баг. 17-р сургуулийн уулзвараас наран багийн 74-р гудамжны уулзвар хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх.

Байгуулалт: Автозам 0.89 км явган хүний замын хашлага 3372м


Зохиогч: Ти Ай Би ХХК

Гүйцэтгэгч: Хүчит зам ХХК

Гэрээний дүн: 522,004,312 төг

Зөвлөх үйлчилгээ:

Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ

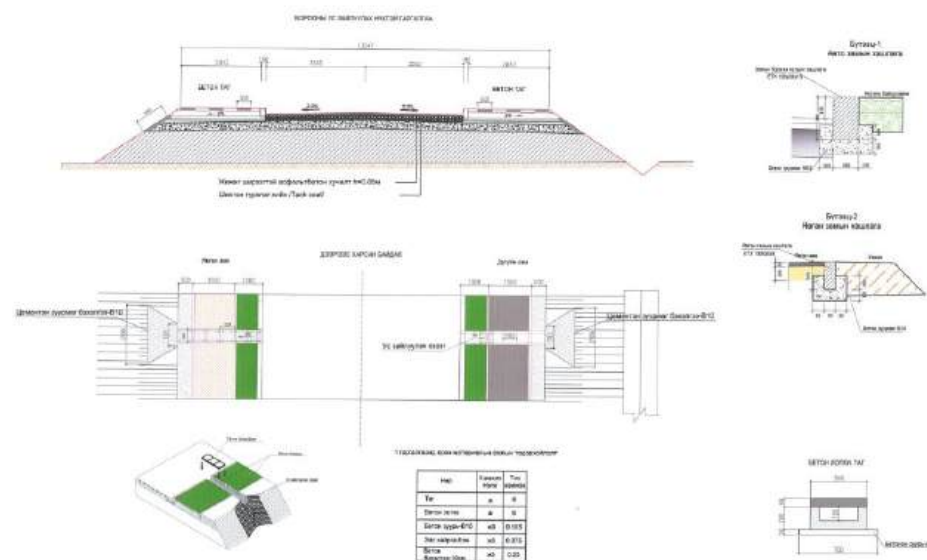

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Гэрээний хугацаа:



Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



47



Баянбулаг баг

Нийт урт: Авто зам 1.5км


2024 онд төлөвлөсөн төсөв: 360м урт

859.684сая.төг

Зураг төсвөөр: 2.742тэрбум.төг

Гэрээний хугацаа: 2024.10.01-2024.11.20

2024.11.21-2025.06.30

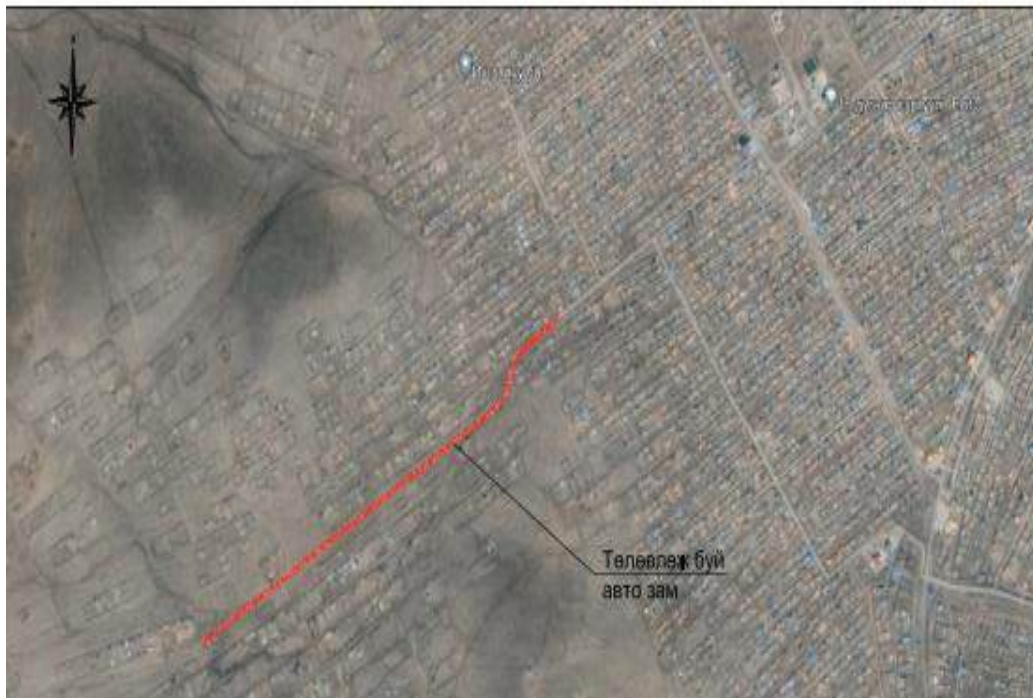

Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Яргуйт багийн "А" цэгээс "М" цэг хүртэлхи 1.506 хатуу хучилттай авто зам

Байгуулалт: Авто зам 1506м, авто замын боржин чулуун хашлага 3092м, 7см асфальтбетон хучилт, Ф500мм ган хоолой 1ш, 3740м² явган хүний зам, лотки 180м


Зохиогч: Дөрвөн тэнхлэг ХХК

Гүйцэтгэгч: Баянцогт зам ХХК

Гэрээний дүн: 859.684сая.төг

Зөвлөх үйлчилгээ: Тодроогүй

Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ

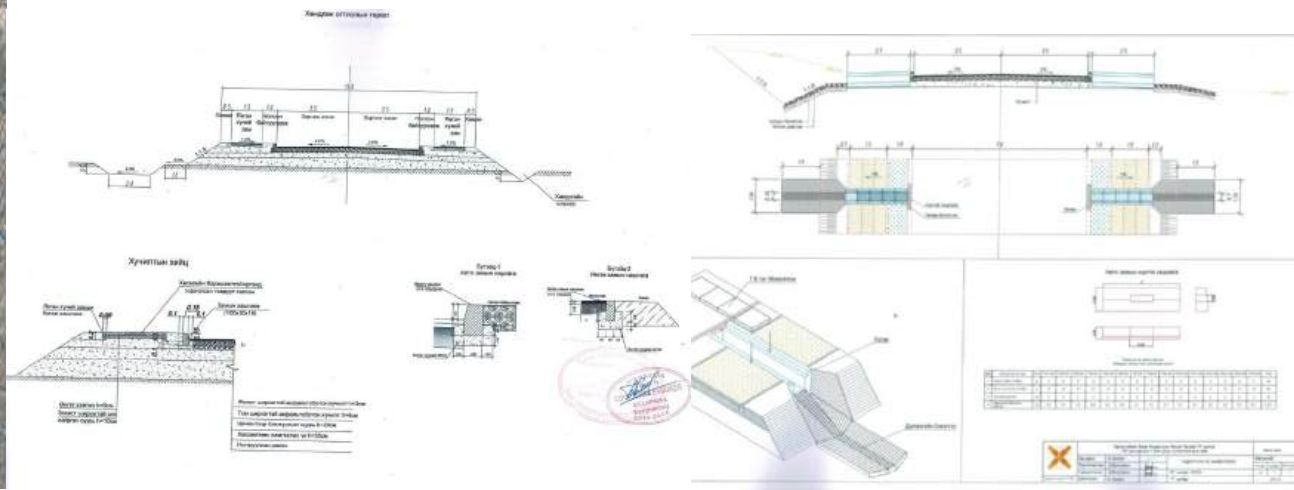



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Гэрээний хугацаа: 2024.10.01-2025.06.14



Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ

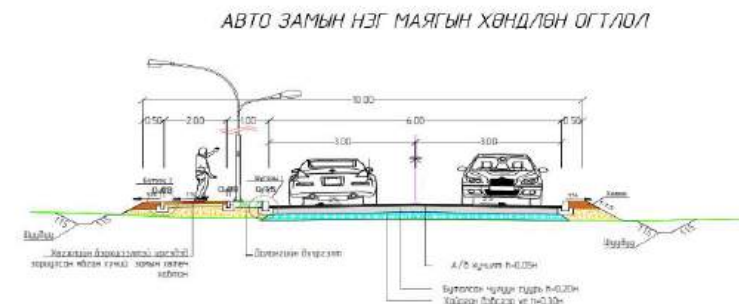

- [illegible]

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



48



Уртын гол баг



Нийт урт: Авто зам 419м

2024 онд төлөвлөсөн төсөв: 235.589сая.төг

Зураг төсвөөр: 527.336сая.төг

Гэрээний хугацаа: 2024.10.01-2025.06.14



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Уртын гол баг. 260 айлын орон сууцны авто зам шинээр барих.

Байгуулалт: Авто зам 419м, авто замын боржин чулуун хашлага 725м, 5см асфальтбетон хучилт, Ф500мм ган хоолой 2ш, 663.3м² явган хүний зам,

Зохиогч: Буман од пикет ХХК

Гүйцэтгэгч: Жавхлан харгуй ХХК

Гэрээний дүн: : 235.589сая.төг

Зөвлөх үйлчилгээ:




Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ



БАЙРШЛЫН ТОЙМ



АВТО ЗАМЫН НЭГ МАЯГЫН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ

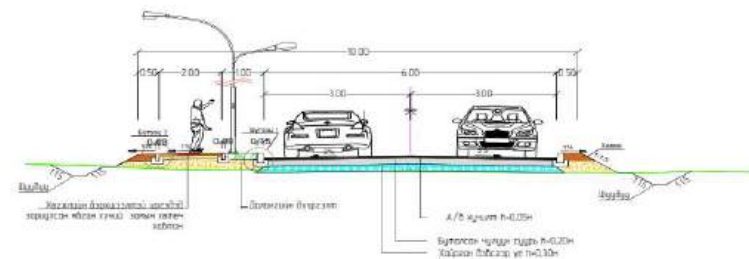

- Туслах:
1. Туслахын хэсэг: бүтэцтэй чулуун гудамж 4-6.00м
 2. Явган хүний зам: 4.00м, 5см асфальтбетон хучилт, Ф500мм ган хоолой 2ш, 663.3м² явган хүний зам
 3. Авто замын боржин чулуун хашлага 725м, 5см асфальтбетон хучилт, Ф500мм ган хоолой 2ш, 663.3м² явган хүний зам
 4. Авто замын боржин чулуун хашлага 725м, 5см асфальтбетон хучилт, Ф500мм ган хоолой 2ш, 663.3м² явган хүний зам
 5. Авто замын боржин чулуун хашлага 725м, 5см асфальтбетон хучилт, Ф500мм ган хоолой 2ш, 663.3м² явган хүний зам
 6. Авто замын боржин чулуун хашлага 725м, 5см асфальтбетон хучилт, Ф500мм ган хоолой 2ш, 663.3м² явган хүний зам
 7. Авто замын боржин чулуун хашлага 725м, 5см асфальтбетон хучилт, Ф500мм ган хоолой 2ш, 663.3м² явган хүний зам
 8. Авто замын боржин чулуун хашлага 725м, 5см асфальтбетон хучилт, Ф500мм ган хоолой 2ш, 663.3м² явган хүний зам
 9. Авто замын боржин чулуун хашлага 725м, 5см асфальтбетон хучилт, Ф500мм ган хоолой 2ш, 663.3м² явган хүний зам
 10. Авто замын боржин чулуун хашлага 725м, 5см асфальтбетон хучилт, Ф500мм ган хоолой 2ш, 663.3м² явган хүний зам

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



48



Уртын гол баг



Нийт урт: Авто зам 419м

2024 онд төлөвлөсөн төсөв: 291,747 сая.төг

Зураг төсвөөр: 527.336 сая.төг

Гэрээний хугацаа:



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Уртын гол баг. 260 айлын орон сууцны авто зам шинээр барих.

Байгуулалт: Авто зам 419м, авто замын боржин чулуун хашлага 725м, 5см асфальтбетон хучилт, Ф500мм ган хоолой 2ш, 663.3м² явган хүний зам,

Зохиогч: Буман од пикет ХХК

Гүйцэтгэгч: Тодроогүй

Гэрээний дүн: : 235.589 сая.төг

Зөвлөх үйлчилгээ:




Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ



БАЙРШЛЫН ТОЙМ



АВТО ЗАМЫН НЭГ МАЯГЫН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ

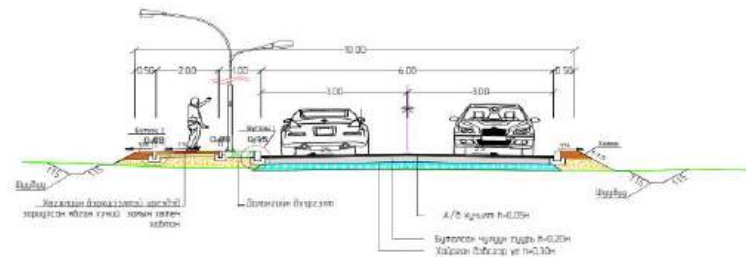

- Тусламж
1. Тусламж үйлчилгээний үйлчилгээний нэгж үйлчилгээний
 2. Явган хүний замны гэрээний тусламж нь чөлөөт хөрөнгөний үйлдвэр (үсэм) стандарт
 3. Явган хүний замны гэрээний тусламж нь чөлөөт хөрөнгөний үйлдвэр (үсэм) стандарт
 4. Явган хүний замны гэрээний тусламж нь чөлөөт хөрөнгөний үйлдвэр (үсэм) стандарт
 5. Явган хүний замны гэрээний тусламж нь чөлөөт хөрөнгөний үйлдвэр (үсэм) стандарт
 6. Явган хүний замны гэрээний тусламж нь чөлөөт хөрөнгөний үйлдвэр (үсэм) стандарт
 7. Явган хүний замны гэрээний тусламж нь чөлөөт хөрөнгөний үйлдвэр (үсэм) стандарт
 8. Явган хүний замны гэрээний тусламж нь чөлөөт хөрөнгөний үйлдвэр (үсэм) стандарт
 9. Явган хүний замны гэрээний тусламж нь чөлөөт хөрөнгөний үйлдвэр (үсэм) стандарт
 10. Явган хүний замны гэрээний тусламж нь чөлөөт хөрөнгөний үйлдвэр (үсэм) стандарт

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 оны 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



32



Цагаанчулуут баг

Төлөвлөсөн төсөв: 2025 онд 693.2 сая.төг

Зураг төсвөөр: 1,421.2 сая.төг

Гэрээний хугацаа: 2025.06.02-205.07.29



Ажлын нэр: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хорооллын эцсээс 26-р цэцэрлэгийн баруун талын уулзвар хүртэлх авто замд их засварын ажил



Байгуулалт: Замын тэмдэг 23ш, дугуйн зам 786м, явган хүний зам 747м, хурд сааруулагч 1ш, ус зайлуулах тэвш 52.5м


Зохиогч: Классик роуд ХХК

Гүйцэтгэгч: Хүчит зам ХХК

Гэрээний дүн: 693.243.596 төг

Зөвлөх үйлчилгээ:

Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ

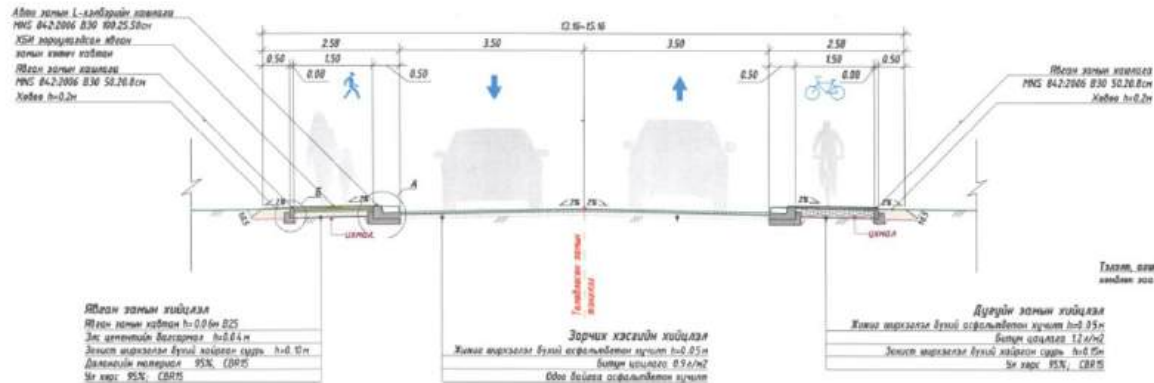

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



31



Цагаанчулуут баг




Нийт урт: 0.7 км

Төлөвлөсөн төсөв: 2025 онд 141,334 сая.төг



Зураг төсвөөр: 827,3 сая.төг

Гэрээний хугацаа: 2025.05.20-2025.07.25

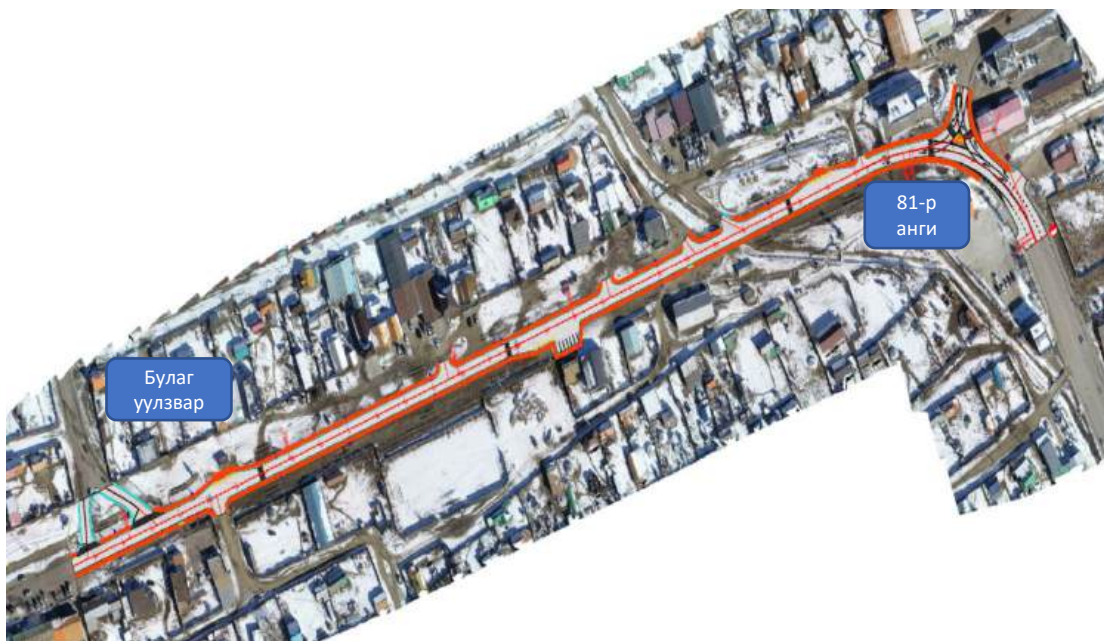

Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Цагаанчулуут баг. Онцгой байдлын 81-р ангийн уулзвараас Булаг багийн уулзвар хүртэлх авто замд их засварын ажил



Байгуулалт: Явган зам-1043 м2



Зохиогч: Классик роуд ХХК

Гүйцэтгэгч: Эрхэм нөхөр ХХК

Гэрээний дүн: 141 334 995 төг

Зөвлөх үйлчилгээ: Тодроогүй

Захиалагчийн хяналт: ХББЗА ОНӨААТҮГ



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Дэнж баг

Нийт замын урт **0.79 км**
Захиалагчийн хяналт “Ар Си Эс Си” ХХК




Энэ онд хийгдэх ажил: **1 талын явган зам хийгдэнэ. Гэрлийн шон шилжүүлэх ажил хийгдсэний дараа гүйцэтгэгч ажлаа үргэлжлүүлэхээр хүлээж байна.**



Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Кувейтын гудамжны аюулгүйн тойргоос Эрдэнэ багийн уулзвар хүртэл 3.5 км хатуу хучилттай авто замын "ПК 15+70 - ПК 23+54" хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх.



Гүйцэтгэгч: **“Жавхлан харгуй” ХХК**
Гэрээний дүн: **1,130,112,632**
Гэрээний хугацаа: **2025.05.01-2024.07.15**

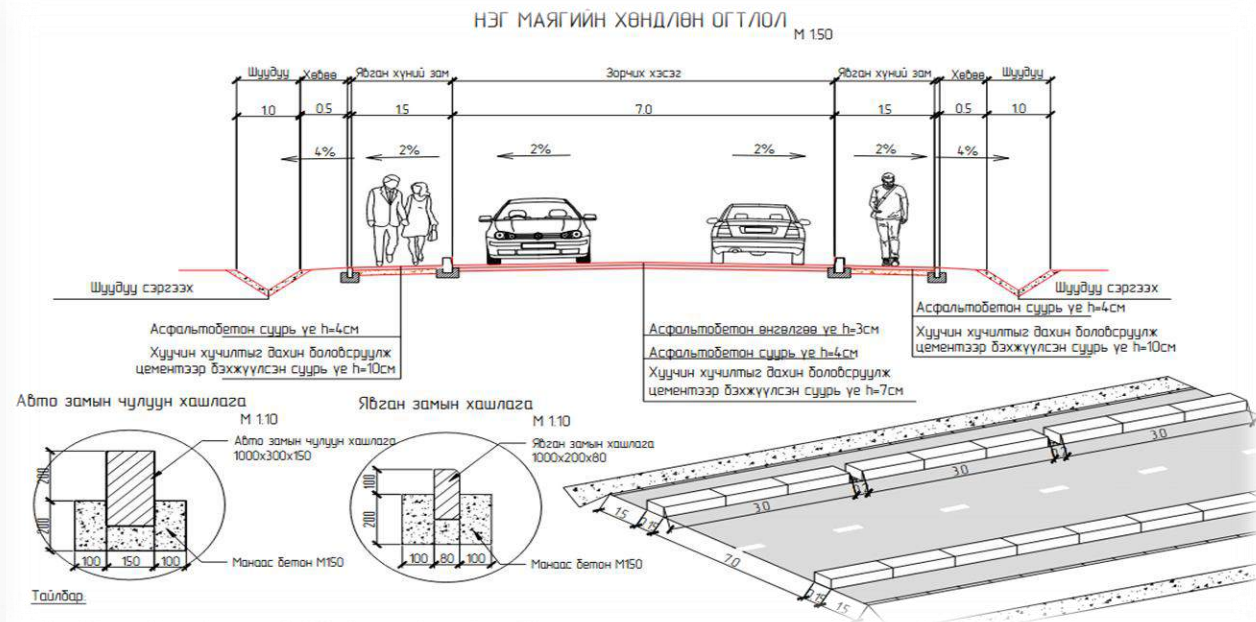

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



МОНГОЛЫН ХАМГААГАХ АЖАЛ ГАРГАХ ЗӨЛӨӨСӨӨН

Уурхайчин баг



Нийт урт: 0,2 км



Энэ онд хийгдэх ажил: Явган замын ажил хийгдэж байна. Мөн босоо тэмдэг суурьлуулах ажил хийгдэнэ.



Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Уурхайчин баг. Уурхайчны тойргийн хэсгийн авто замд их засварын ажил хийх./үлдэгдэл хийх/



Гүйцэтгэгч: “Жи Пи экспресс финанс” ХХК
Гэрээний хугацаа: 2025.05.01-2025.06.20
Гэрээний дүн: 273,076,910₮





Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Зэст баг



Нийт урт **0.426 км**



Энэ онд хийгдэх ажил: Асфальтбетон хучилт 7см, хуучин хучилтыг цементээр бэхжүүлсэн суурь болгох ажил 20см. Одоо талбайд ус зайлуулах сувгийн ажил хийгдэж байна.



Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Зэст баг. 1-14-р байрны хойд талын тойргоос БОЭТ-ийн баруун урд талын уулзвар хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх.



Гүйцэтгэгч: **"Ингүүмэл Зам" ХХК**
Гэрээ байгуулсан дүн: **771,562,852**
Гэрээний хугацаа: **2025.05.15 - 2025.08.12**



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст баг, 1-14-р байрны хойд талын тойргоос БОЭТ-ийн баруун урд талын уулзвар хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх.



Уурхайчин баг



Нийт урт **0,162 км**



Энэ онд хийгдэх ажил: 1 талдаа явган замын ажил болон босоо тэмдэг байршуулах ажил хийгдэнэ



Уурхайчины гудамжийг А1001 замтай холбосон авто замд их засварын ажил хийх.
/ үлдэгдэл хэсэг/



Гүйцэтгэгч: " **ХХК**
Гэрээний дүн: **46,478,000₮**



Явган зам хийгдэх зүүн талын хэсэг

ᠠᠪᠲᠤ ᠵᠠᠮ-2024" ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠲᠤ 2024 ᠣᠨᠳᠤ ᠬᠢᠶ᠋ᠭᠳᠡᠬᠤ ᠠᠪᠲᠤ ᠵᠠᠮᠤ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷᠢ ᠬᠥᠷᠦᠨᠭᠦ ᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭᠠ



Орхон аймагт 2024 онд хийгдэх авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

Оюут баг



Нийт урт **0,23 км**



Энэ онд хийгдэх ажил:
Асфальтбетон хучилт, явган замын ажил хийгдэнэ.



Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Оюут баг.
Отгонбилэгийн гудамжны төв замаас 28,34-р байрны авто зогсоол , авто замд их засварын ажил хийх.



Гүйцэтгэгч: **“Баянцогт Зам” ХХК**
Гэрээ байгуулсан дүн: **276,0 сая**
Гэрээний хугацаа: **2025.05.20-2025.06.30**



11 Sep 2024 15:13:27





Орхон аймагт 2024 онд хийгдэх авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

Оюут баг



Нийт урт 0,31 км



Энэ онд хийгдэх ажил: Асфальтбетон хучилтын эвдрэл гарсан тул гүйцэтгэгч өөрийн хөрөнгөөр уулзварын нэвтрүүлэх хэсгийг ахин хучилт хийж хүлээлгэн өгнө.



Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Оюут баг. Барилгачдын талбайн уулзвараас зүүн тийш 0.31км авто замд их засварын ажил хийх.



Гүйцэтгэгч: "Баянцогт Зам" ХХК
Гэрээ байгуулсан дүн: 268,0 сая
Гэрээний хугацаа: 2025.06.20-2025.06.30



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



ᠠᠪᠲᠤ ᠵᠠᠮ-2024" ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠲᠤ 2024 ᠣᠨᠳᠤ ᠬᠢᠶᠢᠭᠳᠡᠬᠤ ᠠᠪᠲᠤ ᠵᠠᠮᠤ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷᠢ ᠬᠥᠷᠦᠨᠭᠦ ᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠋᠎ᠠ

Говил баг



Нийт урт **0,197** км




Энэ онд хийгдэх ажил:
Асфальтбетон хучилт, явган замын ажил хийгдэнэ.



Говил баг. Төв замаас 48-р байр хүртэл авто зам шинээр барих.



Гүйцэтгэгч: **Энх-алтаргана ХХК**
Гэрээний хугацаа: 2025.05.21-2025.08.01
Гэрээний дүн: **496,461,606₮**

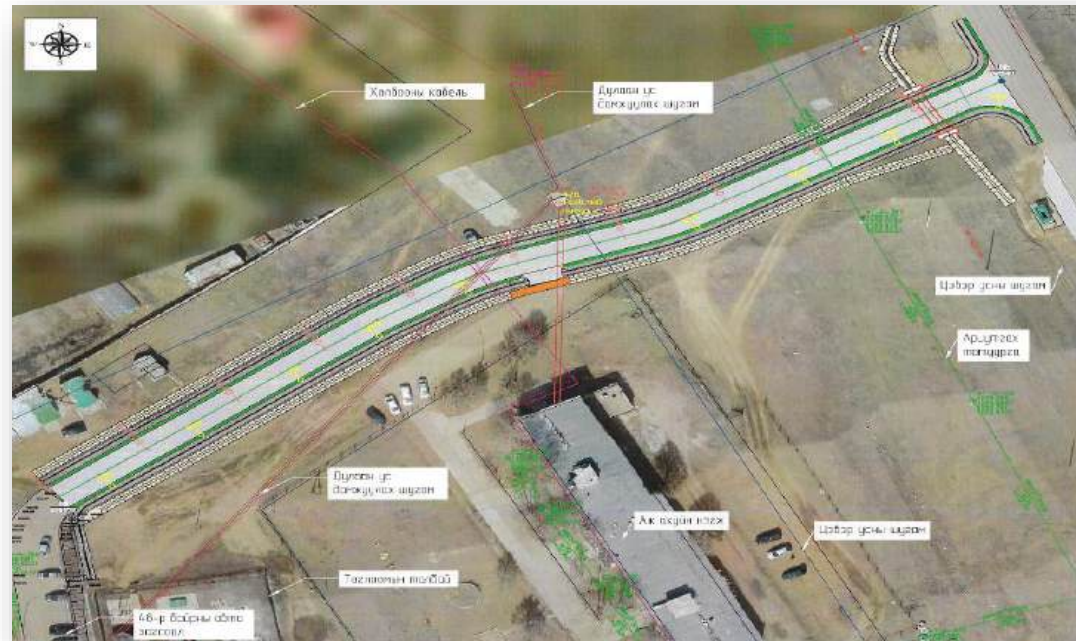



This aerial map shows a residential area with a red line indicating a route. The route starts at the bottom left, goes up, then right, then up again, and finally right towards the top right. Yellow lines indicate boundaries or roads. Labels include 'Top School' and 'Middle School'.

Нийт өргөн 9.36

Зорчих хэсэг 6.00

Явган хүний зам 1.18

Хөвөө 0.50

Газрын гадарга

Асфальтбетон хучилт, $h=4\text{см}$
 Зохиистой найрлагатай суурь, $h=15\text{см}$
 Хөвөөний материал

Өнгө асфальтбетон хучилт $h=3\text{см}$
 Суурь асфальтбетон хучилт $h=4\text{см}$
 Буталсан чулуун суурь $h=20\text{см}$
 Хөдөлгөөс хамгаалах үе $h=30\text{см}$
 Ул хөрс

တစ်နှစ် နှစ်ချုပ်

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Орхон аймагт 2024 онд хийгдэх авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

Чингэл баг



Нийт урт **1,08 км**




Энэ онд хийгдэх ажил: Асфальтбетон хучилтын ажил, явган замын ажил 2 талдаа хийгдэнэ.



Чингэл багийн авто замын төгсгөлөөс Ёс заншлын өргөө хүртэлх 1км хатуу хучилттай авто зам шинээр барих.



Гүйцэтгэгч: **"Жавхлан харгуй" ХХК**
Гэрээний дүн: **1,343,259,651₮**
Гэрээний хугацаа: **2025.05.01 - 2025.07.15**

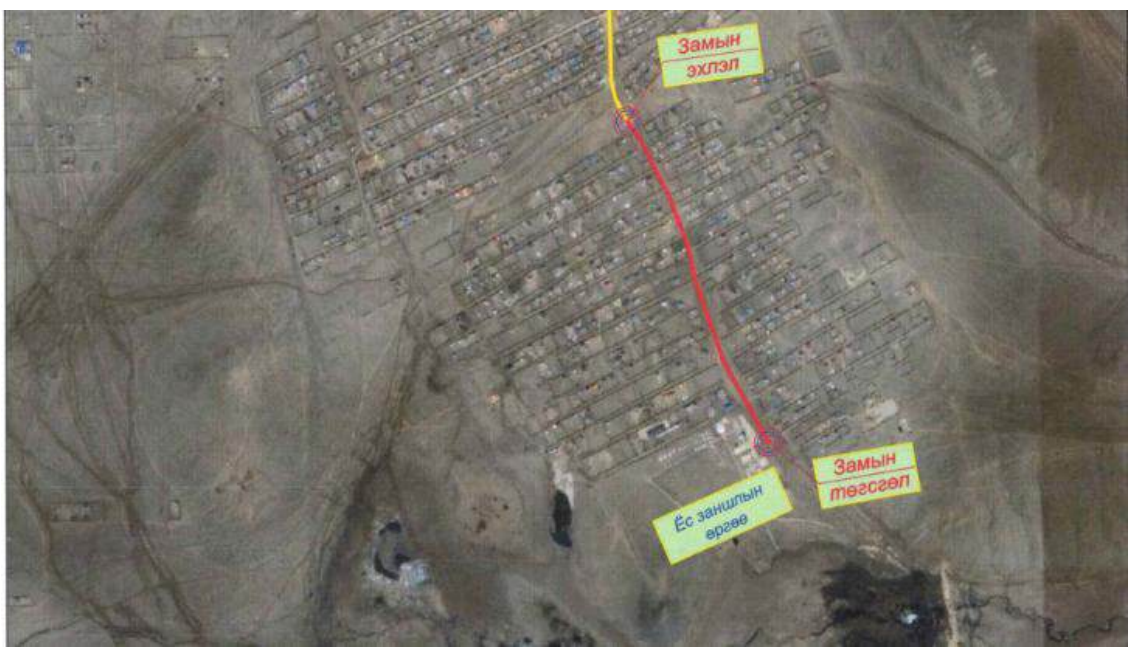



Гэрээний хугацаа: 2025.05.20 - 2025.08.14



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Орхон аймагт 2024 онд хийгдэх авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

Уртбулаг баг



Нийт урт 0,432 км



Энэ онд хийгдэх ажил: Халуун асфальтбетоноор өнгө хучилт хийх, боржин чулуун хашлага суулгах.



Уртбулаг баг. 1-р байрны дундах авто зогсоолоос 19-р байрны авто зам хүртэлх авто зам, авто зогсоолд их засварын ажил хийх.



Гүйцэтгэгч: “Эрхэм нөхөр” ХХК
Гэрээ байгуулсан дүн: 404,289,808₮
Гэрээний хугацаа: 2025.05.15-2025.08.15



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Орхон аймагт 2024 онд хийгдэх авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

Дэнж баг



Нийт урт 0.094 км



Энэ онд хийгдэх ажил: Халуун асфальтбетон хучилт хийх, боржин чулуун хашлага суулгах, явган замын ажил хийх.



Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Дэнж баг. Сэтгэц мэдрэлийн эмнэлэгийн гадна талд хатуу хучилттай авто зогсоол шинээр барих.



Гүйцэтгэгч: "Эрхэм нөхөр" ХХК
Гэрээ байгуулсан дүн: 257,165,863 ₮
Гэрээний хугацаа: 2025.05.15-2025.07.01



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Орхон аймагт 2024 онд хийгдэх авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

Оюут баг



Нийт урт **0,413 км**



Энэ онд хийгдэх ажил:
Асфальтбетон хучилт бүхий 410м
авто зам, гүүрэн байгууламж



Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум, Орон сууцны хороолол
доторх авто замын зураг төсөл (Оюут баг, Орон сууцны 2А
хорооллын авто замыг А1001 болон Эрх чөлөөний өргөн
чөлөөний авто замтай холбох)



Гүйцэтгэгч: **"Хүчит Зам" ХХК**
Гэрээ байгуулсан дүн: **1,197,966,576**
Гэрээний хугацаа: **2025.05.25 - 2025.08.23**



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Орхон аймагт 2024 онд хийгдэх авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

Бүрэнбүст баг



Нийт урт **0,135 км**





Энэ онд хийгдэх ажил:
Асфальтбетон хучилт, Ус
зайлуулах лотки, явган хүний зам,
боржин чулуун хашлага суулгах
ажил.



Орхон аймаг. Баян-өндөр сум. Бүрэнбүст баг. Эрх чөлөөний
өргөн чөлөөний авто замаас 5-р сургууль хүртэлх авто зам,
авто зогсоолд их засварын ажил хийх.



Гүйцэтгэгч: **"Хүчит Зам" ХХК**
Гэрээ байгуулсан дүн: **248,062,414 ₮**
Гэрээний хугацаа: **2025.06.02 - 2025.09.05**

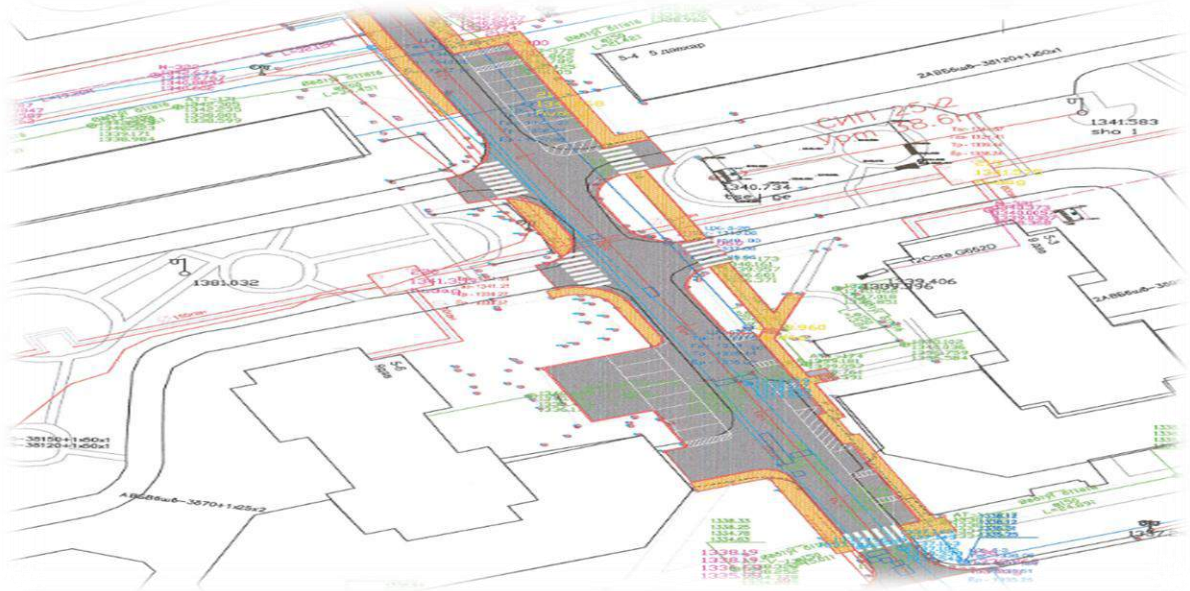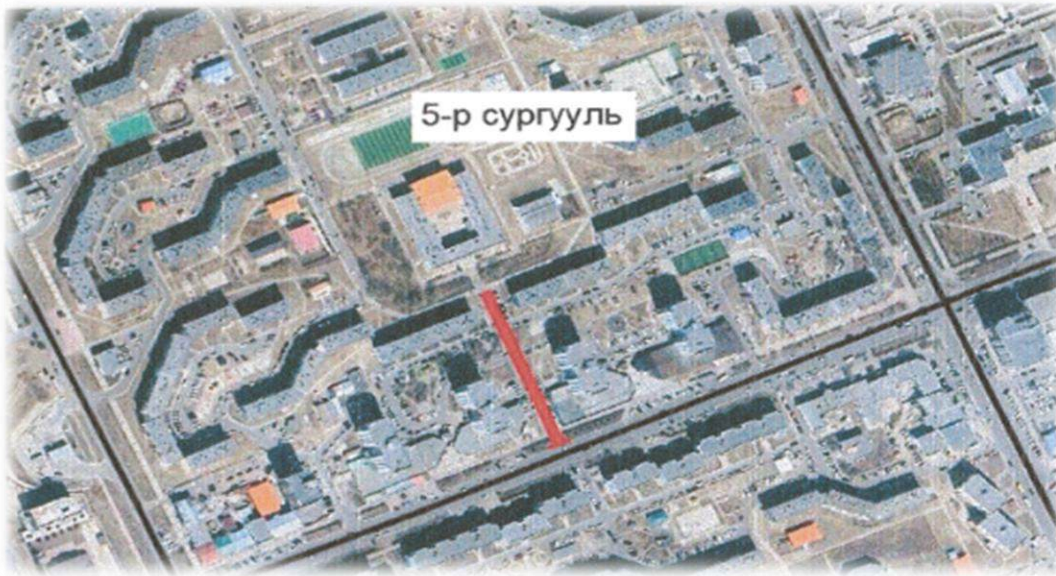

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



ᠠᠪᠲᠤ ᠵᠠᠮ-2024" ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠲᠤ 2024 ᠣᠨᠳᠤ ᠬᠢᠶᠢᠭᠳᠡᠬᠤ ᠠᠪᠲᠤ ᠵᠠᠮᠤ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷᠢ ᠬᠥᠷᠥᠨᠭᠡ ᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠤᠭᠤᠯᠭᠠ

Хүрэнбулаг баг



Нийт урт **0,16 км**




Энэ онд хийгдэх ажил:
асфальтбетон хучилт хийх,
боржин чулуун хашлага
суурьлуулах



Эрх чөлөөний өргөн чөлөөний авто замаас
Эрдэнэт үйлдвэр ТӨХК-ийн захиргааны 1-р байрны
авто зам, авто зогсоолд их засварын ажил хийх.



Гүйцэтгэгч: **"Хүчит Зам" ХХК**
Гэрээ байгуулсан дүн: **233,650,866 ₮**
Гэрээний хугацаа: **2025.06.02 - 2025.09.05**

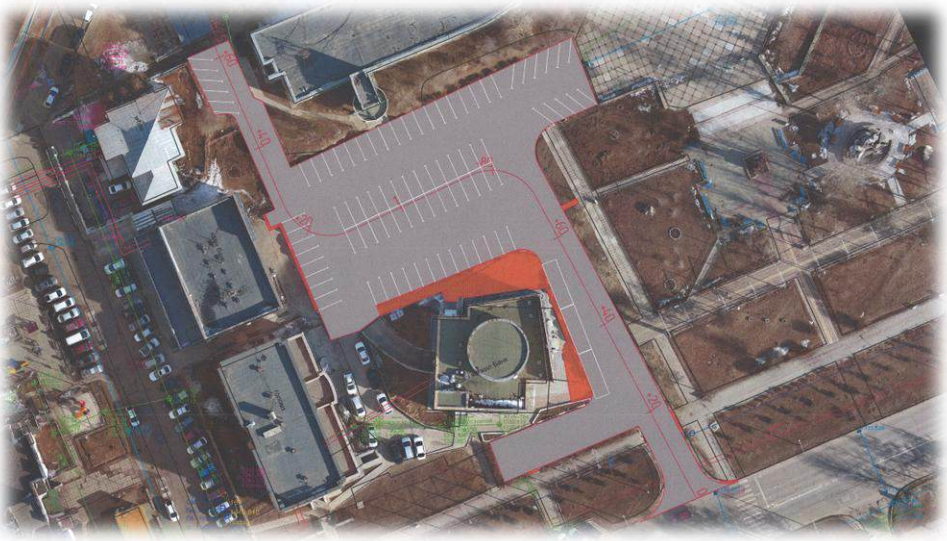



Хүрэнбулаг баг

Хүрэнбулаг баг



Нийт урт 0,15 км



Энэ онд хийгдэх ажил:
Асфальтбетон хучилт хийх,
Боржин чулуун хашлага
суурьлуулах.



Эрх чөлөөний өргөн чөлөөний авто замаас 4-14-р
байрны зүүн талаар 0.2 км авто зам, авто зогсоолд
их засварын ажил хийх.



Гүйцэтгэгч: "Хүчит Зам" ХХК
Гэрээ байгуулсан дүн: 167,001,763 ₮
Гэрээний хугацаа: 2025.05.20 - 2025.08.18



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Хүрэнбулаг баг

Хүрэнбулаг баг



Нийт урт **0,392 км**



Энэ онд хийгдэх ажил: ЦБСуурь
байгуулан Асфальтбетон хучилт
Боржин чулуун хашлага
суурьлуулах



Татвар нийгмийн даатгалын барилгын баруун хойд
талын авто замаас 11-р хорооллын А хэсгийн авто
замд их засварын ажил хийх.



Гүйцэтгэгч: **"Хүчит Зам" ХХК**
Гэрээ байгуулсан дүн: **628,038,438 ₮**
Гэрээний хугацаа: **2025.06.15 - 2025.07.15**





ᠠᠪᠲᠤ ᠵᠠᠮ-2024" ᠣᠷᠬᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠲᠤ 2024 ᠣᠨᠳᠤ ᠬᠢᠶᠢᠭᠳᠡᠬᠤ ᠠᠪᠲᠤ ᠵᠠᠮᠤ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷᠢ ᠬᠥᠷᠥᠨᠭᠥ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠤᠭᠤᠯᠠ

Уртбулаг баг



Нийт урт **1,5 км**



Зорчих хэсгийн өргөн 7м, хуучин хучилтыг цементээр бэхжүүлж 20см суурь болгон 7см асфальтбетон хучилт хийгдэнэ. Боржин чулуун хашлагатай. Явган зам 1,5м




19-р цэцэрлэгийн уулзвараас Оросын элчингийн уулзвар хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх




Гүйцэтгэгч: **“Жи Пи экспресс финанс” ХХК**
Гэрээний хугацаа: **2025.05.20-2025.10.30**
Гэрээний дүн: **2,290,661,700 ₮**



ЗАМЫН НЭГ МАЯГИЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ-1
1-р хэсэг Km 0+500-Km 0+240



ЗАМЫН НЭГ МАЯГИЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ-2
1-р хэсэг Km 0+240-Km 0+543.3




ЗАМЫН ХАШЛАГА




ЯВГАН ЗАМЫН ХАШЛАГА



ЯВГАН ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН ХИЙЦ



ЗАМЫН НЭГ МАЯГИЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ-3



ЗАМЫН НЭГ МАЯГИЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ-4



- Тайлбар:
1. Тухайнхон хэргийнхэн Үүсдэг бүх хэмжээний хэмжээг өөрчилсөн.
 2. Дүрсний өгөгдөл нь тухайнхон 1:500-ийн хэмжээгээр.

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



Орхон аймагт 2024 онд хийгдэх авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

Дэнж баг



Нийт замын урт **2.5 км**



Энэ онд хийгдэх ажил: 60см суурийн материал солих, бороо ус зайлуулах далд сувагчлалын ажил, явган зам, дугуйн замын




Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Кувейтын гудамжны аюулгүйн тойргоос Эрдэнэ багийн уулзвар хүртэл 3.5 км хатуу хучилттай авто замын "ПК 9+30 - ПК 23+54" хүртэлх авто замд их засварын ажил хийх.



Гүйцэтгэгч: **"Жи Пи экспресс финанс" ХХК**
Гэрээний хугацаа: **2025.05.20-2025.10.30**
Гэрээний дүн: **6,245,651,782 ₮**

Түр замын маршрут гарсан. Талбайн ажил эхлэх бэлтгэл ажил хангагдсан.

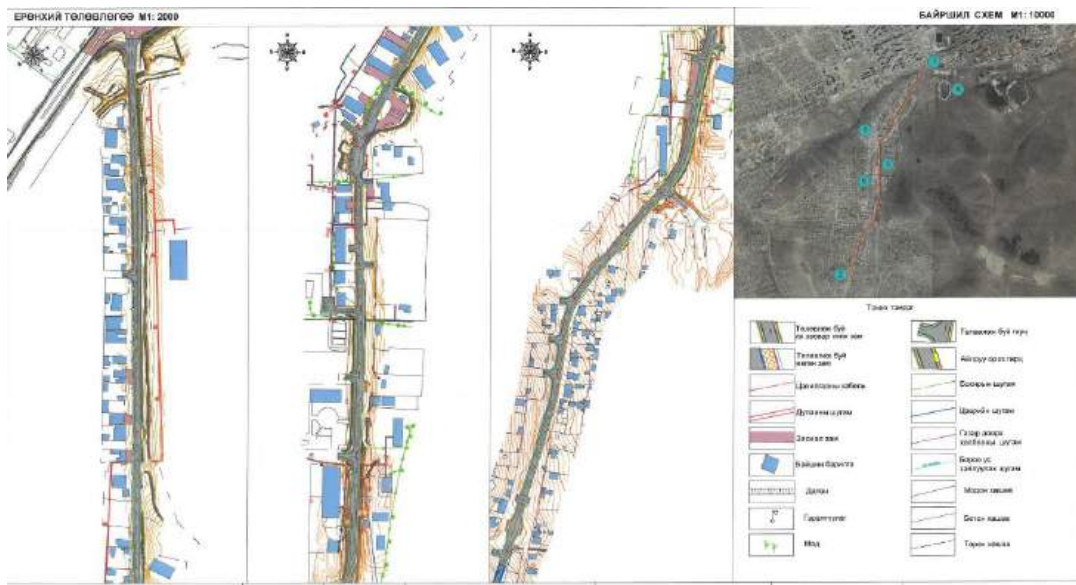



1



Ажлын нэр: "Говил баг. "Хонхорын хэсэгт байрлах 100 айлын төв шугамыг шинэчлэх засварлах"
Ажлын тоо хэмжээ: Халаалтын 2 хос шугам $\Phi 159 \times 4,5$ 115.4м, Цэвэр усны шугам $159 \times 4,5$ 115.4м



Зохиогч: "Орхон Прожект" ХХК
Гүйцэтгэгч: "Голомт илч холдинг" ХХК



Говил баг, Хонхорын хэсэг баг
Төсөвт өртөг: 200,000,000.төг
Гэрээний хугацаа: 2025.05.20 - 2025.07.18
Ажлын явц, тайлбар:
Ажил эхлэхээр бэлтгэл ажил хангагдаж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 5%



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 50 тэрбум төгрөгт батлагдсан.



2



Ажлын нэр: Цагаанчулуут баг. "Эко" хорооллын
УДХТ-ийн 2-р хэлхээний шугам сүлжээ

Ажлын тоо хэмжээ: Халаалтын 2 хос шугам
Ф133*4,5-45*2,5 425м, Цэвэр усны шугам 108 *4,5-
89*4,5 423м

Зохиогч: "Дөрвөнгүн"ХХК

Гүйцэтгэгч: "Талст билэг" ХХК



Цагаанчулуут баг, Эко хороолол

Төсөвт өртөг: 586.200.000 төг


Гэрээний хугацаа: 2025.06.15 - 2025.08.15

Ажлын явц, тайлбар:

Ажил эхлэхээр бэлтгэл ажил хангагдаж байна.



Гүйцэтгэлийн хувь: 5%

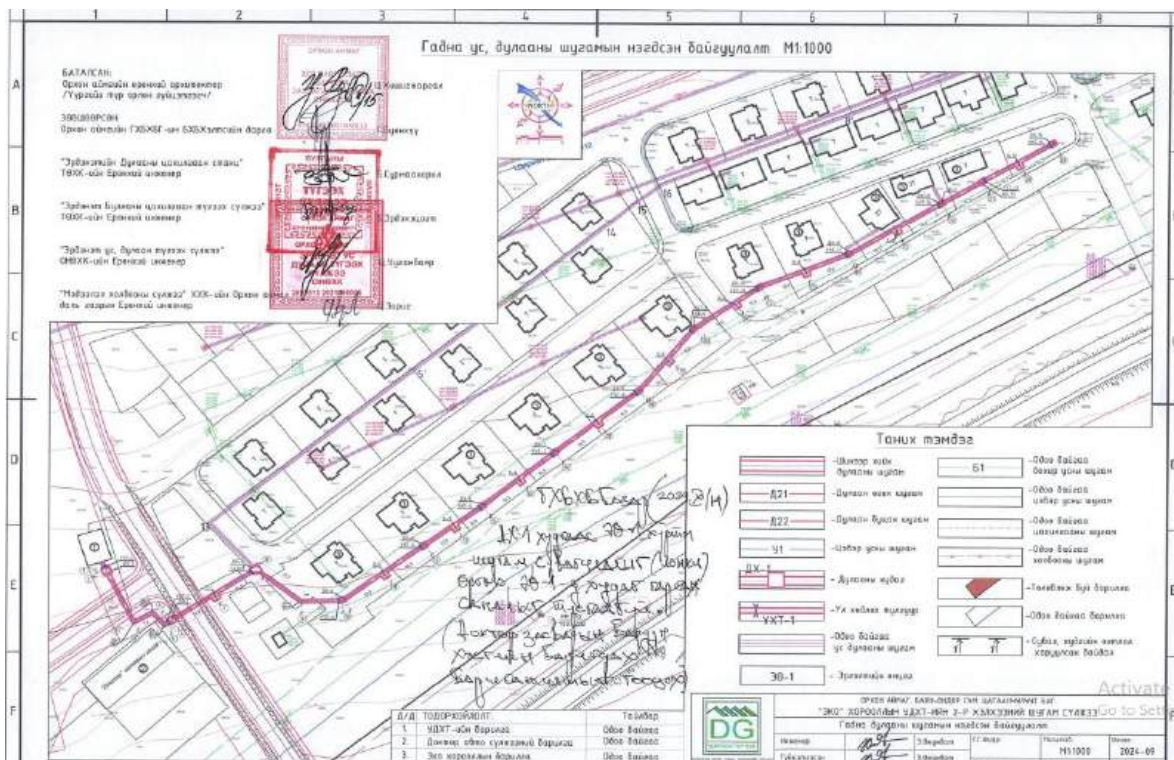




3



Ажлын нэр: Эко хорооллын хойд уулзварын дулааны шугамын өөрчлөлт
Ажлын тоо хэмжээ: Халаалтын 2 хос шугам $\Phi 273 \times 6,0$ 36,5м, Цэвэр усны шугам $219 \times 4,5$ 36,5м
Зохиогч: "Асгат өргөө" ХХК
Гүйцэтгэгч: "Талст билэг" ХХК



Цагаанчулуут баг, Эко хороолол
Төсөвт өртөг: 150.200.000 төг
Гэрээний хугацаа: 2025.05.20 - 2025.06.30
Ажлын явц, тайлбар: Цэвэр усны төв шугамаас 26-р цэцэрлэг, сургууль хангагддаг тул 06 сарын 03 өдрөөс эхлүүлэх төлөвлөж байна.
Гүйцэтгэлийн хувь: 5%

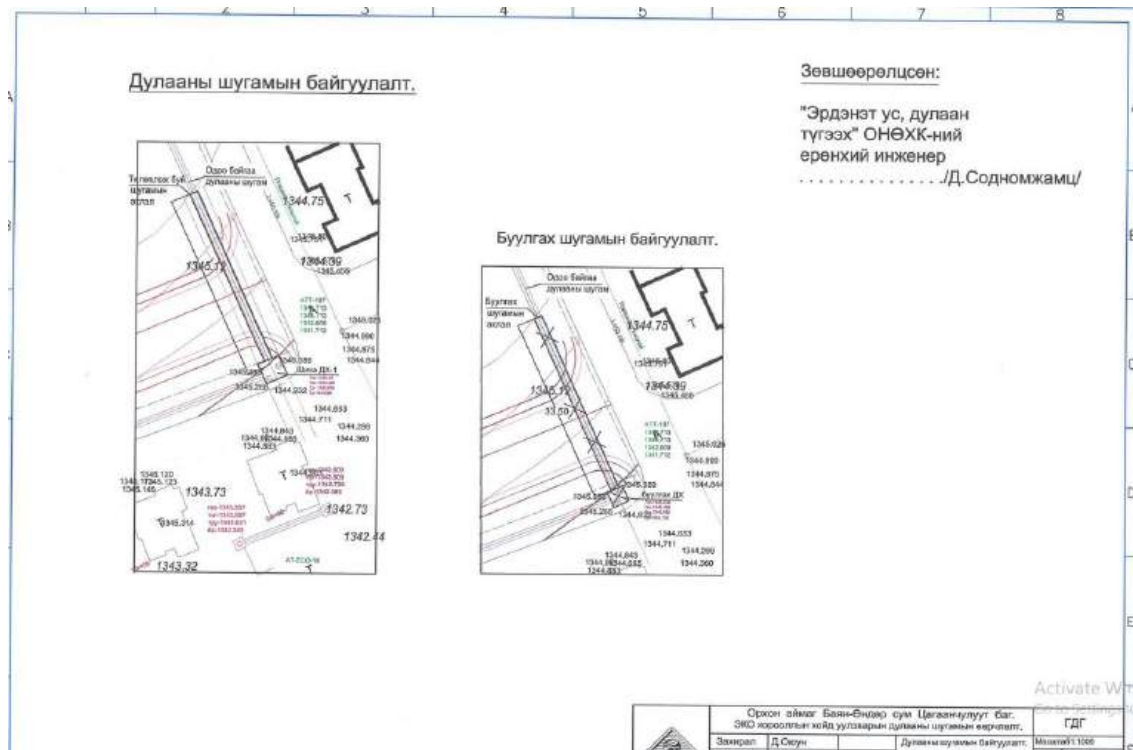

5



Ажлын нэр: “Уурхайчин багт Тамир зочид буудлын урдах УДХТ-ийг инженерийн шугам сүлжээнд холбох /дулаан механик/”

Ажлын тоо хэмжээ: Халаалтын ачаалал 3000квт, Хэрэгцээний халуун ус 2800квт, гадна цахилгаан АВВБ 3х95+1х50мм 2 хос кабель

Зохиогч: “Жаргал проект”ХХК

Гүйцэтгэгч: “Мээжийн савдаг” ХХК



Уурхайчин баг,

Төсөвт өртөг: 800.830.000 төг

Гэрээний хугацаа: 2024.10.01 - 2025.05.15

Ажлын явц, тайлбар:

Ажил дуусч комисс ажлуулах хүсэлт өгсөн.

Гүйцэтгэлийн хувь: 95%





6



Ажлын нэр: “Мэндцэцэн”ӨЭМТ гадна шугамыг засварлах

Ажлын тоо хэмжээ: 2-р хэлхээний 5 хос шугам
Φ108х4.0-89х4.0 204м

Зохиогч: “ХББЗА”ОНӨААТҮГ

Гүйцэтгэгч: “Билигт хайрхан” ХХК



Уурхайчин баг,



Төсөвт өртөг: 191.498.810 төг

Гэрээний хугацаа: 2025.05.25- 2025.07.25

Ажлын явц, тайлбар:

Гэрээ хийх шатанд явж байга.

Гүйцэтгэлийн хувь: 2%

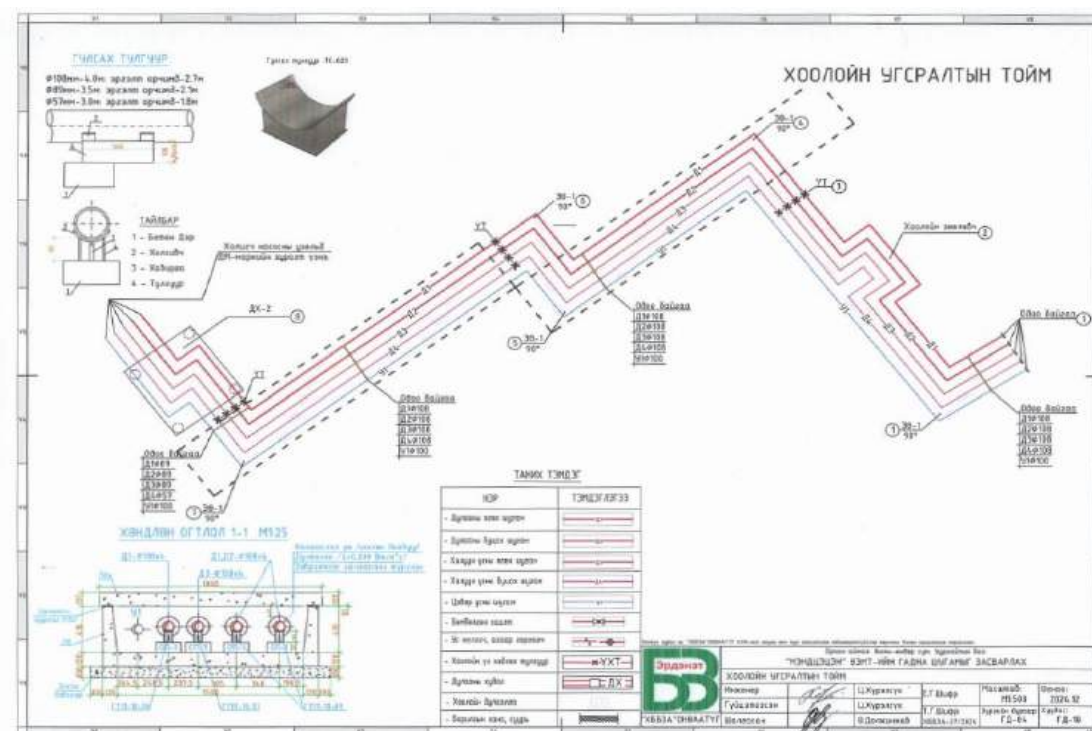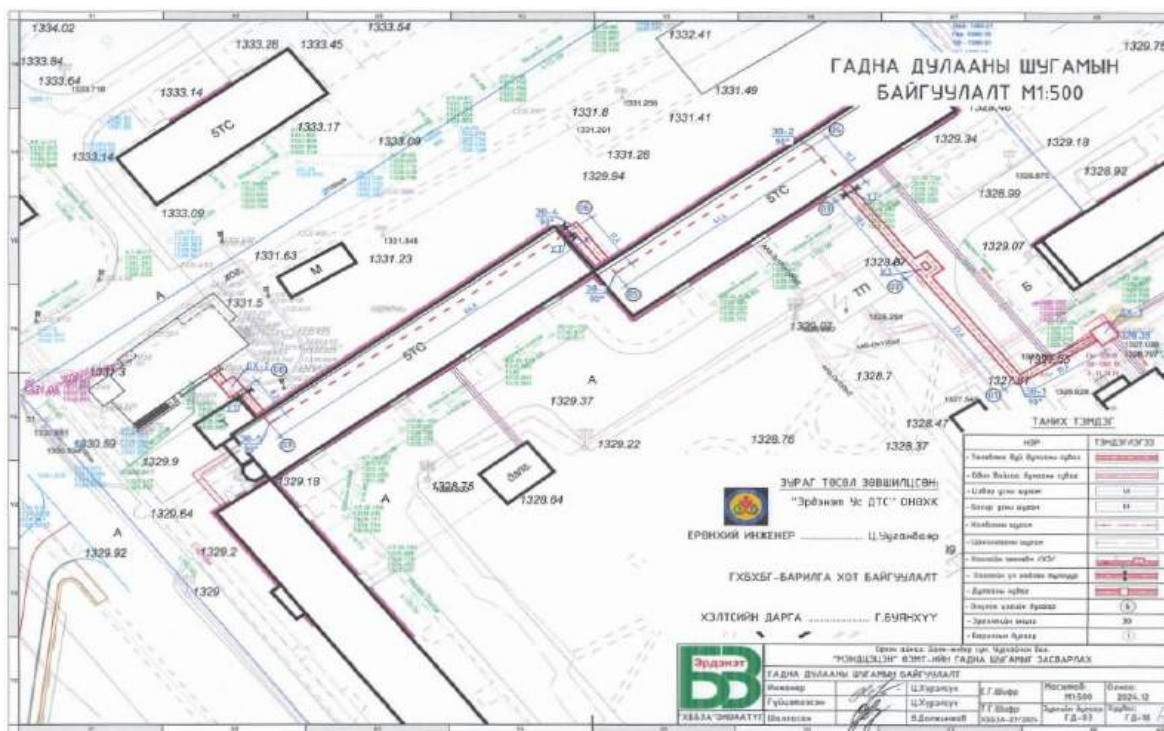

7



Ажлын нэр: “Миний гудамж –бидний гэр” төслийн хүрээнд гэр хороололд баригдсан цэвэр, бохир усны төв шугам сүлжээ татах

Ажлын тоо хэмжээ: 12х7.24 УДДТ, халаалт 1000-1660квт, хэрэглээний халуун ус 1484квт 2-р хэлхээний 5 хос шугам Ф159х4.5-Ф45х2.5

Зохиогч: “Асгат өргөө”ХХК

Гүйцэтгэгч: “Хан-аттрибут” ХХК



Аршаант баг,



Төсөвт өртөг: 1.107.600.000 төг

Гэрээний хугацаа: 2021.08.16- 2025.08.25

Ажлын явц, тайлбар:

Айл өрхүүд эзэмшлийн газраар шугам угсралт хийх үед иргэд зөвшөөрөхгүй байсныг 2025.03 сар зөвшөөрөл авч энэ онд ажлыг 2025.08.25 гэхэд дуусгахаар болсон.

Гүйцэтгэлийн хувь: 73%

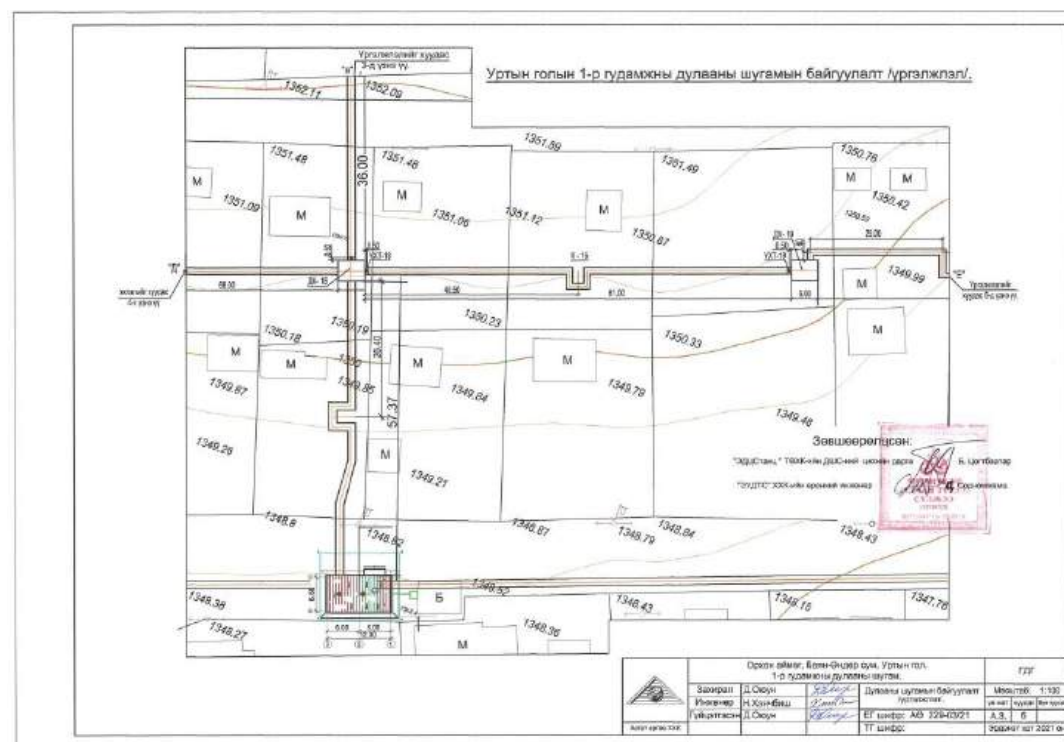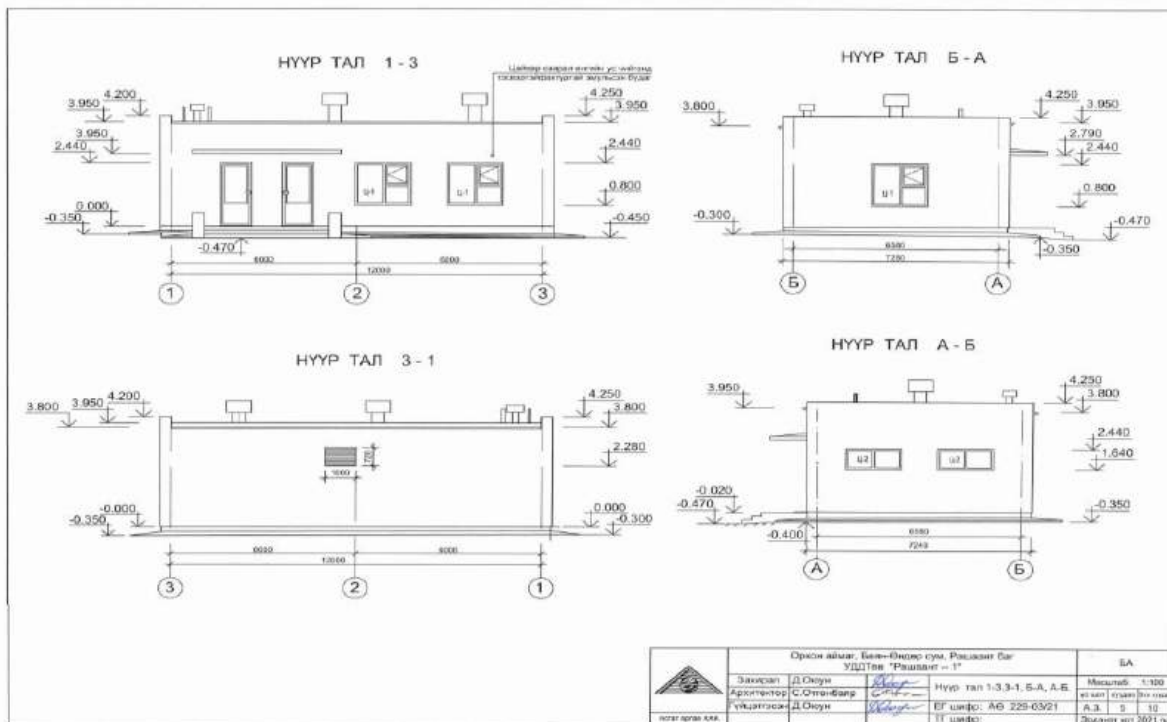



8



Ажлын нэр: "Уурхайчин баг. ДГТ-1,2,3-р байрны дулаан цэвэрүсний шугам шинэчлэх
Ажлын тоо хэмжээ: Халаалтын 2 хос шугам $\Phi 76$ - $\Phi 20$ 216м
Зохиогч: "Орхон прожект" ХХК
Гүйцэтгэгч: "Соотон чоно" ХХК



Уурхайчин баг,
Төсөвт өртөг: 85.000.000 төг
Гэрээний хугацаа: 2021.10.25- 2025.06.15
Ажлын явц, тайлбар:
Шугам угсралтын ажил хийгдсэн
Гүйцэтгэлийн хувь: 80%





9



Ажлын нэр: "Уурхайчин баг. ДГТ-1,2,3-р байрны дулаан цэвэрүснү шугам шинэчлэх
Ажлын тоо хэмжээ: Халаалтын 2 хос шугам $\Phi 76-\Phi 20$ 216м
Зохиогч: "Орхон прожект" ХХК
Гүйцэтгэгч: "Соотон чоно" ХХК



Уурхайчин баг,
Төсөвт өртөг: 85.000.000 төг
Гэрээний хугацаа: 2021.10.25- 2025.06.15
Ажлын явц, тайлбар:
Шугам угсралтын ажил хийгдсэн
Гүйцэтгэлийн хувь: 80%





Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум Эрдэнэ баг Хөв цөөрмийн ажлыг дуусгах ажил/Эрдэнэ баг Бүрэнбүстийн овооны хажууд/

Ажлын тоо хэмжээ: Ус халиагуур 154,5м, Далан 286,6м

Зохиогч: ХЗА-71/2022

Гүйцэтгэгч: Ээлт Өлгий ХХК



Эрдэнэ баг

Төсөвт өртөг: 284 765 400 төг

Гэрээний хугацаа: 2023.10.16 - 2023.12.15
2025.07.17-2025.08.30

Ажлын явц, тайлбар: 70%-ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.

Гүйцэтгэлийн хувь: 70%





1



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Баян-Овоот багт үерийн хамгаалалт хийх
Ажлын тоо хэмжээ: 250м

Зохиогч: "ХББЗА" ОНӨААТҮГ


Гүйцэтгэгч: "Ээлт Өлгий" ХХК



Баян-Овоот баг
Төсөвт өртөг: 123 895 144 төг
Гэрээний хугацаа: 2025.06.01 - 2025.06.30



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээ батлагдаагүй байгаа
Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

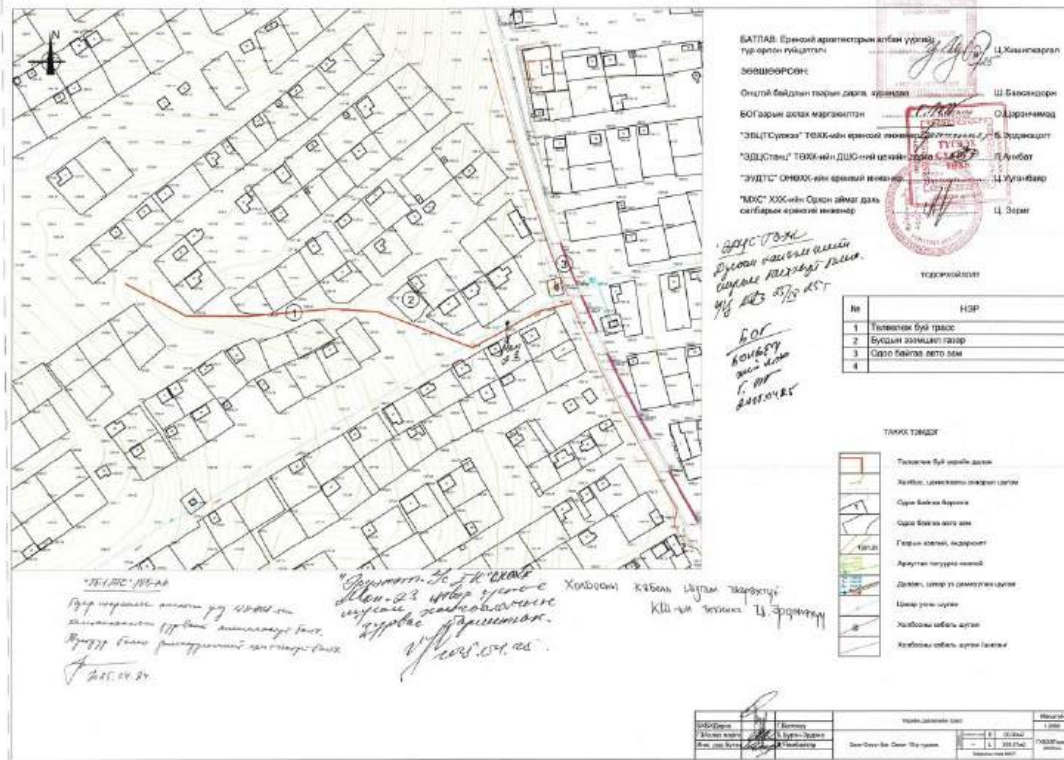



Цахилгааны ажлуудын мэдээлэл

Гэрээний мэдэгдэл
ирсэн нийт

48

Баян-Өндөр сум

2

Жаргалант сум

2

Эхэлсэн ажил

18

Дууссан ажил

6

Ажил эхлэх, гэрээ
байгуулах шатны

20



1



Ажлын нэр: Орхон аймгийн цахилгаан хангамжийн тойрог схем үүсгэж Даваат дэд станц барих ажил

Хүчин чадал: 35/10 кВ-ын 2х16 МВА

Зохиогч: Бодит чадал ХХК

Гүйцэтгэгч: Меса инженеринг ХХК



Төсөвт өртөг: **Даваат баг**
5.5 тэрбум.төг

Гэрээний хугацаа: 2025.05.15 - 2025.09.18

Ажлын явц, тайлбар: Барилгын ажил эхэлсэн

Гүйцэтгэлийн хувь: 20%



Төлөвлөсөн хуваарийн дагуу ажил хийгдэж байна



2



Ажлын нэр: Орхон аймгийн цахилгаан хангамжийн тойрог схем үүсгэж Чингэл дэд станцаас Даваат дэд станц хүртэлх ЦДАШ барих ажил

Хүчин чадал: 35/10кВ 13.059 км ЦДАШ

Зохиогч: "Бодит чадал" ХХК

Гүйцэтгэгч: "Виртуалсофт" ХХК



Төсөвт өртөг: Даваат баг 5.1 тэрбум.төг

Гэрээний хугацаа: 2025.05.15 - 2025.07.21

Ажлын явц, тайлбар: Бэлтгэл ажил хийгдэж байна



Гүйцэтгэлийн хувь: 5%



Төлөвлөсөн хуваарийн дагуу ажил хийгдэж байна



3



Ажлын нэр: Орхон аймгийн цахилгаан хангамжийн тойрог схем үүсгэж Даваат дэд станцаас Булаг дэд станц хүртэлх ЦДАШ барих ажил

Хүчин чадал: 35/10кВ 5.04 км ЦДАШ

Зохиогч: Бодит чадал ХХК

Гүйцэтгэгч: "Цацрах цог" ХХК



Төсөвт өртөг:

Даваат баг

5.1 тэрбум.төг

Гэрээний хугацаа:


2025.05.15 - 2025.08.13

Ажлын явц, тайлбар: Бэлтгэл ажил хийгдэж байна



Гүйцэтгэлийн хувь:

5%

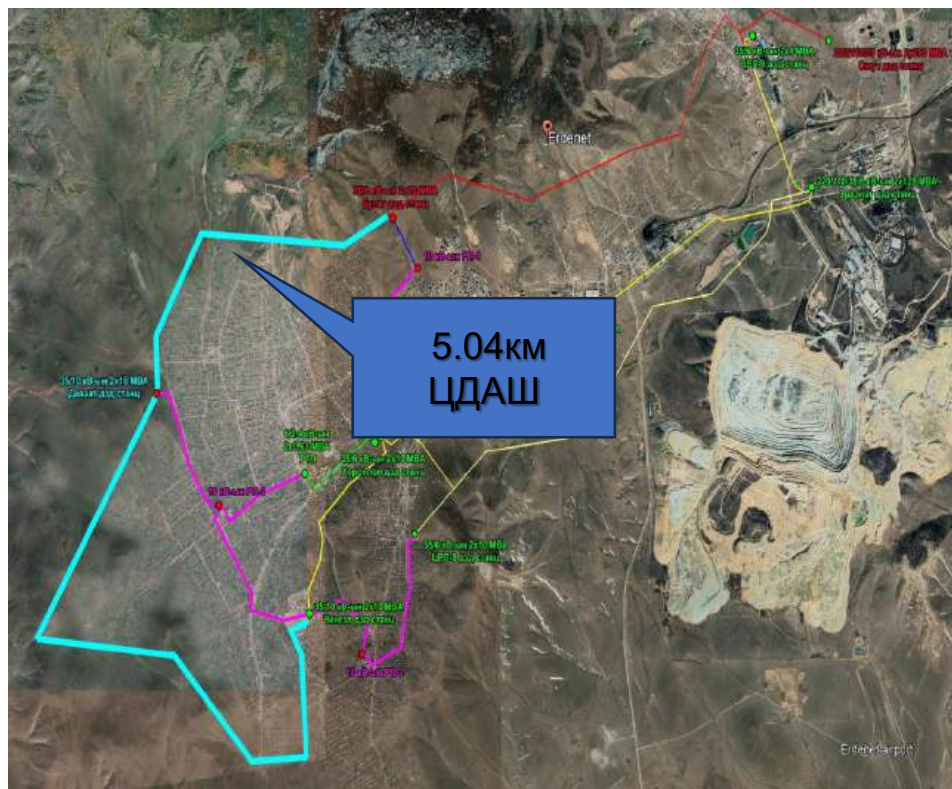

Төлөвлөсөн хуваарийн дагуу ажил хийгдэж байна



4



Ажлын нэр: Баянбулаг, Эрдэнэ багт РП-1,3 хувиарлах байгууламж барих ажил

Хүчин чадал: 10кВ-ын хувиарлах байгууламж

Зохиогч: "Баясалтөгс" ХХК

Гүйцэтгэгч: "Цацрах цог" ХХК



Баянбулаг, Эрдэнэ баг


Төсөвт өртөг: 1.4, 1.4 тэрбум.төг

Гэрээний хугацаа: 2025.05.01 - 2025.08.01

Ажлын явц, тайлбар: Барилгын суурийн ажил хийгдэж байна



Гүйцэтгэлийн хувь: 20%

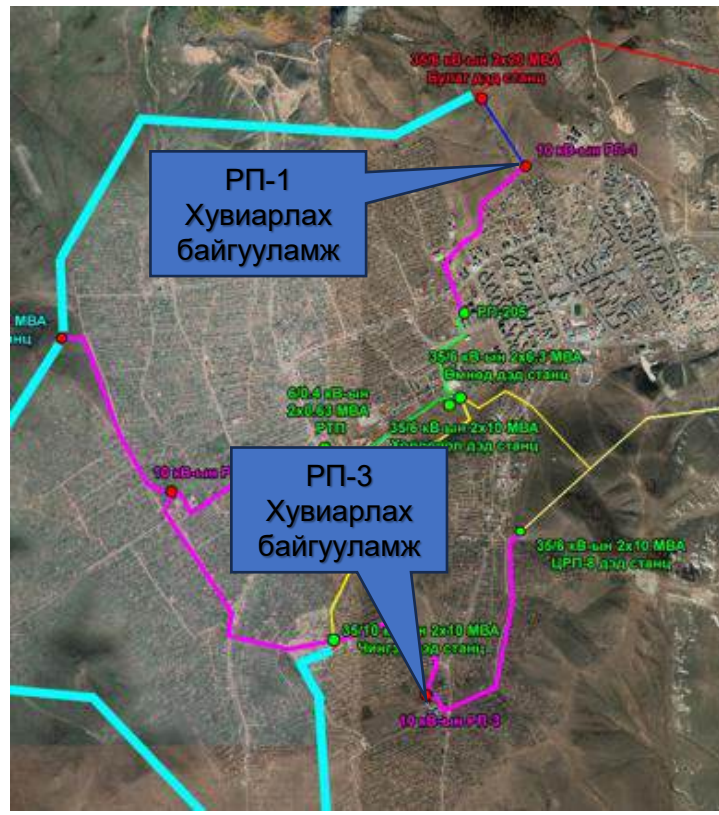

Төлөвлөсөн хуваарийн дагуу ажил хийгдэж байна

5



Ажлын нэр: Янзага зуслангийн цахилгааны трансформатор солих ажил
Хүчин чадал: 10/04кВ 400кВА-ын трансформатор
Зохиогч: Эрдэнэт хотын захирагчийн алба
Гүйцэтгэгч: "Сервис по семинс" ХХК



Булган аймаг Хангал сум 1-р баг
Төсөвт өртөг: 72 сая.төг
Гэрээний хугацаа: 2024.12.02 - 2024.12.05
2025.04.04 - 2025.04.30
Ажлын явц, тайлбар: Ажил хийгдэж дууссан.
Гүйцэтгэлийн хувь: 100%



Төлөвлөсөн хуваарийн дагуу ажил хийгдэж дууссан

6



Ажлын нэр: Их залуу багт шинээр гэрэлтүүлэг хийх

Хүчин чадал: 50вт 37 ширхэг гэрэл

Зохиогч: "ХББЗА" ОНӨААТҮГ

Гүйцэтгэгч: "Сервис по семинс" ХХК




Төсөвт өртөг: Их залуу баг 85.400.000 төг

Гэрээний хугацаа: 2025.05.05 - 2025.06.05

Ажлын явц, тайлбар: Ажил хийгдэж дууссан.

Гүйцэтгэлийн хувь: 100%

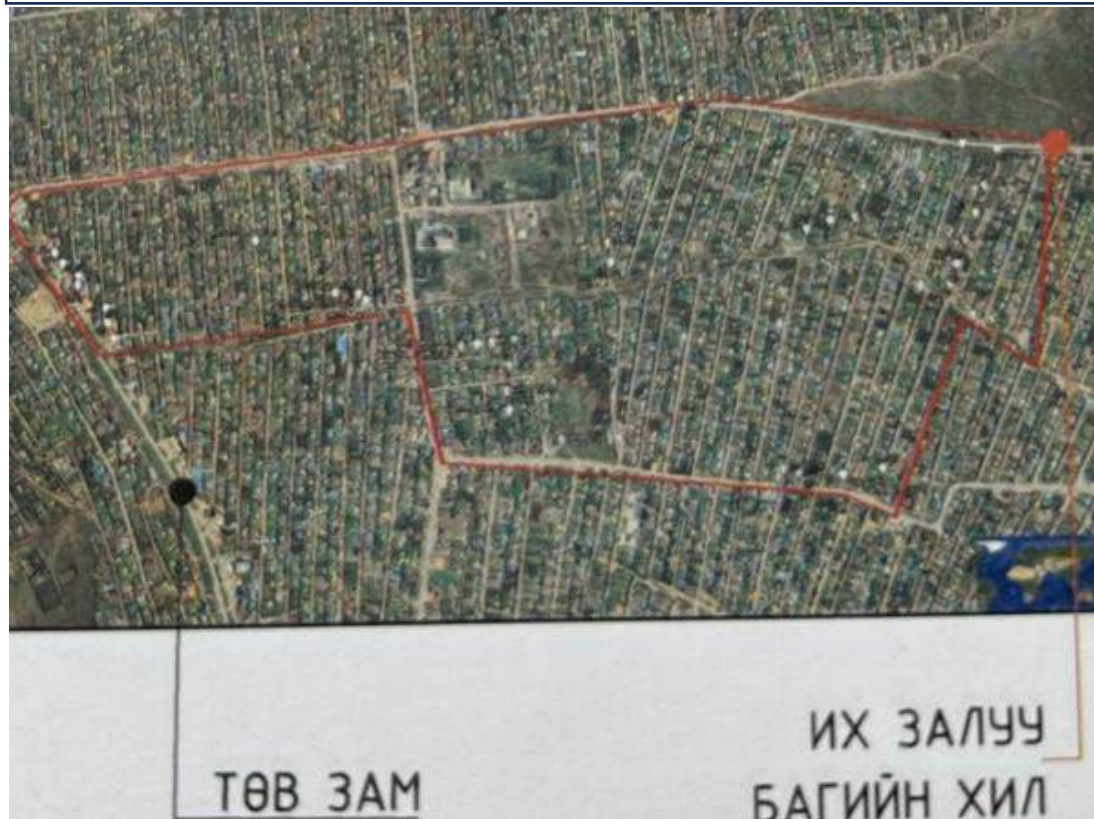

Төлөвлөсөн хуваарийн дагуу ажил хийгдэж дууссан



7



Ажлын нэр: Эрдэнэ багт камержуулалт хийх

Хүчин чадал: Камер

Зохиогч: "ХББЗА" ОНӨААТҮГ

Гүйцэтгэгч: "Хотспот сервис" ХХК



Төсөвт өртөг:

Эрдэнэ баг

36.561.185 төг

Гэрээний хугацаа:



2025.04.21 - 2025.05.21

Ажлын явц, тайлбар:

Ажил хийгдэж дууссан.

Гүйцэтгэлийн хувь:

100%

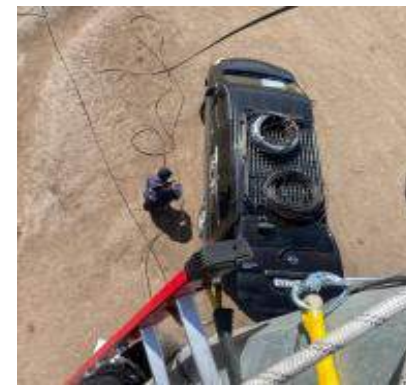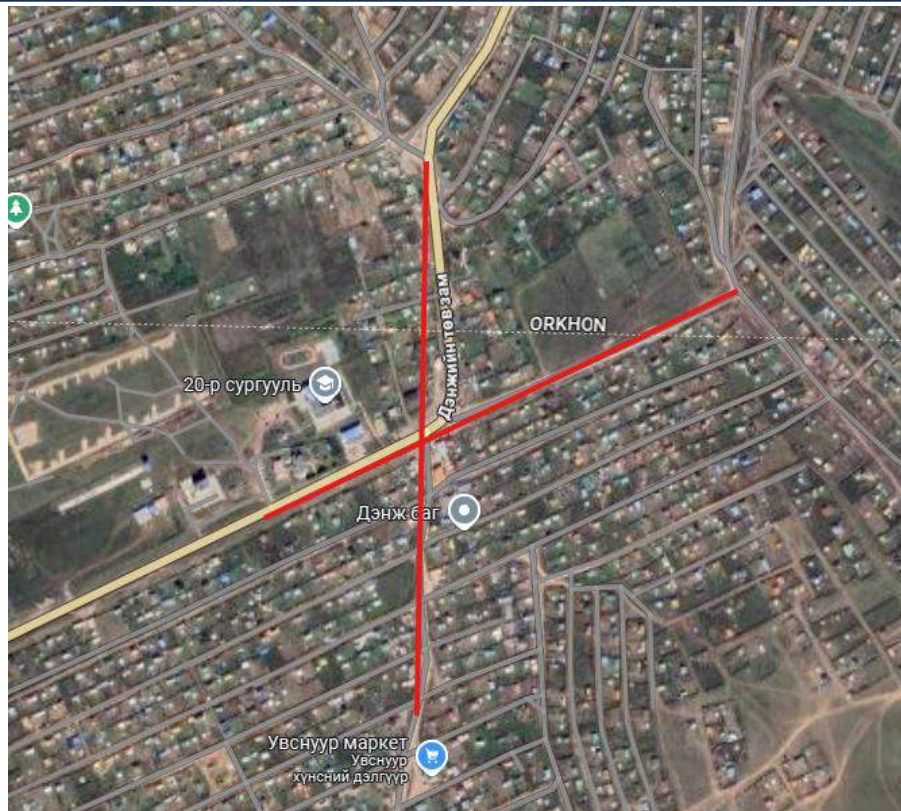

Төлөвлөсөн хуваарийн дагуу ажил хийгдэж дууссан

8



Ажлын нэр: Говил багийн байр хүртэл агаагаар татсан орон нутгийн өмчийн Цахим эрдэнэт сүлжээний шилэн кабель, түүний модон тулгуур солих ажил

Хүчин чадал: Сүлжээний кабель

Зохиогч: Эрдэнэт хотын захирагчийн алба

Гүйцэтгэгч: "Хотспот сервис" ХХК




Төсөвт өртөг: Говил баг 104.016.492 төг

Гэрээний хугацаа: 2025.04.21 - 2025.05.21

Ажлын явц, тайлбар: Ажил хийгдэж дууссан.

Гүйцэтгэлийн хувь: 80%

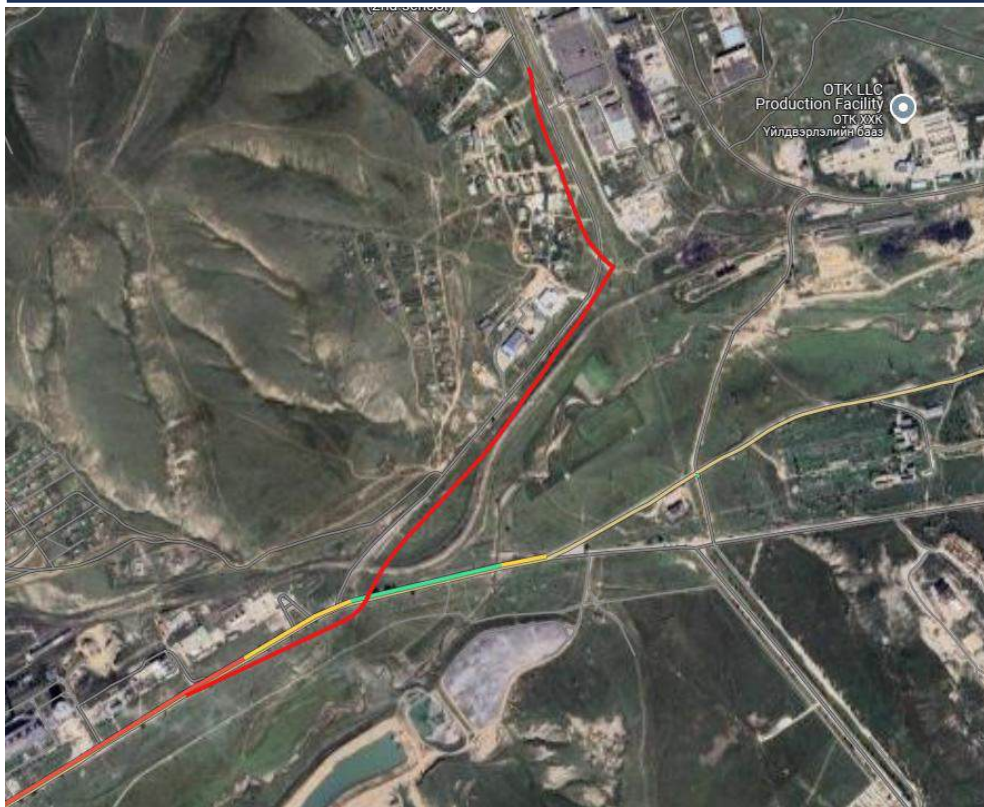

Төлөвлөсөн хуваарийн дагуу ажил хийгдэж дууссан

9



Ажлын нэр: Даваат баг АТП-413 урд талд шинээр баригдах айл өрхийн цахилгаан хангамж.

Хүчин чадал: 10кВ-ын ЦДАШ, 10/0,4 кВ-ын 250 кВа дэд станц

Зохиогч: "ЭБЦТС" ТӨХК
Гүйцэтгэгч: "Агуут ажнай" ХХК



Даваат баг
Төсөвт өртөг: 85.289.664 төг
Гэрээний хугацаа: 2025.05.01- 2025.06.29

Ажлын явц, тайлбар: Ажил хийгдэж дууссан.

Гүйцэтгэлийн хувь: 80%



Төлөвлөсөн хуваарийн дагуу ажил хийгдэж байна



10



Ажлын нэр: Наран баг АТП-445 хойно, шинээр баригдах айл өрхийн цахилгаан хангамж.





Хүчин чадал: 10кВ-ын ЦДАШ, 10/0,4 кВ-ын 250 кВа дэд станц
Зохиогч: "ЭБЦТС" ТӨХК
Гүйцэтгэгч: "Агуут ажнай" ХХК



Төсөвт өртөг: Наран баг
85.739.504 төг



Гэрээний хугацаа: 2025.05.01 - 2025.06.29
Ажлын явц, тайлбар: Ажил хийгдэж дууссан.
Гүйцэтгэлийн хувь: 100%

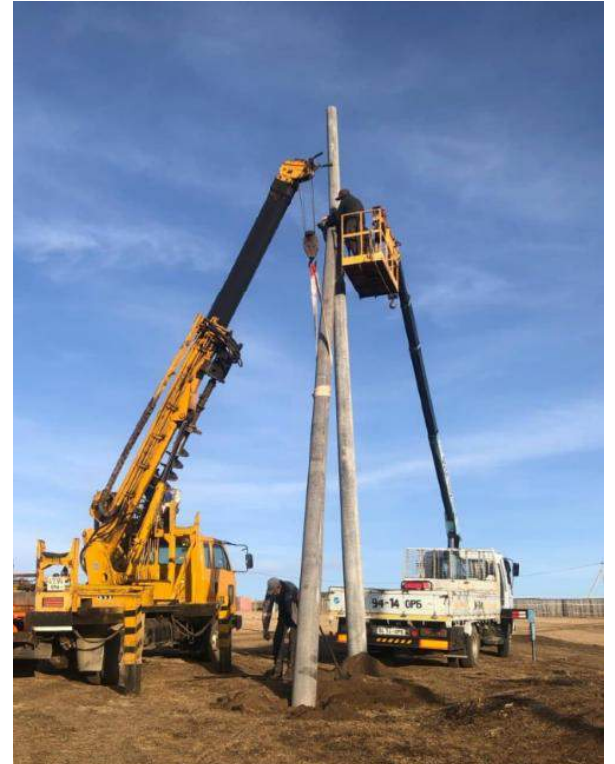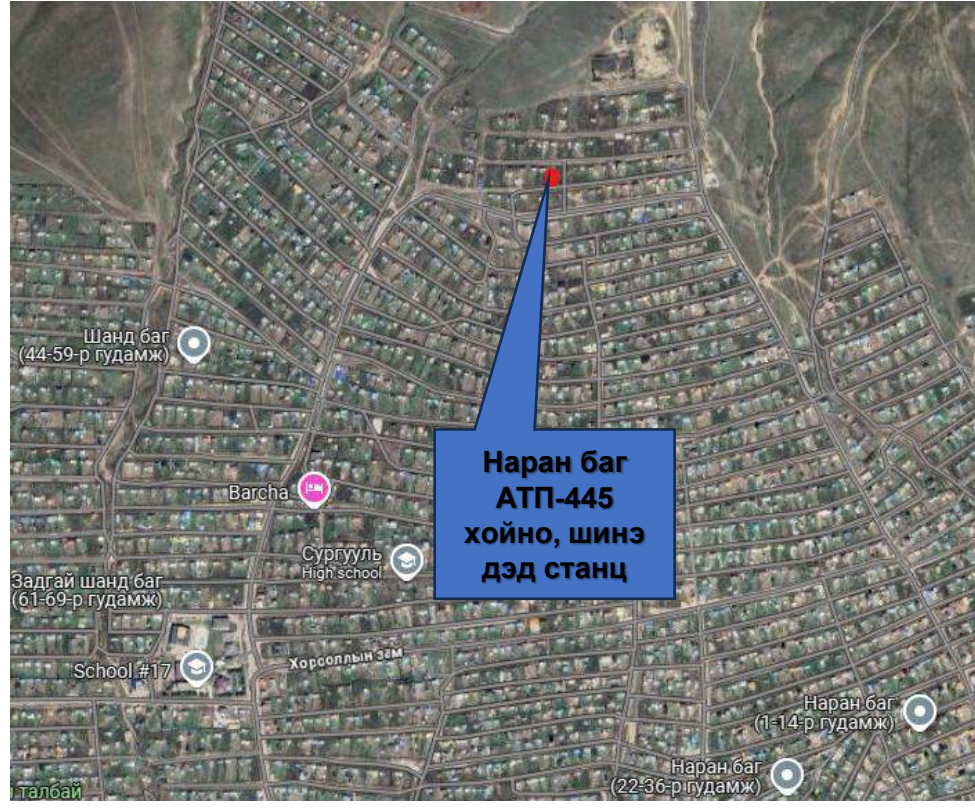

Төлөвлөсөн хуваарийн дагуу ажил хийгдэж байна

11



Ажлын нэр: Дэнж баг АТП-62 зүүн, шинээр баригдах айл өрхийн цахилгаан хангамж.

Хүчин чадал: 10кВ-ын ЦДАШ, 10/0,4 кВ-ын 250 кВа дэд станц

Зохиогч: "ЭБЦТС" ТӨХК
Гүйцэтгэгч: "Агуут ажнай" ХХК



Төсөвт өртөг:

Дэнж баг
87.540.000 төг

Гэрээний хугацаа: 2025.04.30 - 2025.06.14



Ажлын явц, тайлбар: Ажил хийгдэж дууссан.
Гүйцэтгэлийн хувь: 80%



Төлөвлөсөн хуваарийн дагуу ажил хийгдэж байна



12



Ажлын нэр: Дэнж баг АТП-62 урд шинээр баригдах айл өрхийн цахилгаан хангамж.

Хүчин чадал: 10кВ-ын ЦДАШ, 10/0,4 кВ-ын 250 кВа дэд станц

Зохиогч: "ЭБЦТС" ТӨХК
Гүйцэтгэгч: "Агуут ажнай" ХХК



Даваат, Наран, Дэнж баг

Төсөвт өртөг: 87.540.000 төг
Гэрээний хугацаа: 2025.04.21 - 2025.05.21



Ажлын явц, тайлбар: Ажил хийгдэж дууссан.
Гүйцэтгэлийн хувь: 80%



Төлөвлөсөн хуваарийн дагуу ажил хийгдэж байна



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025" ТАНИЛЦУУЛГА



13

Ажлын дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Барилга	ТЭЗ-ийн нэр		Төсвийн тухай хуулиарх		Төсөвт өртөг	Гүйцэтгэгч			Зураг зохиогч	Гэрээний дугаар	Ажлын явц
		Баг	Барилгын ажлын		Хэрэгжих хугацаа			Компаний Нэр	Утас	Гэрээ компанид			
			Нэр	Утас	Эхлэх	Дуусах							
1	2	4	5	6	8	9	10	16	17	21			
Барилга													
ОРАХААГ /20250101066	2.440км хос кабель татаж,суурьлуулах	Их залуу	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07	2025 06-02	2025 08-07	552,500,000.00	Сервис по сименс ХХК	99921212	Аймаг-аас ирсэн	Баясалтөгс ХХК	Б3А-20/25	
ОРАХААГ /20250101064	1.820км кабель татаж,суурьлуулах	цагаанчулуут	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07	2025 06-10	2025 08-15	386,600,000.00	Сервис по сименс ХХК	99921212	Аймаг-аас ирсэн	Баясалтөгс ХХК	Б3А-21/25	
ОРАХААГ /20250101065	2.34км хос кабель татаж,суурьлуулах	Их залуу	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07	2025 06-05	2025 08-10	575,500,000.00	Сервис по сименс ХХК	99921212	Аймаг-аас ирсэн	Баясалтөгс ХХК	Б3А-19/25	
ОРАХААГ/202502 01045	АТП-26 10кв-ын ЦДАШ 250кВА дэд станц барих	Дэнж баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07	2025 05-05	2025 07-06	64,097,265.00	Нуклон ХХК	99040214	5%	ЭБЦТС ХХК	Б3А-37/25	10%
ОРАХААГ/202502 01048	АТП-285 10кв-ын ЦДАШ 250кВА дэд станц барих	уртын гол баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07	2025 05-12	2025 07-22	69,990,608.00	Нуклон ХХК	99040214	5%	ЭБЦТС ХХК	Б3А-40/25	10%
ОРАХААГ/202502 01049	АТП-419 10кв-ын ЦДАШ 250кВА дэд станц барих	цагаанчулуут баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07	2025 05-12	2025 07-22	66,870,256.00	Нуклон ХХК	99040214	5%	ЭБЦТС ХХК	Б3А-39/25	10%
ОРАХААГ/202502 01047	АТП-418 10кв-ын ЦДАШ 250кВА дэд станц барих	Их залуу баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07	2025 05-05	2025 07-06	77,688,351.00	Нуклон ХХК	99040214	5%	ЭБЦТС ХХК	Б3А-38/25	10%
ОРАХААГ/202502 01044	АТП-417 10кв-ын ЦДАШ 250кВА дэд станц барих	Даваат баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07	2025 05-05	2025 07-06	83,305,434.00	Нуклон ХХК	99040214	5%	ЭБЦТС ХХК	Б3А-36/25	10%
ОРАХААГ/202502 01050	АТП-248 10кв-ын ЦДАШ 250кВА дэд станц барих	Рашаант баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07	2025 05-12	2025 07-22	89,578,832.00	Нуклон ХХК	99040214	5%	ЭБЦТС ХХК	Б3А-34/25	10%
ОРАХААГ/202502 01042	АТП-70 10кв-ын ЦДАШ 250кВА дэд станц барих	Эрдэнэ баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07	2025 05-05	2025 07-06	76,552,599.00	Нуклон ХХК	99040214	5%	ЭБЦТС ХХК	Б3А-35/25	10%



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025" ТАНИЛЦУУЛГА



14

Ажлын дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Барилга	ТЭЗ-ийн нэр		Төсвийн тухай хуулиарх			Гүйцэтгэгч			Зураг зохиогч	Гэрээний дугаар	Ажлын явц
		Баг	Барилгын ажлын		Хэрэгжих хугацаа		Төсөвт өртөг	Компаний Нэр	Утас	Гэрээ компанид			
			Нэр	Утас	Эхлэх	Дуусах							
1	2	4	5	6	8	9	10	16	17	21			
Барилга													
ОРАХААГ /20250101073	Трансформатор сольж барих		Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07			200,000,000.00	Сервис по сименс ХХК	99921212	Аймаг-аас ирнэ	ЭБЦТС ХХК		
ОРАВӨСЗДТГ /20250201003	Гэрэлт цамхаг, камержуулалт хийх	Наран баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07			74,180,000.00	Анд Энерги ХХК	99029067	Аймаг-аас ирнэ	ХВВЗА		
ОРАВӨСЗДТГ /20250201005	Гэрэлт цамхаг	Булаг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07			74,180,000.00	Анд Энерги ХХК	99029067	Аймаг-аас ирнэ	ХВВЗА		
ОРАХААГ/20250101069	10кв-ын 1.660 км хос кабель татах	Баянбулаг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07	2025 05-25	2025 07-28	378,583,415.00	Эрчим өгий ХХК	88110359	5%	Баясалтөгс ХХК	БЗА-49/25	
ОРАЖСЗДТГ /20250201051	Гэр хорооллын гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх	Улаантолгой баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07	2025 06-02	2025 07-02	35,900,000.00	Анд Энерги ХХК	99029067	Аймаг-аас ирнэ		ЖС-08/25	
ОРАЖСЗДТГ /20250201007	Гэр хорооллын гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх	Жаргалант баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07	2025 06-02	2025 07-02	35,190,988.00	Анд Энерги ХХК	99029067	Аймаг-аас ирнэ		ЖС-09/25	
ОРАЖСЗДТГ /20250201034	Гүний худгийн цахилгааны шон солих		Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07			39,994,599.00	Арвилах ХХК	99059405	Аймаг-аас ирнэ			

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2025" ТАНИЛЦУУЛГА



ᠬᠥᠷᠦᠨᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠲᠤ-2025" ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠤᠭᠤᠯᠭ᠋᠎ᠠ

15

Ажлын дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Барилга	ТЭЗ-ийн нэр		Төсвийн тухай хуулиарх		Төсөвт өртөг	Компаний Нэр	Гүйцэтгэгч		Зураг зохиогч	Гэрээний дугаар	Ажлын явц
		Баг	Барилгын ажлын		Хэрэгжих хугацаа				Утас	Гэрээ компанид			
			Нэр	Утас	Эхлэх	Дуусах							
1	2	4	5	6	8	9	10	16	17	21			
Барилга													
ОРАХААГ/20250101063	6 кв-ын 3.2км ЦДАШ байгуулах ажил	Чингэл-Оросын булаг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07			162,286,137.00	Автомастер төв ХХК	99352051	Гэрээ хийгдээгүй байгаа	ЭБЦТС ХХК		
ОРАХААГ/20250101057	АТП-64 дэд станцын 0.4кв-ын ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур СИП утсанд шилжүүлж барих	Эрдэнэ баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07			198,154,052.00	Автомастер төв ХХК	99352051	Гэрээ хийгдээгүй байгаа	ЭБЦТС ХХК		
ОРАХААГ/20250101058	АТП-528 дэд станцын 0.4кв-ын ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур СИП утсанд шилжүүлж барих	Их залуу баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07			232,399,113.00	Автомастер төв ХХК	99352051	Гэрээ хийгдээгүй байгаа	ЭБЦТС ХХК		
ОРАХААГ /20250101062	АТП-375 дэд станцын 0.4кв-ын ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур СИП утсанд шилжүүлж барих	Баянцагаан	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07			177,052,049.00	Автомастер төв ХХК	99352051	Гэрээ хийгдээгүй байгаа	ЭБЦТС ХХК		
ОРАХААГ /20250101072	10 кв-ын 3.4 км ЦДАШ барих	Даваат	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07			266,468,692.00	Автомастер төв ХХК	99352051	Гэрээ хийгдээгүй байгаа	ЭБЦТС ХХК		
ОРАХААГ /20250201059	0.4кв-ын ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур СИП утсанд шилжүүлэх	уртын гол баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07			129,622,183.00	Автомастер төв ХХК	99352051	Гэрээ хийгдээгүй байгаа	ЭБЦТС ХХК		
ОРАХААГ /20250201041	10кв-ын ЦДАШ 10/0.4кв-ын 250 кВа дэд станц барих	Эрдэнэ баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07			93,829,844.00	Автомастер төв ХХК	99352051	Гэрээ хийгдээгүй байгаа	ЭБЦТС ХХК		
ОРАХААГ /20250101061	0.4кв-ын ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур СИП утсанд шилжүүлэх	Баянцагаан баг	Орхон аймгийн Засаг дарга	7E+07			210,721,877.00	Автомастер төв ХХК	99352051	Гэрээ хийгдээгүй байгаа	ЭБЦТС ХХК		



1



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум Их залуу багт баригдах 10кВ-ын хуваарилах байгууламж РП-2-аас 35/10кВ-ын Чингэл дэд станц хүртэлх 10кВ-ын 2.34 км трасстай хос кабель шугам барих ажил

Ажлын тоо хэмжээ: 2.34 км хос кабель шугам татах

Зохиогч: Баясал төгс ХХК

Гүйцэтгэгч: Сервис по сименс ХХК



Чингэл баг

Төсөвт өртөг: 575,500,000 төгрөг






Гэрээний хугацаа: 2025.06.05 - 2025.08.10



Ажлын явц, тайлбар: Гэрээний эхлэх хугацаа болоогүй.



Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

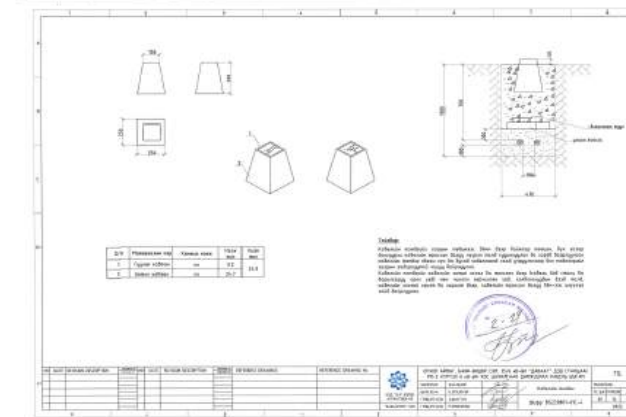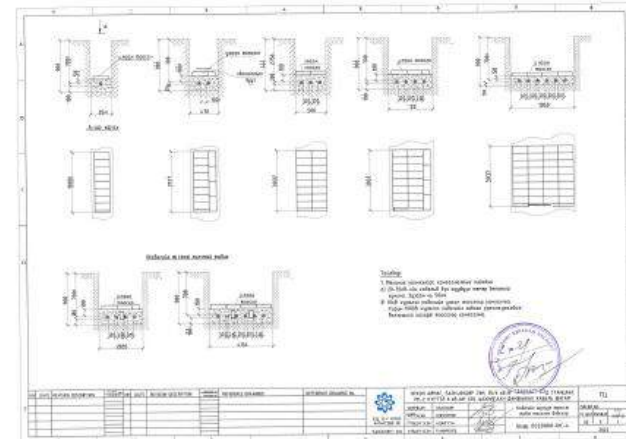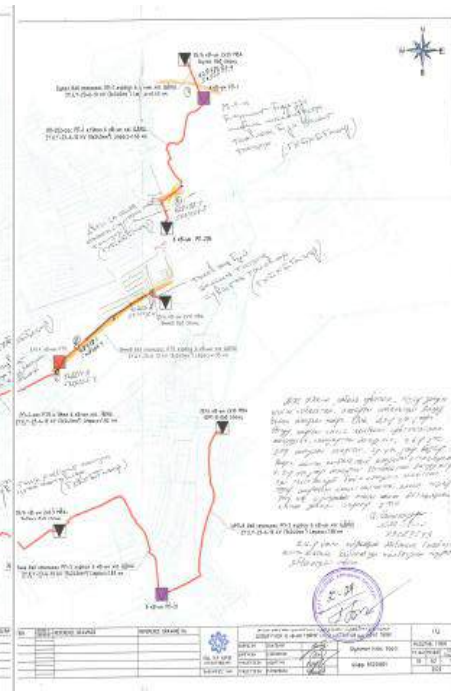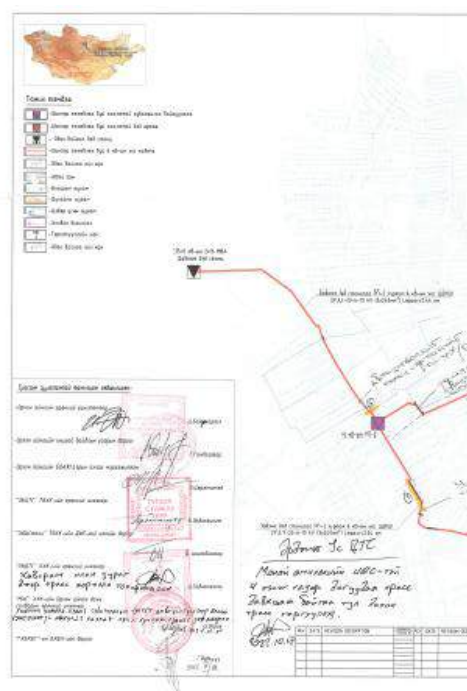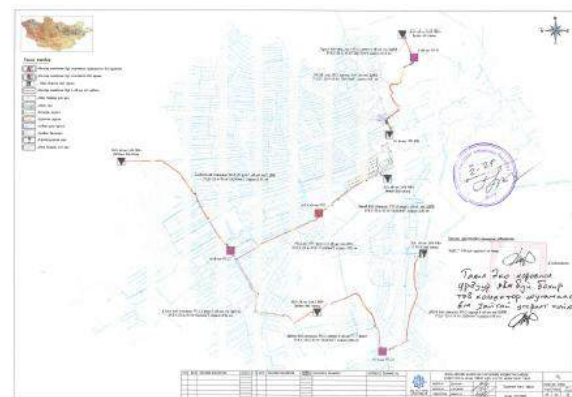

1



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум Их залуу багт баригдах 10кВ-ын РП-2 хаалттай хуваарилах байгууламжаас 35/10 кВ-ын Даваат дэд станц хүртэлх 10 кВ-ын 2.440 км трасстай хос кабель шугам барих ажил

Ажлын тоо хэмжээ: 2.440 км хос кабель шугам татах

Зохиогч: Баясал төгс ХХК

Гүйцэтгэгч: Сервис по сименс ХХК






Даваат баг

Төсөвт өртөг: 552,500,000 төгрөг

Гэрээний хугацаа: 2025.06.02 - 2025.08.07

Ажлын явц, тайлбар: Гэрээний эхлэх хугацаа болоогүй.

Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

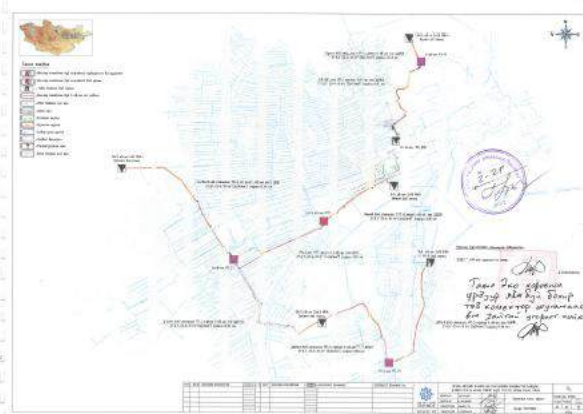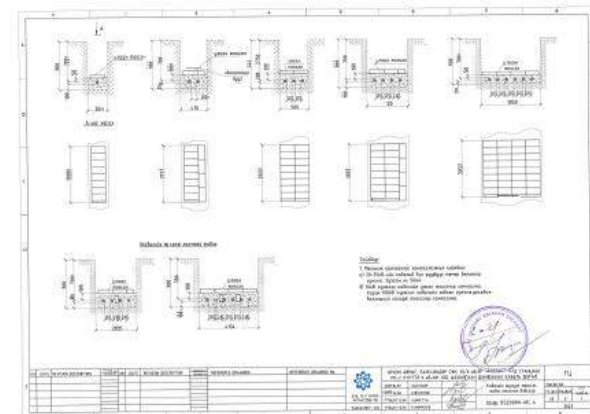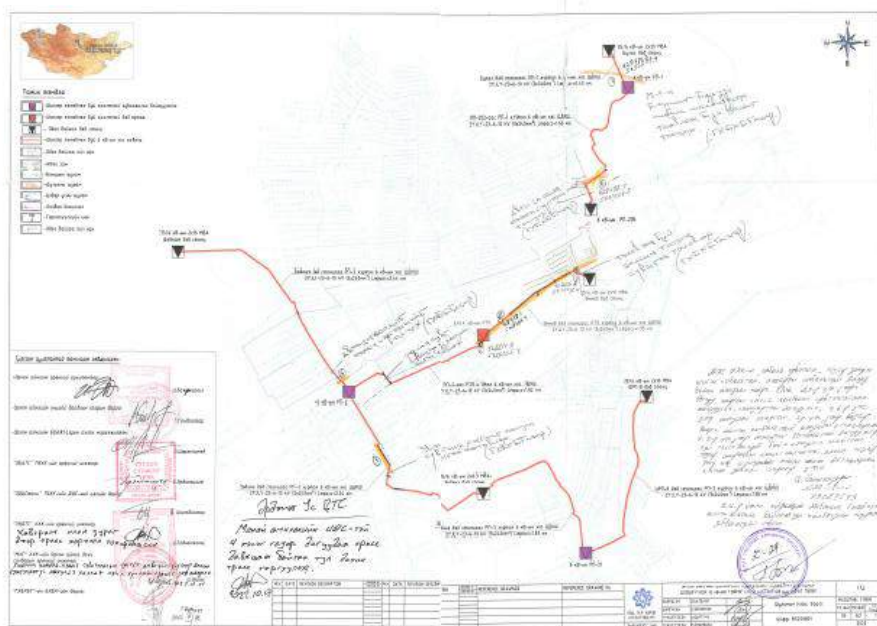



1



Ажлын нэр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум Цагаанчулуут багт шинээр баригдсан 6/0.4 кВ-ын 2х630 кВА дэд станцаас (РТП) Их залуу багт шинээр баригдах 10 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламж (РП-2) хүртэлх 10 кВ-ын хос цахилгаан дамжуулах 1.820 км трасстай кабель шугам барих ажил

Ажлын тоо хэмжээ: 1.820 км хос кабель шугам татах

Зохиогч: Баясал төгс ХХК

Гүйцэтгэгч: Сервис по сименс ХХК







Их залуу баг

Төсөвт өртөг: 386,600,000 төгрөг

Гэрээний хугацаа: 2025.06.10 - 2025.08.15

Ажлын явц, тайлбар: Гэрээний эхлэх хугацаа болоогүй.

Гүйцэтгэлийн хувь: 0%

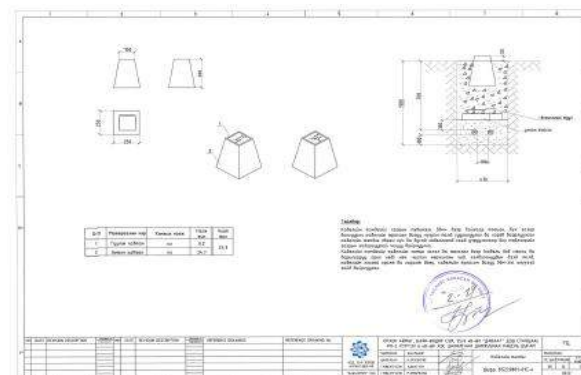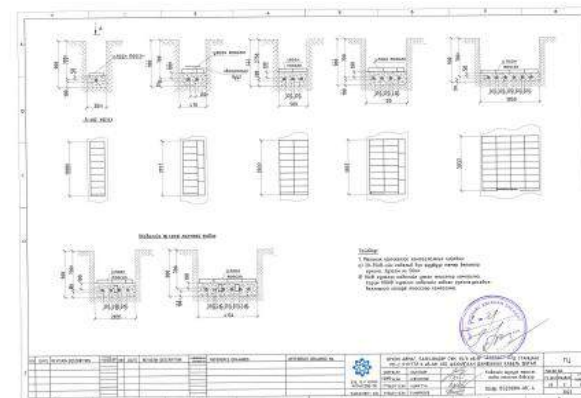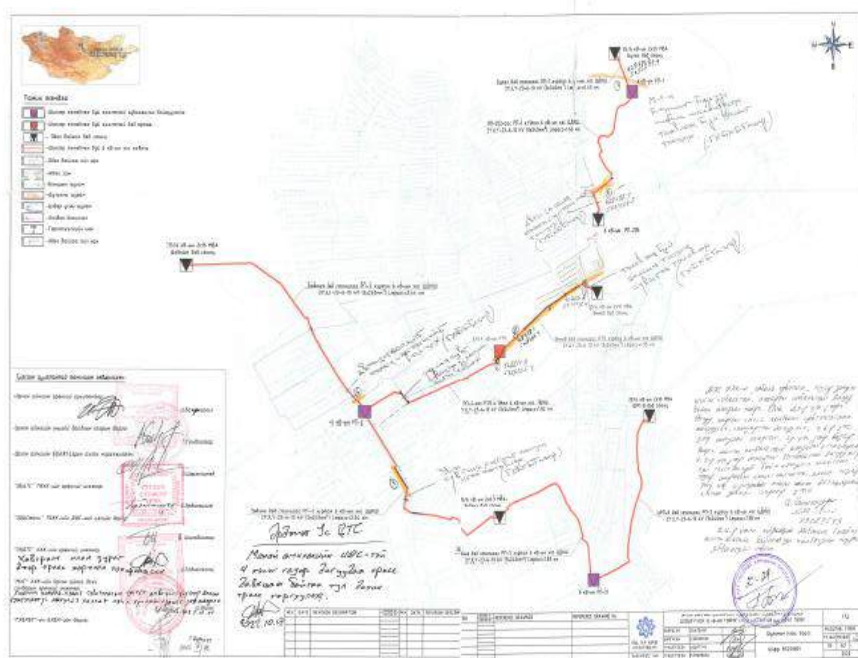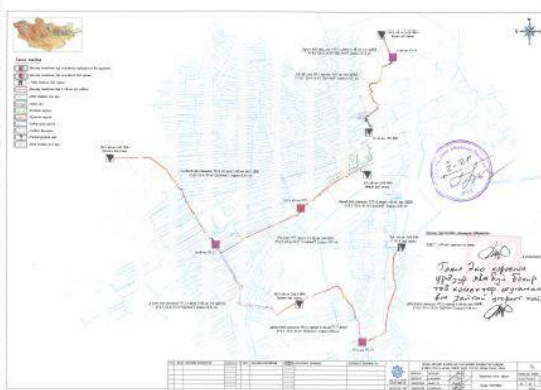

Анхаарал тавьсанд
баярлалаа

